

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年11月号 1/6	
乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年11月)																																			
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者	10月末 工事進捗率 実績 57.5 % 予定 57.5 %	
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金						
(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事	仮設工				仮設進入路・作業ヤード整備(右岸・左岸)																										仮設進入路整備(左岸)	乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV			
	鋼橋上部				架設工準備(橋脚設置等)										外組立(右岸)							架設(A1~P1)									架設(A1~P1)				
	交通規制				幅員減少(右岸堤防道路)										通行止(右岸堤防道路)							通行止(右岸堤防道路)									通行止(右岸堤防道路)				
乙川河川緑地整備 工事その1	準備工				保安設備設置・ヤード作成																											乙川リバーフロント推進課 /株加藤組	10月末 工事進捗率 実績 4.0 % 予定 6.5 %		
	園路工														撤去工・残土運搬							B工区 基礎工・掘削								撤去工・残土運搬					
乙川河川緑地整備 工事その2	準備工																															乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設株	10月末 工事進捗率 実績 2.0 % 予定 2.0 %		
市道籠田町線電線共 同溝整備工事	後片付け																															乙川リバーフロント推進課 /三河舗装建設(株)	10月末 工事進捗率 実績 99.0 % 予定 93.8 %		
市道籠田町線電線共 同溝整備工事 その2	通線試験・内部処理																															乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) NDS(株)	10月末 工事進捗率 実績 91.0 % 予定 90.0 %		
	舗装復旧工																																		
	後片付け																																		
電線事業者 による工事	NTTインフラネット(株) 管路埋設班 (NDS株)					中央線道西側 管路埋設																										乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株)			
	NTTインフラネット(株) ケーブル班 (NDS株)														殿橋 ケーブル布設																				
	中部電力(株) (トーエネック株)					管路埋設・ケーブル入線・電柱工事																													
籠田公園整備工事	準備工・造成工				ヤード成形																										乙川リバーフロント推進課 /朝日・松尾JV	10月末 工事進捗率 実績 6.7 % 予定 8.6 %			
	雨水排水設備工									管渠工・集水槽工																									
	植栽工					樹木剪定				植栽基礎工・根系耐圧基礎																									
	建築土工																													根切り・砂利地業					
籠田公園トイレ・ ステージ等新築工事	トイレ新築工事					高圧受電柱移設				既設電柱撤去					土工事・地業工事							ハンドホール躯体解体								ハンドホール躯体新設	建築課 /杉林建設(株)	10月末 工事進捗率 実績 5.9 % 予定 6.8 %			
	ステージ新築工事									土工事・地業工事													鉄筋工事							型枠工事					

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

小原・朝日JV からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事
 請負金額: 85,040,000円 工期:平成29年12月25日～平成32年2月28日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 橋りょう上部工N=1式
 今月より、いよいよ現場が稼働いたします。初めに全4スパンの内、北側1スパンを右岸側から架設いたします。
 この間の約1ヶ月北側堤防道路が通行止となります。
 終わり次第、左岸側から残りの3スパンを架設する予定です。この間は河川内の遊歩道が約2ヶ月通行止となります。
 11/23の祝日につきましては、特定建設作業に該当しない作業を行う予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からののお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その1
 請負金額: 68,526,000円 工期:平成30年10月5日～平成31年3月22日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 階段工 1式、アスファルト舗装工 A=1050m²、園路緑石工 L=776m、照明設備工 N=198基
 本工事は、右岸緑地内の園路の整備を行います。
 11月上旬より保安設備等の設置作業を行い、本工事へと進めていきます。
 工事中は緑地が利用出来ません。(他工事との調整により、吹矢橋～(仮)乙川人道橋付近までを予定しています)
 皆様には、これからご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

成瀬建設(株) からののお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その2
 請負金額: 85,104,000円 工期:平成30年10月5日～平成31年3月22日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 舗装工A=1300m²、擁壁工N=1式
 本工事では、堤防道路の舗装と護岸の工事を行います。
 11月下旬より、堤防道路の通行止め(左岸側、吹矢橋公園から下流300mまで)の規制を開始します。
 工事中、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

三河舗装建設(株) からののお知らせ 工事名:市道籠田町線電線共同溝整備工事
 請負金額: 72,465,000円 工期:平成30年3月5日～平成30年11月30日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 管路工 L=159m、プレキャストボックス工 N=8箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式
 本工事では籠田町線(中央線道の東側、籠田公園～国道1号線まで)の電線を地中化する工事を行います。
 本体管路の工事が完了しました。11月は後片付け等を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

NDS(株) からののお知らせ 工事名:市道籠田町線電線共同溝整備工事その2
 請負金額: 104,952,000円 工期:平成30年5月30日～平成31年3月20日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 管路工 L=259m、プレキャストボックス工 N=11箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式
 本工事では籠田町線(中央線道の西側と東側の一部、籠田公園～国道1号線まで)の電線を地中化する
 工事を行います。11月は、通線試験・舗装復旧・後片付けにて本工事は完了となります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

電線事業者による工事について
 工事概要: 電線共同溝設備の設置など
 乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・松尾JVからののお知らせ 工事名:籠田公園整備工事
 請負金額: 365,040,000円 工期:平成30年6月26日～平成31年3月29日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事
 本工事は籠田公園のリニューアル工事を行います。
 11月は施工ヤードの整備を行い、雨水排水設備の埋設を行っていきます。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設(株)からののお知らせ 工事名:籠田公園トイレ・ステージ等新築工事
 請負金額: 117,828,000円 工期:平成30年9月6日～平成31年3月29日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: トイレ新築 120.6m²、ステージ新築 90.16m²、スタジオ新築 3基
 本工事は、籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。
 11月から本格的に工事を進めていきます。
 高圧受電柱の移設に伴い、11/4(日)22:00～11/5(月)6:00は地下駐車場が停電となりますのでご了承ください。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年11月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者				
		曜	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30			
配水管布設工事 (鳥町ほか3箇町)	配水管布設工																																		水道工事課 /石田設備(株) 10月末 工事進捗率 実績 82.8% 予定 82.8%	
配水管布設工事 (明大寺町)	準備工																																		水道工事課 /(有)今井水道設備 10月末 工事進捗率 実績 93.1% 予定 93.1%	
配水管布設工事 (明大寺町ほか2箇町)	準備工																																		水道工事課 /(有)今井水道設備 10月末 工事進捗率 実績 10.2% 予定 10.2%	
	配水管布設工																																			
	仮設配水管工																																			
配水管撤去工事 (明大寺町)	準備工																																		水道工事課 /(有)今井水道設備 10月末 工事進捗率 実績 3.1% 予定 3.1%	
	配水管撤去工																																			
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか1箇町)																																				下水道施設課 /浦上建設(株)
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか3箇町地内)	管渠工																																			下水道施設課 /浦上建設(株) 10月末 工事進捗率 実績 52.5% 予定 54.5%
	取付管工																																			
下水道管渠改築工事 (籠田町ほか1箇町)	管渠工(開削)																																			下水道施設課 /(株)山口土木 10月末 工事進捗率 実績 58.8% 予定 58.8%
	管更生工(事前調査)																																			
下水道管渠改築工事 (明大寺町ほか2箇町)	管更生工																																			下水道施設課 /(株)加藤組 10月末 工事進捗率 実績 74.9% 予定 75.6%
	舗装工																																			

工事完了

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

石田設備(株)からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:24,732,000円 工期:平成29年10月19日～平成31年2月28日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:配水管布設 L=173m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 引き続き、下水工事と調整を密に行いながら進捗を図ります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:1,814,400円 工期:平成30年5月11日～平成30年12月26日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:配水管布設 L=26m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 11月は準備工です。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:17,906,400円 工期:平成30年8月27日～平成31年1月31日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:配水管布設替 L=243.4m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 11月は準備工、仮設配水管布設、配水管布設を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ 工事名:配水管撤去工事
 請負金額:2,127,600円 工期:平成30年8月24日～平成31年1月18日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:配水管撤去 L=118m
 本工事は配水管の撤去を行います。
 11月は準備工、配水管撤去を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 [工事完了]
 工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

浦上建設(株)からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額:46,440,000円 工期:平成29年10月24日～平成31年2月28日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:管渠工 L=308.7m
 本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事を行います。
 11月は管渠工、取付管工を施工予定です。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額:27,000,000円 工期:平成30年5月24日～平成30年11月30日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=113m、管渠更生工 L=72m
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
 11月は引き続き管渠工を行い、中旬から管更生工の事前調査を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額:45,684,000円 工期:平成30年6月26日～平成31年1月25日
 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=21m、管渠更生工 L=211m
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
 上旬に底部仕上と舗装(本復旧)を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年11月)

工事名	工事種類	日	乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年11月)																														工事担当部署/施工者
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
東岡崎駅前広場整備工事	準備工																														拠点整備課 /朝日工業(株) 10月末 工事進捗率 実績 1.5 % 予定 1.5 %		
	施設撤去工																																
	雨水排水設備工																																
	広場整備工																																
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	橋面工																														拠点整備課 /朝日・大伸JV 10月末 工事進捗率 実績 85.9 % 予定 81.9 %		
	橋脚工(P1,P2,P3)																																
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	鋼橋上部工																														拠点整備課 /小原・松尾JV 10月末 工事進捗率 実績 49.0 % 予定 49.0 %		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工																														拠点整備課 /加藤・岡崎JV 10月末 工事進捗率 実績 30.1 % 予定 30.8 %		
	鋼橋上部工																																
交通信号機等 移設工事	試掘工																														拠点整備課 /名鉄Eエンジニア(株) 10月末 工事進捗率 実績 20.0 % 予定 23.0 %		
	管路敷設工																																
	設置工																																
市道大明寺3号線 ほか1路線道路改良 工事	道路土工																														拠点整備課 /小原建設(株) 10月末 工事進捗率 実績 4.0 % 予定 6.7 %		
	構造物撤去工																																
	排水構造物工																																
	付帯工																																
市道明大寺川端 4号線道路改良工事	構造物撤去工																														拠点整備課 /株岡崎工業 10月末 工事進捗率 実績 15.4 % 予定 15.4 %		
	道路土工																																
	舗装工																																
	側溝・縁石工																																
道路占用事業者による 工事	中部電力(株) (トエネック株)																														拠点整備課 /中部電力(株) 東邦瓦斯(株)		
	東邦瓦斯(株) (水金工事株)																																

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日工業(株)からのお知らせ 工事名:東岡崎駅前広場整備工事
 請負金額:62,424,000円 工期:平成30年9月7日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工2,775㎡、側溝工120m、地盤改良工707㎡
 ペDESTリアンデッキ(駅前通路)下の広場整備を行います。
 11月は、施設撤去工、雨水排水設備工、広場整備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・大伸JVからのお知らせ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
 請負金額:565,920,000円 工期:平成29年6月27日~平成31年10月31日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
 ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
 10月で吊足場の撤去が完了しました。交通規制中は大変ご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。
 11月は橋面工(タイル舗装工)、橋脚工(根巻コンクリート工)を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JVからのお知らせ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
 請負金額:462,996,000円 工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
 高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
 ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
 11月は、引き続き鋼桁の工場製作を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JVからのお知らせ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
 請負金額:336,960,000円 工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
 高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
 ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。
 11月は、準備工(鋼桁架設準備)・上部工(鋼製支柱建方、上部桁の地組)を行います。
 11/3は重機を使用する作業を行いません。
 資材及び重機搬入作業を、夜間(21:00~6:00)に行う場合があります。
 細心の注意を払い工事を進めてまいります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

名鉄Eエンジニア(株)からのお知らせ 工事名:交通信号機等移設工事
 請負金額:38,800,000円 工期:平成30年8月2日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:交通信号機移設工 1式、統合柱設置工 1式
 本工事は、東岡崎駅東交差点改良に伴う、信号機の移設・統合柱の設置を行います。
 11月より、ケーブル地中化に伴う、ハンドホール設置・管路敷設作業を行います。
 ハンドホール設置前に、試掘作業を行います。駅前道路の片側交互通行規制を予定しております。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ 工事名:市道大明寺3号線ほか1路線道路改良工事
 請負金額:87,696,000円 工期:平成30年8月9日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工 A=3342㎡、側溝工 L=170m、路側防護柵工 L=198m、照明工 N=4基
 本工事は、市道大明寺3号線と市道竜美丘1号線の道路改良工事を行います。
 11月は、竜美丘1号線の道路土工、構造物撤去、側溝据付を行います。車道幅員減少での作業を予定しています。
 大明寺3号線については道路土工、照明工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ 工事名:市道明大寺川端4号線道路改良工事
 請負金額:63,720,000円 工期:平成30年9月5日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工1,657㎡、縁石工218m、照明工17基
 本工事は市道明大寺川端4号線の道路改良工事を行います。
 11月はバリケードで囲われた供用開始されていない車道・歩道の舗装工事を行い、11月下旬頃に供用開始を
 予定しています。供用開始後は、今まで通行されていた河川側の道路を終日規制で工事に着手していきます。
 車道・歩道の切替が生じますが、隣接工事と調整を行い安全第一で作業を行ってまいりますので、ご理解と
 ご協力をお願い致します。11/3(祝日)は重機を使用しない作業を行います。

道路占用事業者による工事について
 東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせいたします。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事完了

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年11月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
仮設駐輪場整備工事 (その2)	電気設備工																														拠点整備課 / (株)アイセイ電設 10月末 工事進捗率 実績 61.0% 予定 61.0%	
	休工																															
東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業	北店舗棟																														拠点整備課 / スターツCAM(株) 10月末 工事進捗率 実績 27.0% 予定 32.0%	
	ホテル棟																															
	駐車場棟																															
	南店舗棟																															
乙川プロムナード整備工事(右岸) (菅生町地内)	準備工																														道路維持課 / 浅井土木建設(株) 10月末 工事進捗率 実績 1.7% 予定 2.0%	
	坂路工																															
	緑石工																															
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2 (唐沢町ほか1箇町地内)	準備工																														道路維持課 / (株)山口土木 10月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%	
40m3級耐震性貯水槽設置工事(上明大寺町)	作業土工(埋戻し)																														道路維持課 / (株)ダイハウ 10月末 工事進捗率 実績 10.0% 予定 10.0%	
	貯水槽設置工																															
	片付、書類作成																															
乙川プロムナード整備工事(左岸)	準備工																														道路建設課 / 松尾建設(株) 10月末 工事進捗率 実績 7.8% 予定 7.8%	
	構造物撤去工																															
吹矢橋 橋りょう耐震補強工事	仮設工 作業架台																														道路建設課 / 朝日工業(株) 10月末 工事進捗率 実績 2.3% 予定 2.3%	
	仮設工 足場工																															
橋梁補修工事(明代橋)	仮設工																														愛知県 西三河建設事務所 道路整備課 / 小原建設(株) 10月末 工事進捗率 実績 8.9% 予定 8.9%	
	断面修復工																															
	ひび割れ補修工																															

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)アイセイ電設 工事名: 仮設駐輪場整備工事(その2)
 請負金額: 4,469,040円 工期: 平成30年10月1日 ~ 平成31年2月28日
 作業時間: 原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 照明・カメラ機器設置工 1式、照明・カメラ機器撤去工 1式
 本工事は、仮設駐輪場を整備、撤去する工事を行います。
 11月3日から殿橋南側の仮設駐輪場を増設して供用開始します。11月4日からは休工となり、平成31年1月頃から吹矢橋南側の仮設駐輪場撤去工事を予定しています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

スタートCAM網からのお知らせ 工事名: 東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業
 工期: 平成30年4月10日 ~ 平成31年7月31日
 作業時間: 原則8時~18時まで(作業状況により時間を延長をすることがあります。)
 工事概要: ホテル棟 S造9階建て、北店舗棟 S造3階建て、南店舗棟 S造3階建て、駐車場棟 S造5層6段
 本工事は東岡崎駅前に商業施設を建設する工事を行っています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ 工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)
 請負金額: 53,892,000円 工期: 平成30年9月27日 ~ 平成31年3月28日
 作業時間: 原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 工事施工延長 L=275m、側溝工 L=275m、舗装工 A=1597㎡
 11月は河川側の植栽撤去工から施工いたします。
 規制といたしましては、片側交互通行を予定しています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ 工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸) その2
 請負金額: 67,716,000円 工期: 平成30年10月22日 ~ 平成31年3月28日
 作業時間: 原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 工事施工延長 L=392m、側溝工 L=27m、舗装工 A=1701㎡
 本工事は、側溝、舗装、照明を設置する工事を行います。
 11月は準備工(測量等)を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)ダイハウからのお知らせ 工事名: 40m3級耐震性貯水槽設置工事
 請負金額: 5,394,600円 工期: 平成30年7月6日 ~ 平成30年12月14日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 40m3級耐震性貯水槽設置工 N=1基
 40m3級耐震性貯水槽を設置するための工事を行っています。
 11月上旬に貯水槽の設置工事を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設(株)からのお知らせ 工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)
 請負金額: 53,352,000円 工期: 平成30年9月26日 ~ 平成31年3月15日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 舗装工 A=1,535㎡、側溝工 L=140m、緑石工 L=379m
 本工事は、河川側へ歩道を新設し、舗装を全面きれいにします。
 11月15日頃から保安設備設置を行い、既設歩道側の構造物撤去工事を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ 工事名: 吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
 請負金額: 120,960,000円 工期: 平成30年9月7日 ~ 平成31年3月25日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 上部工補強工、上部工補修工
 吹矢橋上部桁の耐震補強工事を行います。
 11月は仮設工を行います。工事に伴い左岸堤防道路通行止め(昼間)および、河川敷遊歩道通行止め(終日)を行います。ご利用の皆様にはご不便をおかけします。
 11月3日(土)、11月23日(金)の祝日は作業を行います。(特定建設作業以外)
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ 工事名: 橋梁補修工事(一般県道 東大見岡崎線(明代橋))
 請負金額: 93,312,000円 工期: 平成30年7月24日 ~ 平成31年3月20日
 作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 断面修復工 1.4m3、剥落防止工 461m2、表面保護工 1,833m2、鳥害対策工 622m、仮設工 1式
 本工事は、明代橋の上部下面のはく離、ひび割れ等を補修する工事と歩道タイルを補修する工事を行います。
 11月1日より足場設置に伴い、河川敷(橋の下)の通行止めを実施します。
 通行止め期間中は、堤防道路をご通行ください。11月3日は重機を使用しない軽微な作業を予定しています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成30年11月号 6/6

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成30年11月)

岡崎市からのお知らせ

河川緑地内の工事が始まります！

11月より河川緑地内の工事が始まります。工事中は安全確保のため、河川緑地及び堤防道路を規制させていただく箇所があります。規制箇所、詳細につきましては現地案内看板等でご案内させていただきます。利用者の方には大変ご迷惑をお掛けしますが、安全を第一に工事を進めますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

また、11月24日には平和を祈る光の祭典「岡崎泰平の祈り」が開催されます。泰平の世を築いた徳川家康公生誕の地、岡崎で幻想的な青い光を眺めながら、平和について思いを馳せてみてはいかがでしょうか。


今月の関連行事

- 岡崎城下家康公秋まつり 11月4、5日
- 岡崎市消防団連合観閲式 11月19日
- 岡崎泰平の祈り 11月24日

連絡先

- 岡崎市担当:
- 乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝、籠田公園】
中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
 - 水道工事課 【配水管布設】
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482
南部方面係 永井、柴田 TEL:0564-23-6367
 - 拠点整備課
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
【ベデストリアンデッキ、交通信号機、道路改良、駅前広場、仮設駐輪場】
総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452【北東街区有効活用事業】
 - 下水施設課 【下水道管渠】
管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
 - 道路維持課
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233【プロムナード】
北西部係 大島 TEL:0564-23-6225【防火水槽】
 - 道路建設課
工事係 大澤、和出 TEL:0564-23-6743【プロムナード】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230【吹矢橋】
 - 建築課 計画係【籠田公園】
大橋 TEL:0564-23-6321
- 愛知県担当:
- 西三河建設事務所道路整備課 【橋梁補修工事(明代橋)】
石川 TEL:0564-27-2750
 - 西三河建設事務所河川港湾整備課 【階段・坂路工事】
太田、中田 TEL:0564-27-2752
- 施工者:

- 【人道橋】
・小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
- 【乙川河川緑地】
・その1 (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013
・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
- 【電線共同溝】
・市道籠田町線 三河舗装建設(株) 久永 TEL:0564-71-2233
・市道籠田町線その2 N T T インフラネット(株) 木下 TEL:052-746-6814
N D S(株) 福山 TEL:0564-55-2020
- 【籠田公園】
・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
・トイレ・ステージ等新築工事 杉林建設(株) 宮城 TEL:0564-22-5215
- 【乙川プロムナード整備工事】
・左岸 松尾建設(株) 宇野 TEL:0564-21-0305
・右岸 浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308
・右岸その2 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
- 【吹矢橋】
・朝日工業(株) 牧野 TEL:0564-51-3655
- 【橋梁補修工事(明代橋)】
・小原建設(株) 榎原 TEL:0564-51-2623

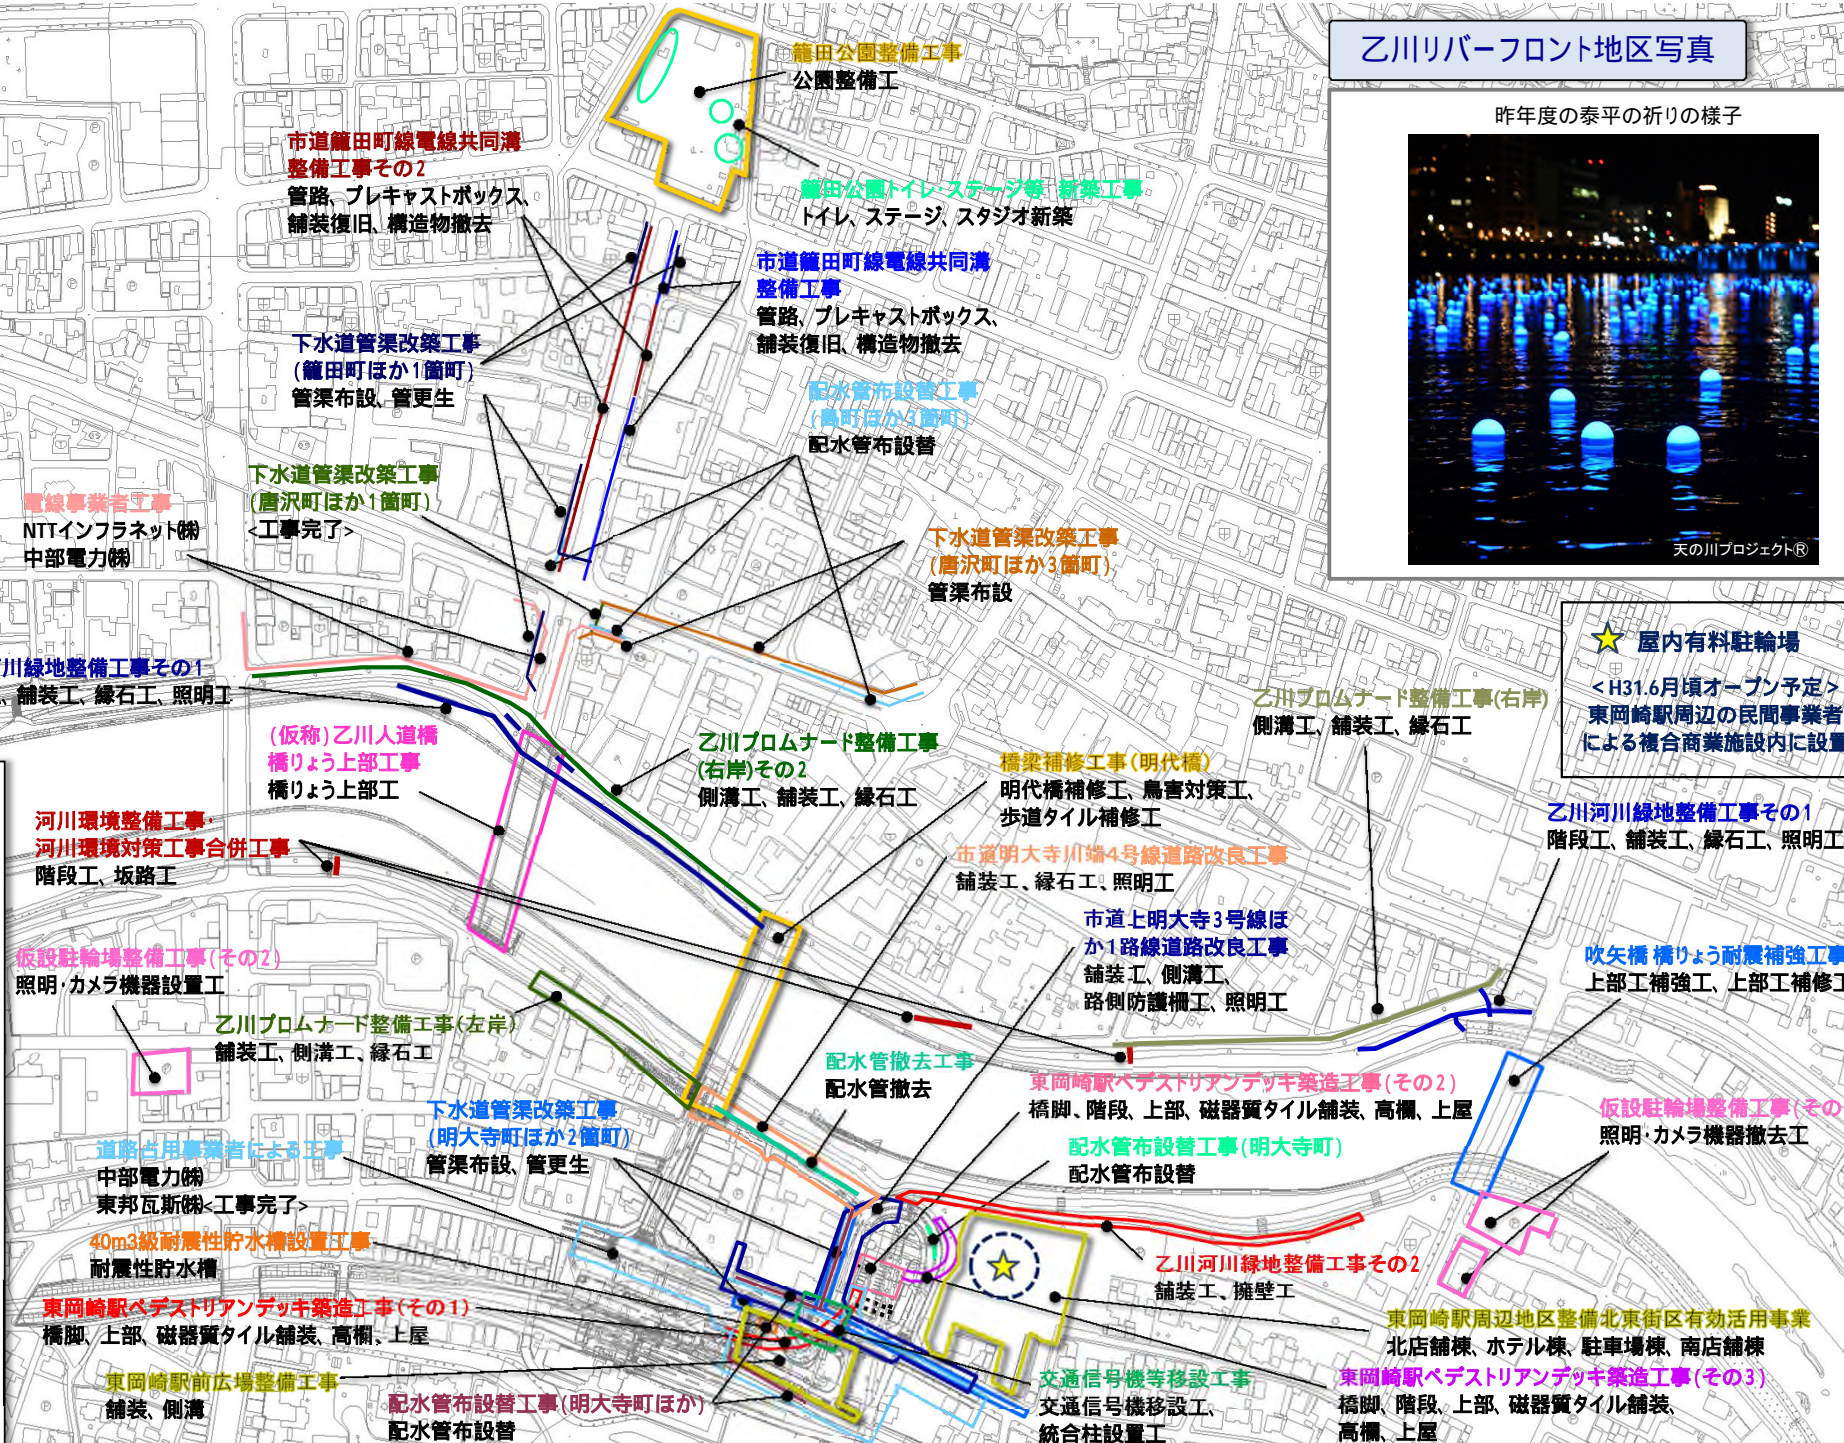

乙川リバーフロント地区写真

昨年度の泰平の祈りの様子



天の川プロジェクト

★ 屋内有料駐輪場
 <H31.6月頃オープン予定>
 東岡崎駅周辺の民間事業者
 による複合商業施設内に設置

- 【河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事】
・成瀬建設(株) 福尾 TEL:0564-46-2050
- 【ベデストリアンデッキ】
・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
- 【駅前広場】
・朝日工業(株) 宮本 TEL:0564-51-3655
- 【道路改良工事】
・市道上明大寺3号線ほか1 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
・市道明大寺川端4号線 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
- 【交通信号機等移設工事】
・名鉄E1エンジニア(株) 砂場 TEL:0564-33-0246
- 【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】
・スターツC A M(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136
- 【耐震性貯水槽】
・(株)ダイホウ 田野尻 TEL:0564-64-3431
- 【仮設駐輪場】
・その2 アイセイ電設(株) 兼元 TEL:0564-25-2260
- 【配水管布設】
・鳥町ほか 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139
・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
・明大寺町ほか " " " "
- 【配水管撤去】
・ " " " "
- 【下水道管渠】
・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460 <工事完了>
・唐沢町ほか3 " " " "
・籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570
・明大寺町ほか2 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
- 【電線事業者工事 (NTTインフラネット) 担当 太高 TEL:052-746-6814】
・N D S(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事 (中部電力) 担当 原 TEL:0564-55-5070】
・(株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
・ " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替)
- 【道路占用事業者による工事 (中部電力) 担当 平野 TEL:0564-55-5071】
・(株)トーエネック 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
- 【道路占用事業者による工事 (東邦瓦斯) 担当 井本 TEL:0564-21-0823】
・水金工事(株) 米持 TEL:0564-21-5103 <工事完了>
