

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年2月)

工事名	工事種類	日																												工事担当部署/施工者	
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28
(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事	架設工 本締め工																														乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV 1月末 工事進捗率 実績 77.6% 予定 75.5%
	現場塗装工																														
	支承工 無収縮モルタル																														
配水管添架工事 (耐震管2工区)	工場製作																														水道工事課 /フジ興業(株) 1月末 工事進捗率 実績 0.5% 予定 0.5%
(仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事	準備工																														乙川リバーフロント推進課 /小原木材(株) 1月末 工事進捗率 実績 0.1% 予定 0.1%
(仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事	準備工																														乙川リバーフロント推進課 /第一電力建設(株) 1月末 工事進捗率 実績 0.1% 予定 0.1%
乙川河川緑地整備 工事その1	園路工 吹矢橋下流右岸																														乙川リバーフロント推進課 /加藤組 1月末 工事進捗率 実績 24.7% 予定 39.0%
	園路工 明代橋下流右岸																														
	橋詰工 擁壁工・階段工																														
乙川河川緑地整備 工事その2	照明工																														乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株) 1月末 工事進捗率 実績 48.0% 予定 48.0%
	舗装工																														
	擁壁工																														
	階段工																														
市道籠田町線 仮設道路設置工事	防護柵工																														乙川リバーフロント推進課 /山崎土木 1月末 工事進捗率 実績 85.5% 予定 50.0%
	道路付属施設工																														
	区画線工																														
電線事業者 による工事	NTTインフラネット(株) ケーブル班(NDS株)																														乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株) 1月末 工事進捗率 実績 85.5% 予定 50.0%
	NTTインフラネット(株) 土木班(NDS株)																														
	中部電力(株) (トーンエック株)																														

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

小原・朝日JV からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事
 請負金額: 851,040,000円 工期:平成29年12月25日～平成32年2月28日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋りょう上部工N=1式
 鋼桁架設、大型クレーン解体・搬出を終え、2月からはボルト締付、現場塗装を行っていきます。
 左岸河川敷を搬入路として大きく規制し、ご不便をおかけしました。
 2月は他工事と調整し、殿橋上流～吹矢橋の河川敷を規制させていただきます。
 2/11の祝日につきましては、特定建設作業に該当しない作業を行う予定です。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

フジ興業(株) からのお知らせ 工事名:配水管添架工事(耐震管2工区)
 請負金額: 75,600,000円 工期:平成30年12月10日～平成31年5月31日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 250A SUS 249.2m
 2月末まで工場での水道管製作工のため、現場での作業はありません。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

小原木材(株) からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事
 請負金額:47,304,000円 工期:平成31年1月24日～平成31年3月19日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:木工事N=1式
 本工事は、(仮称)乙川人道橋の木装化工事を行います。
 2月は準備工となります。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします

第一電力建設(株) からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事
 請負金額: 51,300,000円 工期:平成31年1月23日～平成32年3月19日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:電灯設備N=1式
 本工事は、(仮称)乙川人道橋へ照明を設置する工事を行います。
 2月は準備工となります。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

(株)加藤組からのお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その1
 請負金額: 68,526,000円 工期:平成30年10月5日～平成31年3月22日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要: 階段工1式、アスファルト舗装工A=1050m²、園路緑石工L=776m、照明設備工N=198基
 基本工事は、右岸緑地内の園路整備を行います。
 2月は、A工区(吹矢橋下流右岸)、B工区(人道橋下流右岸)にて緑石、下層路盤を施工する予定です。
 1月21日より殿橋明代橋線を幅員減少規制を行い橋詰工を行っています。
 工事中は園路通行止め市道部は幅員減少規制のため、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

成瀬建設(株) からのお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その2
 請負金額: 85,104,000円 工期:平成30年10月5日～平成31年3月22日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工A=1300m²、擁壁工N=1式
 2月は、堤防道路の舗装と人道橋左岸側へ擁壁と階段を作ります。
 2月4日(月)より左岸堤防道路(人道橋付近)を幅員減少規制とする予定です。
 工事期間中、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力願います。

(株)山崎土木からのお知らせ 工事名:市道籠田町線仮設道路設置工事
 請負金額: 2,418,120円 工期:平成30年12月11日～平成31年3月28日
 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:オーバーレイ工A=89m²
 本工事は、電線共同溝の設備工事に伴い仮設道路を設置します。
 2月は、電柱抜柱後、仮設道路を拡幅します。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

電線事業者による工事について
 工事概要:電線共同溝設備の設置など
 乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。
 2/11の祝日につきましては、特定建設作業に該当しない作業を行う予定です。
 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年2月)

工事名	工事種類	日	乙川リバーフロント地区整備事業																												工事担当部署/施工者	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		曜	日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
籠田公園整備工事	電気設備工事		埋設配管																												乙川リバーフロント推進課 /朝日・松尾JV 1月末 工事進捗率 実績 12.8 % 予定 12.6 %	
	建築工事		基礎工事																													
	公園工事		擁壁工事																													
籠田公園トイレ・ステージ等新築工事	トイレ新築工事		足場組立																	鉄骨塗装											屋根葺	建築課 /杉林建設株 1月末 工事進捗率 実績 44.2 % 予定 48.0 %
	ステージ新築工事		鉄骨組立																	給排水配管											天井・幕板取付	
配水管布設替工事 (高町ほか3箇町)	配水管布設工																														水道工事課 /石田設備(株) 1月末 工事進捗率 実績 97.9 % 予定 97.9 %	
	配水管撤去工																															
配水管布設替工事 (明大寺町ほか2箇町)	配水管布設工																														水道工事課 /(有)今井水道設備 1月末 工事進捗率 実績 61.1 % 予定 62.1 %	
	配水管撤去工																															
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか3箇町地内)	舗装復旧工																														下水施設課 /浦上建設(株) 1月末 工事進捗率 実績 71.5 % 予定 90.7 %	
	中込充填工(夜間)																															
下水道管渠改築工事 (籠田町ほか1箇町)	準備工																														下水施設課 /(株)山口土木 1月末 工事進捗率 実績 80.0 % 予定 80.0 %	
下水道管渠改築工事 (明大寺町ほか2箇町)			工事完了																										下水施設課 /(株)加藤組 [工事完了] 工事期間中は大変ご不便をおかけしました。 皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了する事が出来ました。 誠に、ありがとうございました。			
下水道管渠改築工事 (明大寺町地内)	マンホール工																														下水施設課 /小原建設株 1月末 工事進捗率 実績 91.6 % 予定 61.0 %	

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・松尾JVからのお知らせ 工事名:籠田公園整備工事
 請負金額: 365,040,000円 工期:平成30年6月26日～平成31年3月29日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事
 本工事は籠田公園のリニューアル工事を行います。
 今月は引続き四阿の基礎工事と公園北側芝生マウンドの擁壁工事を行っていきます。
 2月11日(月)は祝日ですが、特定建設工事に該当しない作業を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設株からのお知らせ 工事名:籠田公園トイレ・ステージ等新築工事
 請負金額: 117,828,000円 工期:平成30年9月6日～平成31年3月29日
 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:トイレ新築 120.6㎡、ステージ新築 90.16㎡、スタジオ新築 3基
 本工事は、籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。
 今月はトイレ鉄骨工事・塗装工事・屋根工事、ステージ塗装工事・屋根工事を行います。
 2月11日(月)は祝日ですが、特定建設工事に該当しない作業を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額: 24,732,000円 工期:平成29年10月19日～平成31年2月28日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:配水管布設 L=173m
 予定通り最後の路線に乗込めれば2月末で工事完了の予定です。

(有)今井水道設備 からののお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額: 17,906,400円 工期:平成30年8月27日～平成31年3月22日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:配水管布設替 L=243.4m
 本工事は配水管の布設替えを行います。
 工期を3月まで延期いたしました。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額: 46,440,000円 工期:平成29年10月24日～平成31年2月28日
 作業時間:原則9時～17時まで
 工事概要:管渠工 L=308.7m
 本工事は古くなった下水管を新しい管へ取り替える工事を行います。
 2月は舗装復旧工、中込充填工を施工予定です。
 中込充填工は、夜間 1/2車線規制にて行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額: 27,000,000円 工期:平成30年5月24日～平成31年3月20日
 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=113m、管渠更生工 L=72m
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
 2月は準備工を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 [工事完了]
 工事期間中は大変ご不便をおかけしました。
 皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了する事が出来ました。
 誠に、ありがとうございました。

小原建設株からのお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事
 請負金額: 3,553,200円 工期:平成30年10月10日～平成31年2月28日
 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 L=23.8m、管渠工(撤去) L=23.6m
 本工事は、市道上明大寺3号線下水工事を行います。
 2月は、マンホールの蓋調整を行い、工事完了となります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年2月)

工事名	工事種類	日																												工事担当部署/施工者	
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28
東岡崎駅前広場整備工事	側溝工			CD側溝設置																											拠点整備課/朝日工業(株)
	広場整備工									路床安定処理	車道舗装	歩道舗装	区画線設置	点字シート設置																	1月末 工事進捗率 実績 49.1% 予定 68.7%
	電気設備工																														
東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)	鋼橋上部工			準備工																											拠点整備課/朝日・大伸JV
																															1月末 工事進捗率 実績 88.5% 予定 85.9%
東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)	架設準備工			鋼桁架設準備																											拠点整備課/小原・松尾JV
	鋼橋上部工																														1月末 工事進捗率 実績 61.2% 予定 62.6%
東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)	鋼橋上部工			現場塗装																											拠点整備課/加藤・岡崎JV
	上屋工・高欄工																														1月末 工事進捗率 実績 48.0% 予定 48.1%
東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)	準備工																														拠点整備課/小原建設(株)
																															1月末 工事進捗率 実績 0.1% 予定 0.1%
交通信号機等移設工事	抜柱工																														拠点整備課/名鉄Eエンジニア(株)
	雑工																														1月末 工事進捗率 実績 83.0% 予定 78.0%
市道上明大寺3号線ほか1路線道路改良工事	舗装工																														拠点整備課/小原建設(株)
	舗装工(夜間)																														1月末 工事進捗率 実績 60.5% 予定 71.2%
	側溝工																														L型側溝
	付帯工																														地先、歩車ブロック、路盤
市道明大寺川端4号線道路改良工事	測量及び清掃																														拠点整備課/株岡崎工業
																															1月末 工事進捗率 実績 90.0% 予定 79.5%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日工業(株)からのお知らせ 工事名:東岡崎駅前広場整備工事
 請負金額:62,424,000円 工期:平成30年9月7日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工2,775㎡、側溝工120m、地盤改良工707㎡
 ペDESTリアンデッキ(駅前通路)下の広場整備を行います。
 2月は、舗装工、電気設備工、側溝工等を行います。
 工事中は、皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

朝日・大伸JVからのお知らせ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
 請負金額:565,920,000円 工期:平成29年6月27日~平成31年10月31日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
 ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
 2月は、上部工(準備工)を行います。
 工事中は、皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

小原・松尾JVからのお知らせ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
 請負金額:462,996,000円 工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
 高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
 ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
 2月は、準備工(鋼桁架設準備)・上部工(鋼製支柱建方、上部桁の地組)を行います。
 資材の搬入・搬出作業を、夜間(21:00~6:00)に行う場合があります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JVからのお知らせ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
 請負金額:336,960,000円 工期:平成29年12月25日~平成31年12月27日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
 高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
 ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。
 2月は、上部工(現場塗装)及び上屋・高欄工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)小原建設からのお知らせ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
 請負金額:282,960,000円 工期:平成30年12月26日~平成31年12月27日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:エレベーター1基、エスカレーター2基、電気設備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
 ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
 2月は、準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

名鉄Eエンジニア(株)からのお知らせ 工事名:交通信号機等移設工事
 請負金額:38,800,000円 工期:平成30年8月2日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:交通信号機移設工 1式、統合柱設置工 1式
 本工事は、東岡崎駅東交差点改良工事に伴う、ハンドホール設置・統合柱の設置を行います。
 2月は、信号柱の抜柱作業を行います。駅前道路の片側交互規制を予定しています。
 また、下旬頃に東側横断歩道切替に伴う、本工事取付の歩行者用信号機の点灯予定をしています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ 工事名:市道上明大寺3号線ほか1路線道路改良工事
 請負金額:87,696,000円 工期:平成30年8月9日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工 A=3342㎡、側溝工 L=170m、路側防護欄工 L=198m、照明工 N=4基
 本工事は、市道上明大寺3号線と市道竜美丘1号線の道路改良工事を行います。
 2月は、竜美丘1号線の歩道舗装、路肩舗装、切削・表層工を行います。一部夜間工事を伴い、
 車道幅員減少、片側交互通行での作業を予定しています。
 上明大寺3号線については付帯工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ 工事名:市道明大寺川端4号線道路改良工事
 請負金額:63,720,000円 工期:平成30年9月5日~平成31年2月28日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工1,657㎡、縁石工218m、照明工17基
 本工事は市道明大寺川端4号線の道路改良工事を行います。
 2月は工事範囲内にて清掃及び測量を行っていきます。
 河川側の単管ハリケートはありますが、一般車及び歩行者の切り回し等の規制はありません。
 今月も先月同様、一般車及び歩行者との接触が無いように、
 隣接工事と調整を行い安全第一で作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年2月)

工事名	工事種類	日																												工事担当部署/施工者			
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28		
東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業	北店舗棟																														内外装工事	拠点整備課 / スターツCAM(株)	1月末 工事進捗率 実績 48.0 % 予定 48.0 %
	ホテル棟																													内外装工事			
	駐車場棟																														基礎工事		
	南店舗棟																														躯体工事		
仮設駐輪場整備工事(その2)		工事完了																												拠点整備課 / (株)アイセイ電設			
乙川プロムナード整備工事(右岸)(菅生町地内)	側溝工																														側溝工: 車両通行止	道路維持課 / 浅井土木建設(株)	1月末 工事進捗率 実績 33.4 % 予定 47.1 %
	坂路工																														坂路工: 坂路 車両通行止		
	人孔蓋調整																														人孔調整工: 車両通行止		
	舗装工																														舗装工: 車両通行止		
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2(唐沢町ほか1箇町地内)	緑石工																														地先ブロック設置工事: 幅員減少	道路維持課 / (株)山口土木	1月末 工事進捗率 実績 24.7 % 予定 25.0 %
	構造物撤去工																														構造物取撤去: 幅員減少		
	照明工																														照明設置工事: 幅員減少		
	舗装工																														舗装工: 車両通行止		
乙川プロムナード整備工事(左岸)	緑石工																															道路建設課 / 松尾建設(株)	1月末 工事進捗率 実績 60.0 % 予定 59.9 %
	構造物撤去工																																
	舗装工																																
	仮設工																																
吹矢橋 橋りょう耐震補強工事	桁補強工 横桁増設補強																															道路建設課 / 朝日工業(株)	1月末 工事進捗率 実績 55.0 % 予定 72.0 %
	桁補強工 横桁撤去・足場工																																
	桁補強工 緑端拡幅																																
	桁補強工 横桁復旧補強																																
橋梁補修工事(明代橋)	剥落防止工																															愛知県 西三河建設事務所 道路整備課 / 小原建設(株)	1月末 工事進捗率 実績 43.0 % 予定 45.3 %
	排水管設置工																																
	排水樋設置工																																
	鳥害対策工																																
河川環境整備工事 河川環境対策工事 合併工事	13号階段工																														植生工	愛知県 西三河建設事務所 河川港湾整備課 / 成瀬建設(株)	1月末 工事進捗率 実績 35.7 % 予定 32.0 %
	20号階段工																													植生工			
	8号坂路工																													舗装工			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

スターツCAM(株)からののお知らせ 工事名: 東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業
 工期: 平成30年4月10日 ~ 平成31年7月31日
 作業時間: 原則8時 ~ 18時まで(作業状況により時間を延長する場合があります。)
 工事概要: ホテル棟 S造9階建て、北店舗棟 S造3階建て、南店舗棟 S造3階建て、駐車場棟 S造5層6段
 本工事は東岡崎駅前に商業施設を建設する工事を行っております。2月より駐車場棟工事も開始します。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からののお知らせ 工事名: 仮設駐輪場整備工事(その2)
 [工事完了]
 工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

浅井土木建設(株)からののお知らせ 工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)
 請負金額: 53,892,000円 工期: 平成30年9月27日 ~ 平成31年3月28日
 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長する場合があります。)
 工事概要: 工事施工延長 L=275m、側溝工 L=275m、舗装工 A=1597㎡
 本工事は、側溝、舗装をきれいにする工事を行います。
 2月初旬は、側溝工、坂路工を行います。2月中旬から下旬は、人孔蓋調整と舗装工事を行います。
 作業時は、「車両通行止」の交通規制を予定しています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からののお知らせ 工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸) その2
 請負金額: 67,716,000円 工期: 平成30年10月22日 ~ 平成31年3月28日
 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで(作業状況により時間延長する場合があります。)
 工事概要: 工事施工延長 L=392m、側溝工 L=27m、舗装工 A=1701㎡
 本工事は、側溝、舗装をきれいにし、照明を設置する工事を行います。
 2月初旬 ~ 中旬は、(仮)乙川人道橋より西側の地先ブロック設置工事、照明工事を行います。
 2月下旬は(仮)乙川人道橋より東側の舗装工事を行います。
 舗装を施工する際は「車両通行止」の交通規制を予定しています。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設(株)からののお知らせ 工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)
 請負金額: 53,352,000円 工期: 平成30年9月26日 ~ 平成31年3月15日
 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長する場合があります。)
 工事概要: 舗装工 A=1,535㎡、側溝工 L=140m、緑石工 L=379m
 本工事は、河川側へ歩道を新設し、舗装を全面きれいにします。
 先月に引き続き、緑石工事及び舗装撤去工事を行い12月12日頃から舗装工事を行います。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からののお知らせ 工事名: 吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
 請負金額: 120,960,000円 工期: 平成30年9月7日 ~ 平成31年3月25日
 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長する場合があります。)
 工事概要: 上部工補強工、上部工補修工
 上部工耐震補強工5箇所の内の1次施工3箇所が初旬に完了します。引き続き、2次施工を行ってまいります。2月11日は祝日ですが、軽微な作業を行います。
 工事に伴い左岸堤防道路通行止め(昼間)および、河川敷歩道通行止め(終日)ならびに吹矢橋上流側歩道の通行止め(昼間)を行います。ご利用の皆様にはご不便をおかけします。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

小原建設(株)からののお知らせ 工事名: 橋梁補修工事(一般県道 東大見岡崎線(明代橋))
 請負金額: 93,312,000円 工期: 平成30年7月24日 ~ 平成31年3月20日
 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長する場合があります。)
 工事概要: 断面修復工 1.4m3、剥落防止工 461m2、表面保護工 1,833m2、鳥害対策工 622m、仮設工 1式
 本工事は、明代橋の上部下面のはく離、ひび割れ等を補修する工事と歩道タイルを補修する工事を行います。
 1月に歩道タイルの施工が完成しました。歩行者の皆様のご理解・ご協力ありがとうございました。
 2月より剥落防止と排水管と排水樋の施工を実施します。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からののお知らせ 工事名: 河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事
 請負金額: 26,568,000円 工期: 平成30年10月3日 ~ 平成31年3月15日
 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長する場合があります。)
 工事概要: 工事延長L=63m、坂路工N=1箇所、階段工N=2箇所
 本工事は、殿橋上流左岸の階段を、明代橋上流右岸の坂路及び階段を設置する工事です。
 現在、明代橋 ~ 吹矢橋間右岸遊歩道は通行出来ません。
 (他工事との調整により、右岸: 吹矢橋 ~ (仮)乙川人道橋付近まで利用できません)
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年2月)

工事名	工事種類	日																												工事担当部署/施工者		
		曜	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	
		日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
配水管布設工事 (耐震管3工区)	準備工																													水道工事課 /セイコー建設(有)		
																																1月末 工事進捗率 実績 0.1% 予定 0.1%
配水管布設替工事	準備工																														水道工事課 /榊河合設備	
																																1月末 工事進捗率 実績 0.5% 予定 0.5%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

セイコー建設(有)からのお知らせ 工事名:配水管布設工事(耐震管3工区)
 請負金額: 31,536,000円 工期:平成31年1月23日～平成31年8月30日
 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 400DIP-E(GX) L=51.2m、 250DIP-E(GX) L=58.1m
 2月は各種占用手続きを行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

榊河合設備からのお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額: 18,457,200円 工期:平成31年1月11日～平成31年3月25日
 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 工事概要: 150DIP-E(GX) L=99.0m、 100DIP-E(GX) L=16.8m
 2月は国道占用などの準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成31年2月号 6/6

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年2月)

岡崎市からのお知らせ

(仮称)乙川人道橋の鋼桁が架設できました。
 2月を迎えまだまだ寒い時期が続きますが、どうぞお体にはお気をつけください。日本の暦で2月は28日までと日数の短い月という印象があります。エチオピアでは1月～12月は30日あり、残りの日数はなんと「13日」となるそうです。1月の日数が均されているので覚えやすく頭を悩ますことは少なくなりそうですね。
 さて、1月中旬に(仮称)乙川人道橋の鋼桁が架設できました。堤防上からこの橋の大きさを見ていただけるようになりました。完成までにはまだ多くの工程が残っており、引き続き規制等でご迷惑をお掛けします。安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解ご協力をお願いします。

今月の関連行事

特になし


連絡先

岡崎市担当:

- 乙川リバーフロント推進課 技術係
 - 【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝、籠田公園、仮設道路】 中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- 水道工事課
 - 北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482【配水管布設替、人道橋】
 - 南部方面係 永井、柴田 TEL:0564-23-6367【配水管布設替】
- 拠点整備課
 - 技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
 - 【ベデストリアンデッキ、交通信号機、道路改良、駅前広場、仮設駐輪場】 総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452【北東街区有効活用事業】
- 下水道施設課【下水道管渠】
 - 管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
 - 管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
- 道路維持課
 - 南東部係 新川 TEL:0564-23-6233【プロムナード】
- 道路建設課
 - 工事係 大澤、和出 TEL:0564-23-6743【プロムナード】
 - 橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230【吹矢橋】
- 建築課 計画係【籠田公園】
 - 大橋 TEL:0564-23-6321
- 愛知県担当:
 - 西三河建設事務所道路整備課【橋梁補修工事(明代橋)】 石川 TEL:0564-27-2756
 - 西三河建設事務所河川港湾整備課【階段・坂路工事】 太田、中田 TEL:0564-27-2752

施工者:

- 【人道橋】
 - ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
 - ・配水管添架 フジ興業(株) 西田 TEL:0564-25-0417
 - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【乙川河川緑地】
 - ・その1 (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013
 - ・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
- 【籠田公園】
 - ・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
 - ・トイレ・ステージ等新築工事 杉林建設(株) 宮城 TEL:0564-22-5215
- 【乙川プロムナード整備工事】
 - ・左岸 松尾建設(株) 宇野 TEL:0564-21-0305
 - ・右岸 浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308
 - ・右岸その2 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
- 【吹矢橋】
 - ・朝日工業(株) 牧野 TEL:0564-51-3655
- 【橋梁補修工事(明代橋)】
 - ・小原建設(株) 榊原 TEL:0564-51-2623

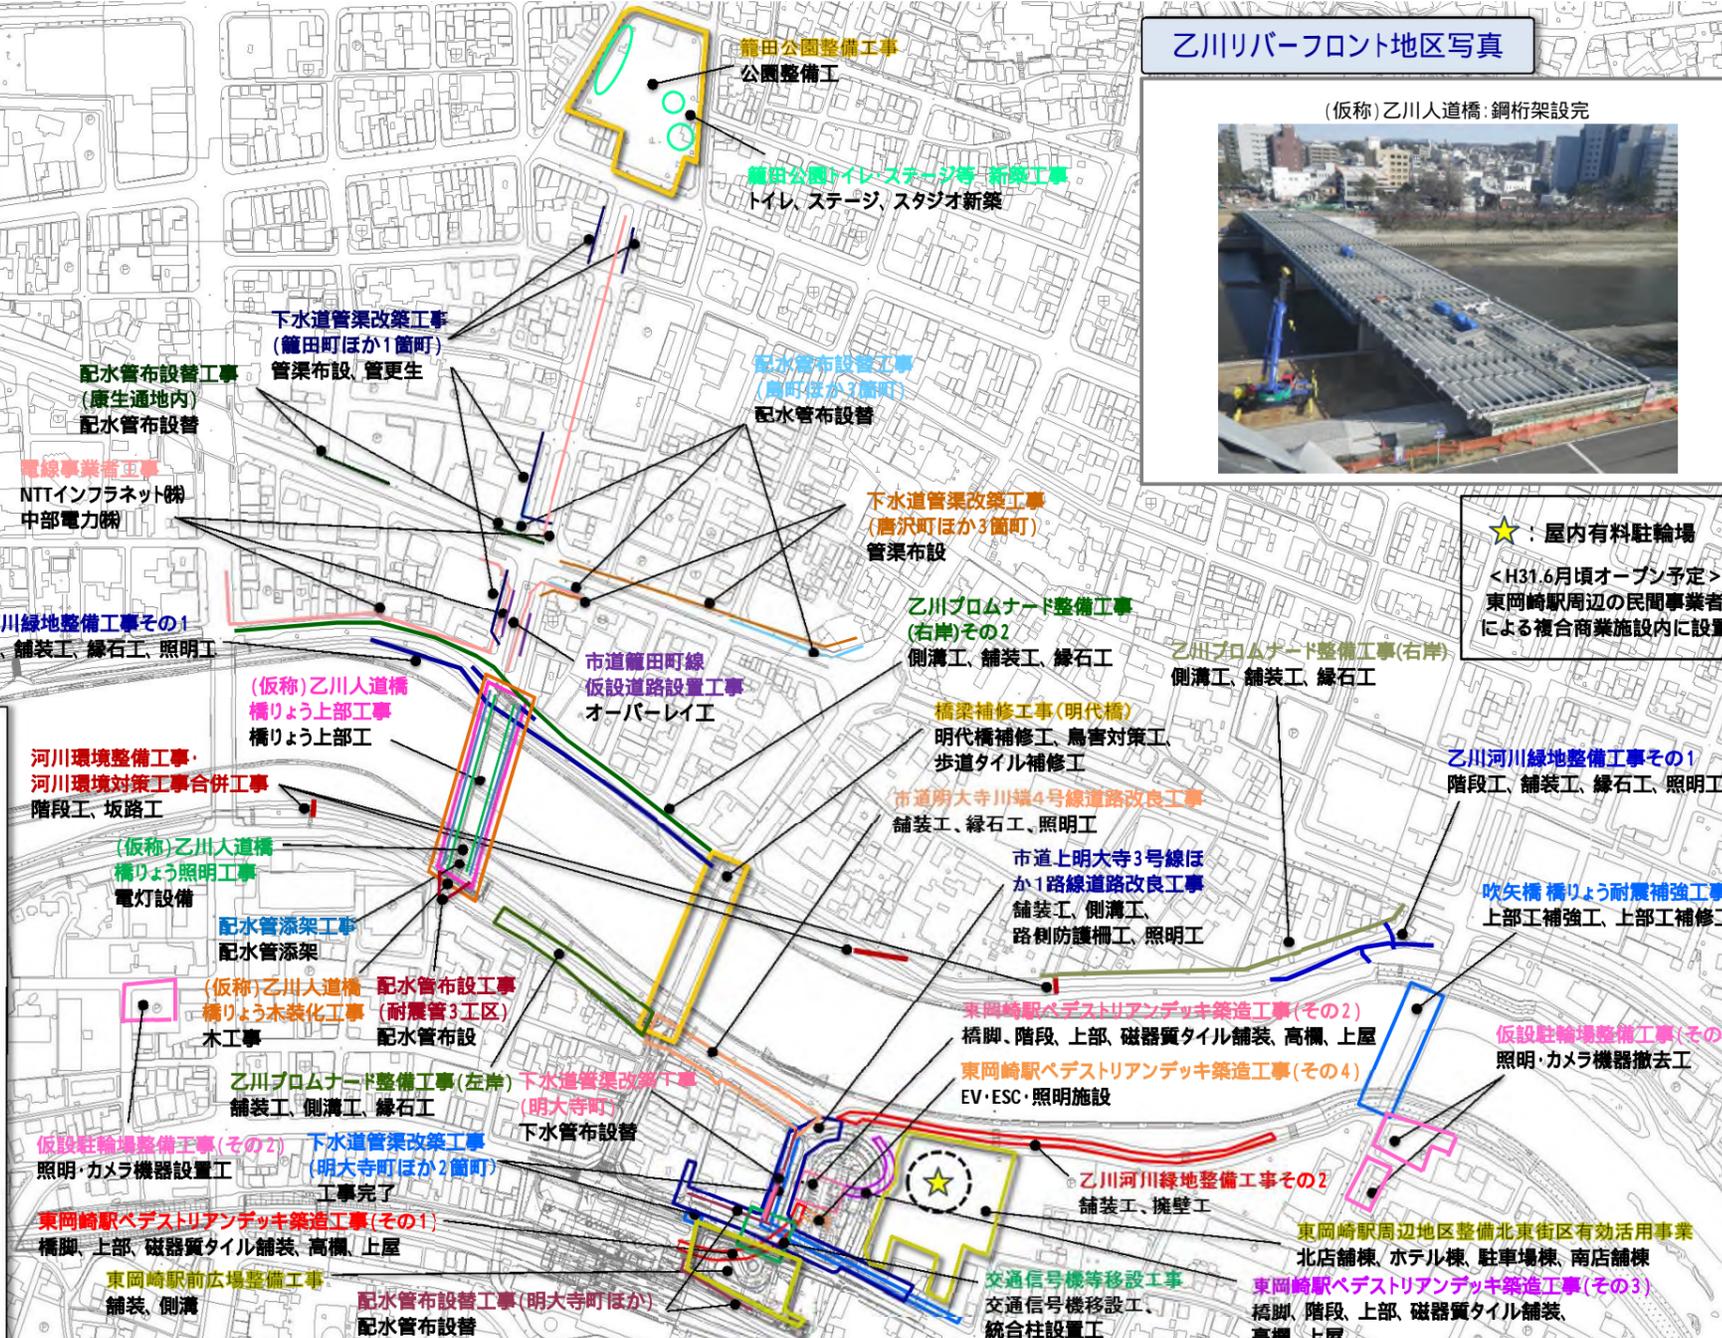

乙川リバーフロント地区写真



★: 屋内有料駐輪場
 <H31.6月頃オープン予定>
 東岡崎駅周辺の民間事業者による複合商業施設内に設置

- 【河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事】
 - ・成瀬建設(株) 福尾 TEL:0564-46-2050
- 【ベデストリアンデッキ】
 - ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
 - ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622
- 【駅前広場】
 - ・朝日工業(株) 宮本 TEL:0564-51-3655
- 【道路改良工事】
 - ・市道上明大寺3号線ほか1 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
 - ・市道明大寺川端4号線 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
- 【交通信号機等移設工事】
 - ・名鉄EIエンジニア(株) 砂場 TEL:0564-33-0246
- 【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】
 - ・スターツCAM(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136
- 【仮設駐輪場】
 - ・その2 アイセイ電設(株) 兼元 TEL:0564-25-2260
- 【仮設道路】
 - ・(株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
- 【配水管布設替】
 - ・鳥町ほか 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139
 - ・康生通 (株)河合設備 河合 TEL:0564-24-8533
 - ・明大寺町ほか (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
 - ・耐震管3工区 セイコー建設(有) 鈴木 TEL:0564-25-2559
- 【下水道管渠】
 - ・唐沢町ほか3 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460
 - ・籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570
 - ・明大寺町ほか2 (株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013 <工事完了>
 - ・明大寺町 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
- 【電線事業者工事(NTTインフラネット) 担当 太高 TEL:052-746-6814】
 - ・NDS(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事(中部電力) 担当 原 TEL:0564-55-5070】
 - ・(株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
 - ・ " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
 - ・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替工)
