

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年3月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者	
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事	架設工 現場塗装工																																乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV	
																																		2月末 工事進捗率 実績 78.1% 予定 78.4%
配水管添架工事 (耐震管2工区)	工場製作																																水道工事課 /フジ興業(株)	
	添架工 上流側																																2月末 工事進捗率 実績 5.2% 予定 5.2%	
	添架工 下流側																																	
(仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /小原木材(株)	
																																	2月末 工事進捗率 実績 0.2% 予定 0.2%	
(仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /第一電力建設(株)	
	配管支持金具取付																																2月末 工事進捗率 実績 0.5% 予定 0.5%	
乙川河川緑地整備 工事その1	園路工 吹矢橋下流右岸																																乙川リバーフロント推進課 /株加藤組	
	園路工 明代橋下流右岸																																	2月末 工事進捗率 実績 63.3% 予定 70.8%
	橋詰工 擁壁工・階段工																																	
	準備工																																	
乙川河川緑地整備 工事その2	擁壁工																																乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株)	
	階段工																																	2月末 工事進捗率 実績 68.3% 予定 68.3%
	護岸工																																	
	片付け																																	
市道籠田町線 仮設道路設置工事	防護柵工																																乙川リバーフロント推進課 /株山口土木	
	道路付属施設工																																	2月末 工事進捗率 実績 86.5% 予定 51.0%
	区画線工																																	
電線事業者 による工事	NTTインフラネット(株) 土木班(NDS株)																																乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株)	
	中部電力(株) (トーエネック株)																																	2月末 工事進捗率 実績 86.5% 予定 51.0%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

小原・朝日JV からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事
請負金額: 85,040,000円 工期:平成29年12月25日~平成32年2月28日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
工事概要:橋りょう上部工N=1式
3月の作業は現場塗装のみとなります。ご迷惑をおかけしておりました左岸(南側)河川敷遊歩道は、3月から解放する予定です。しばらくは人力作業で大きな資機材の出入りもありませんので、騒音振動及び堤防道路の規制予定はありません。4月上旬から床版工事が始まることと資材の搬入時のみ堤防道路の規制(幅員減少)を行う事があります。
3/21の祝日は、特定建設作業に該当しない作業を行う予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

フジ興業(株) からのお知らせ 工事名:配水管添架工事(耐震管2工区)
請負金額: 75,600,000円 工期:平成30年12月10日~平成31年5月31日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
工事概要: 250A SUS 249.2m
3月6日より添架工事に入ります。右岸側より始めます。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原木材(株) からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事
請負金額: 47,304,000円 工期:平成31年1月24日~平成32年3月19日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
工事概要:木工事N=1式
本工事は、(仮称)乙川人道橋の木装化工事を行います。
3月は、準備工となります。
工事期間中、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力願います。

第一電力建設(株) からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事
請負金額: 51,300,000円 工期:平成31年1月23日~平成32年3月19日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
工事概要:電灯設備N=1式
本工事は、(仮称)乙川人道橋へ照明を設置する工事を行います。
3月は、配管支持金具の取付工事を行います。
工事期間中、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力願います。

(株)加藤組 からのお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その1
請負金額: 68,526,000円 工期:平成30年10月5日~平成31年3月22日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
工事概要: 階段工 1式、アスファルト舗装工 A=1050m²、園路緑石工 L=776m、照明設備工 N=198基
本工事は、右岸緑地内の園路整備を行います。
3月の予定は、A工区(吹矢橋下流右岸)で緑石、舗装、埋込照明を施工予定です。
B工区(明代橋下流右岸)で舗装の洗い出し仕上げを施工します。
橋詰部では、堤防道路を引続き幅員減少にて護岸の石張りを行います。
3月末には園路開放予定です。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

成瀬建設(株) からのお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その2
請負金額: 85,104,000円 工期:平成30年10月5日~平成31年3月22日
作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
工事概要:舗装工A=1300m²、擁壁工N=1式
3月は、階段と護岸工(石張り)を行った後、舗装を復旧し工事完了です。
3月12日(火)9:00に堤防道路(吹矢橋~明代橋間)の規制を解除する予定です。
工事期間中ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力願います。

(株)山口土木 からのお知らせ 工事名:市道籠田町線仮設道路設置工事
請負金額: 2,418,120円 工期:平成30年12月11日~平成31年3月28日
作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
工事概要:オーバーレイ工A=89m²
本工事は、電線共同溝の設備工事に伴い仮設道路を設置します。
3月は、電柱支柱後、仮設道路を拡幅します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

電線事業者による工事について
工事概要:電線共同溝設備の設置など
乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年3月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成31年3月号 5/5

岡崎市からのお知らせ

桜の季節がやってきました。

2月前半は北日本を中心に一時的に強い寒波が流れ込み冷え込みました。後半は平年より暖かい日が続いてきており、3月も暖かい日が多くなる予報です。これにより今年の桜の開花予想は平年より早く3月20日頃となっています。

さて、RF地区工事の多くは3月に一区切りとなり、桜まつりが始まる3月27日には乙川河川緑地内の規制は一部を残して開放する予定です。4月以降は(仮称)乙川人道橋関連工事、籠田公園整備、ベデストリアンデッキ整備関連工事などは4月以降も引き続き施工を行ってまいります。ご迷惑をお掛けしますが、完成に向けて安全第一で施工を進めてまいります。

今月の関連行事

- ・桜まつり3月27日～4月12日
- ・夜桜照明は3月27日から実施予定
- ・桜の開花状況により、期間を変更する場合があります


連絡先

岡崎市担当:

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係
 - 【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝、籠田公園、仮設道路】
 - 中田、山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課
 - 北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482【配水管布設替、人道橋】
 - 南部方面係 永井、柴田 TEL:0564-23-6367【配水管布設替】
- ・拠点整備課
 - 技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
 - 【ベデストリアンデッキ、交通信号機、道路改良、駅前広場】
 - 総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452【北東街区有効活用事業】
- ・下水道施設課【下水道管渠】
 - 管渠対策係 古川、鶴田 TEL:0564-23-6730
 - 管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
- ・道路維持課
 - 南東部係 新川 TEL:0564-23-6233【プロムナード】
- ・道路建設課
 - 工事係 大澤、和出 TEL:0564-23-6743【プロムナード】
 - 橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230【吹矢橋】
- ・建築課 計画係【籠田公園】
 - 大橋 TEL:0564-23-6321
- 愛知県担当:
 - ・西三河建設事務所道路整備課【橋梁補修工事(明代橋)】
 - 石川 TEL:0564-27-2756
 - ・西三河建設事務所河川港湾整備課【階段・坂路工事】
 - 太田、中田 TEL:0564-27-2752

施工者:

- 【人道橋】
 - ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
 - ・配水管添架 フジ興業(株) 西田 TEL:0564-25-0417
 - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【乙川河川緑地】
 - ・その1 (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013
 - ・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
- 【籠田公園】
 - ・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
 - ・トイレ・ステージ等新築工事 杉林建設(株) 宮城 TEL:0564-22-5215
- 【乙川プロムナード整備工事】
 - ・左岸 松尾建設(株) 宇野 TEL:0564-21-0305
 - ・右岸 浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308
 - ・右岸その2 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
- 【吹矢橋】
 - ・朝日工業(株) 牧野 TEL:0564-51-3655
- 【橋梁補修工事(明代橋)】
 - ・小原建設(株) 榎原 TEL:0564-51-2623

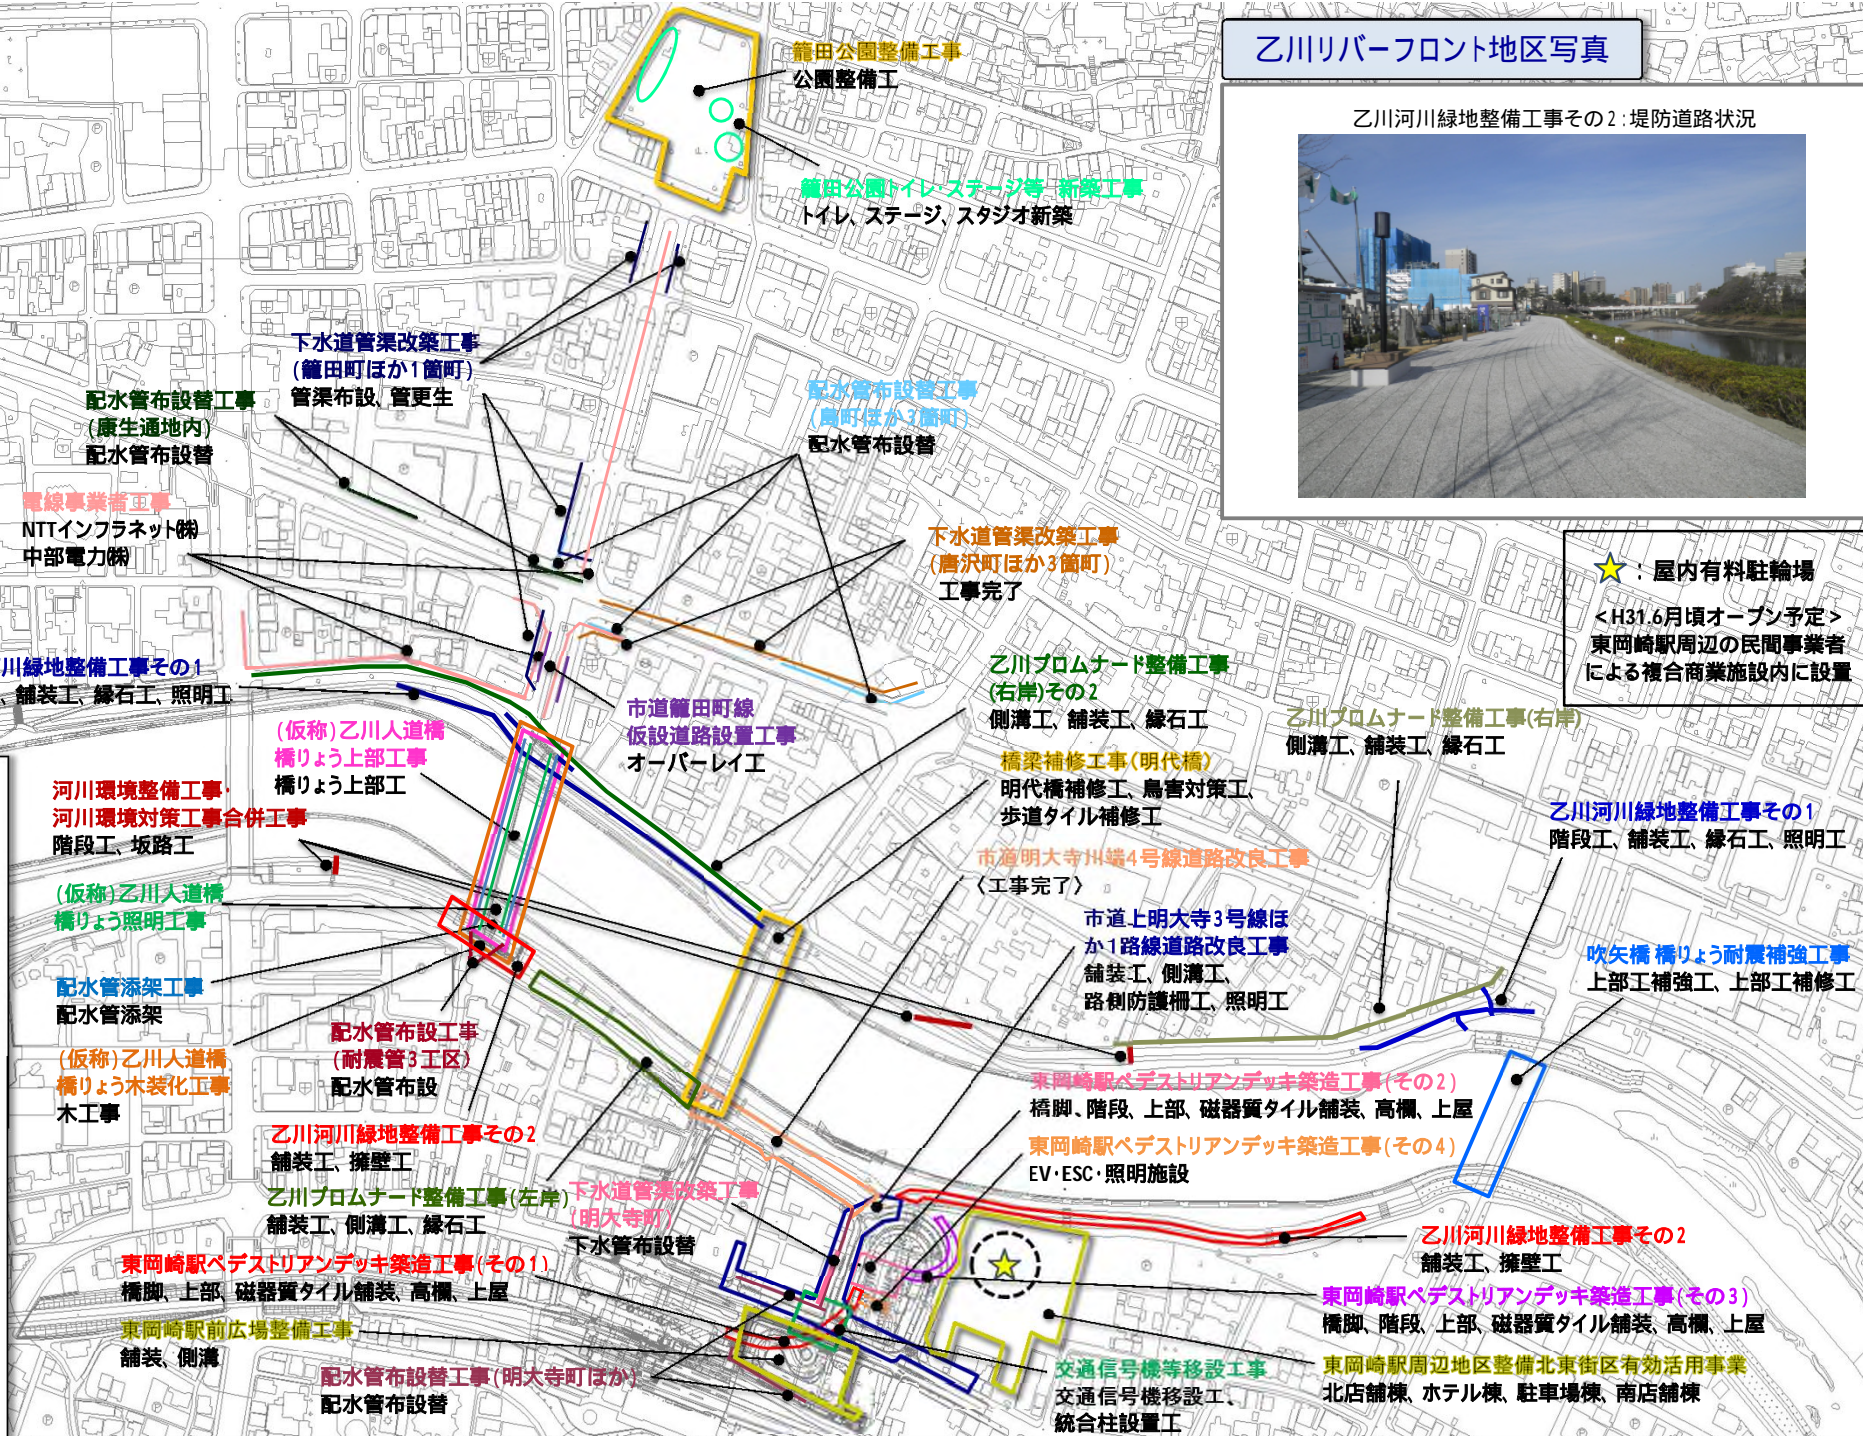

乙川リバーフロント地区写真



★：屋内有料駐輪場
 <H31.6月頃オープン予定>
 東岡崎駅周辺の民間事業者による複合商業施設内に設置

- 【河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事】
 - ・成瀬建設(株) 福尾 TEL:0564-46-2050
- 【ベデストリアンデッキ】
 - ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
 - ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622
- 【駅前広場】
 - ・朝日工業(株) 宮本 TEL:0564-51-3655
- 【道路改良工事】
 - ・市道上明大寺3号線ほか1 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
 - ・市道明大寺川端4号線 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814 工事完了
- 【交通信号機等移設工事】
 - ・名鉄E1エンジニア(株) 砂場 TEL:0564-33-0246
- 【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】
 - ・スターツCAM(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136
- 【仮設道路】
 - ・(株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570

- 【配水管布設替】
 - ・鳥町ほか 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139
 - ・康生通 (株)河合設備 河合 TEL:0564-24-8533
 - ・明大寺町ほか (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
 - ・耐震管3工区 セイコー建設(有) 鈴木 TEL:0564-25-2559
- 【下水道管渠】
 - ・唐沢町ほか3 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460 工事完了
 - ・籠田町ほか1 (株)山口土木 山本 TEL:0564-65-6570
 - ・明大寺町 小原建設(株) 田邊 TEL:0564-51-2623
- 【電線事業者工事(NTTインフラネット) 担当 太高 TEL:052-746-6814】
 - ・NDS(株) 近藤 TEL:0564-55-2020
- 【電線事業者工事(中部電力) 担当 原 TEL:0564-55-5070】
 - ・(株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
 - ・ " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)
 - ・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)
