

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		令和元年5月号 1 / 4	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年5月)																																		
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者			
		曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
(仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事	床版工 鉄筋工																																			乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV	4月末 工事進捗率 実績 84.4 % 予定 89.8 %
	アンカー工																																				
	仮設工 吊足場解体																																				
配水管添架工事 (耐震管2工区)	片付け工																																			水道工事課 /フジ興業(株)	4月末 工事進捗率 実績 98.0 % 予定 83.1 %
(仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事	準備工																																			乙川リバーフロント推進課 /小原木材(株)	4月末 工事進捗率 実績 0.4 % 予定 0.4 %
(仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事	準備工																																			乙川リバーフロント推進課 /第一電力建設(株)	4月末 工事進捗率 実績 10.0 % 予定 10.0 %
籠田公園整備工事	園路・緑石工事																																			乙川リバーフロント推進課 /朝日・松尾JV	4月末 工事進捗率 実績 39.1 % 予定 39.2 %
	舗装工事																																				
	サービス施設工事																																				
	植栽工																																				
籠田公園トイレ・ステージ等新築工事	トイレ新築工事																																			建築課 /杉林建設(株)	4月末 工事進捗率 実績 90.9 % 予定 91.0 %
	ステージ新築工事																																				
	スタジオ新築工事																																				
中央緑道等整備工事	準備工																																			乙川リバーフロント推進課 /小原建設(株)	4月末 工事進捗率 実績 2.6 % 予定 2.6 %
配水管布設工事 (耐震管3工区)	管布設工 (φ250)																																			水道工事課 /セイコー建設(有)	4月末 工事進捗率 実績 23.0 % 予定 23.0 %
	管布設工 (φ300)																																				
	管布設工 (φ400)																																				
工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。																																					
小原・朝日JV からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事 ■ 請負金額: 851,040,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日 ~ 令和2年2月28日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 橋りょう上部工N=1式 今月も引き続き床版工事(鉄筋組立)を行います。連休明けに左岸河川敷よりクレーンによる鉄筋材料搬入を予定しています。鉄筋組立終了後、床版コンクリート打設(6月上旬 ~ 6月中旬予定)となります。コンクリート打設時は南北2か所にコンクリートポンプ車を設置し、生コン車延べ140台搬入となります。北側は堤防道路の規制(幅員減少)を予定しております。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。																																					
フジ興業(株) からのお知らせ ■ 工事名: 配水管添架工事 (耐震管2工区) ■ 請負金額: 75,600,000円 ■ 工期: 平成30年12月10日 ~ 令和元年5月31日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: φ250A SUS 249.2m 5月は現場を規制しての作業は予定しておりません、片付け作業をさせていただき5月中旬に完成検査を受ける予定です。																																					
小原木材(株) からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事 ■ 請負金額: 47,304,000 円 ■ 工期: 平成31年1月24日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 木工事N=1式 本工事は、桜城橋の木装化工事を行います。5月は、準備工となります。工事期間中、ご迷惑お掛けしますがご理解ご協力願います。																																					
第一電力建設(株) からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事 ■ 請負金額: 51,300,000円 ■ 工期: 平成31年1月23日 ~ 令和2年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 電灯設備N=1式 本工事は、桜城橋へ照明を設置する工事を行います。5月は、準備工となります。工事期間中、ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力願います。																																					
朝日・松尾JVからのお知らせ ■ 工事名: 籠田公園整備工事 ■ 請負金額: 406,061,640円 ■ 工期: 平成30年6月26日 ~ 令和元年7月26日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事 本工事は公園のリニューアル工事を行っています。公園外周の歩道部分の工事を行うにあたり、地下駐車場出入口を部分的に閉鎖させていただきます。閉鎖期間等の情報については、出入口に掲示してお知らせいたします。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。																																					
杉林建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 籠田公園トイレ・ステージ等新築工事 ■ 請負金額: 117,828,000円 ■ 工期: 平成30年9月6日 ~ 令和元年6月7日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: トイレ新築 120.6㎡、ステージ新築 90.16㎡、スタジオ新築 3基 本工事は籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。今月は、外構工事・仕上工事を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。																																					
小原建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 中央緑道等整備工事 ■ 請負金額: 66,204,000円 ■ 工期: 平成31年3月28日 ~ 令和2年1月31日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 公園工事、道路改良工事、電気設備工事、機械設備工事 本工事は、中央緑道の公園整備工事と市道籠田町線の道路改良工事を行います。5月は、準備工、事前測量を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。																																					
セイコー建設(有)からのお知らせ ■ 工事名: 配水管布設工事 (耐震管3工区) ■ 請負金額: 31,536,000円 ■ 工期: 平成31年1月23日 ~ 令和元年8月30日 ■ 作業時間: 原則9時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: φ400DIP-E(GX) L=51.2m、φ250DIP-E(GX) L=58.1m 5月は、乙川右岸の中央緑道付近での作業を予定しています。工事中は幅員減少で施工する予定ですのでご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。																																					

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		令和元年5月号 2 / 4	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年5月)																																		
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者			
		曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
配水管布設替工事	準備工																																	水道工事課 /㈱河合設備	4月末 工事進捗率 実績 13.0 % 予定 13.0 %		
	仮設配水管工																																				
	配水管布設替工事																																				
下水道管渠改築工事 (52工区)	準備工																																	下水施設課 /朝日工業㈱	4月末 工事進捗率 実績 2.7 % 予定 2.7 %		
東岡崎駅前広場 整備工事																																		拠点整備課 /朝日工業㈱	工事完了		
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	鋼橋上部工																																	拠点整備課 /朝日・大伸JV	4月末 工事進捗率 実績 89.4 % 予定 85.9 %		
	橋梁付属物工																																				
	上屋工・高欄工																																				
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	足場工																																	拠点整備課 /小原・松尾JV	4月末 工事進捗率 実績 70.0 % 予定 69.4 %		
	鋼橋上部工																																				
	上屋工・高欄工																																				
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	上屋工・高欄工																																	拠点整備課 /加藤・岡崎JV	4月末 工事進捗率 実績 67.8 % 予定 69.7 %		
	橋面工																																				
	橋脚工 (P9・P10・P11)																																				
	構造物復旧工																																				
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)	準備工																																	拠点整備課 /小原建設㈱	4月末 工事進捗率 実績 6.0 % 予定 6.0 %		
	仮設工																																				
	エスカレーター棟																																				
市道上明大寺 3号線道路改良工事	準備工																																	拠点整備課 /㈱加藤組	4月末 工事進捗率 実績 2.1 % 予定 2.1 %		
	構造物撤去工																																				
	排水構造物工																																				

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

㈱河合設備からのお知らせ ■ 工事名:配水管布設替工事
■ 請負金額: 18,457,200円 ■ 工期:平成31年1月11日～令和元年7月31日
■ 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要:φ150DIP-E(GX) L=99.0m、φ100DIP-E(GX) L=16.8m
5月中は、国道1号線の中央緑道に面する箇所の施工を行い、終わり次第、西側の施工に移っていきます。
沿線の方にはご迷惑をお掛けしますがよろしく願います

朝日工業㈱からのお知らせ ■ 工事名:下水道管渠改築工事(52工区)
■ 請負金額: 30,996,000円 ■ 工期:平成31年3月29日～令和元年9月20日
■ 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要:管渠更生工 φ400 L=8m φ300 L=50m φ250 L=15m φ230 L=73m
管渠工(開削) φ250 L=41m,人孔工 4箇所
本工事は、長期間使用して老朽化した下水道管の機能を回復させるための工事を行います。
5月は既設埋設物調査及び道路規制等諸手続きを行います。6月から現場着手する予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■ 工事名:東岡崎駅前広場整備工事
{工事完了}
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

朝日・大伸JVからのお知らせ ■ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■ 請負金額: 565,920,000円 ■ 工期:平成29年6月27日～令和元年10月31日
■ 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
5月は、鋼橋上部工(現場塗装)、上屋工(支柱・パネル設置)、高欄工(支柱設置)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JVからのお知らせ ■ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■ 請負金額: 462,996,000円 ■ 工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日
■ 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
5月は、引き続きデッキの塗装を行いながら、中旬頃から上屋の施工、順次、高欄の施工を行います。
資材の搬入・搬出作業を、夜間(21:00～6:00)に行う場合があります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します

加藤・岡崎JVからのお知らせ ■ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■ 請負金額: 336,960,000円 ■ 工期:平成29年12月25日～令和元年12月27日
■ 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します
5月は、高欄工・橋梁付属工(防水・タイル)・橋脚工(根巻コンクリート)・構造物復旧工を行います。
工事中は皆様にご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(株)小原建設からのお知らせ ■ 工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
■ 請負金額: 282,960,000円 ■ 工期:平成30年12月26日～令和元年12月27日
■ 作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要:エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
5月はエスカレーター棟の基礎山留・根伐り・地中障害撤去を行います。
南側仮囲いを道路占用して、歩道に設置しますので、歩道幅員が減少します。
仮囲い作業中は、誘導員を配置し、通行者、自転車を優先して交通誘導を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

㈱加藤組からのお知らせ ■ 工事名:市道上明大寺3号線道路改良工事
■ 請負金額: 74,412,000円 ■ 工期:平成31年3月25日～令和元年12月27日
■ 作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■ 工事概要:舗装工A=2021㎡ 照明工N=16基
本工事は、上明大寺3号線と竜美丘1号線の道路工事をします。
5月は、既設構造物の撤去、排水構造物(都市型側溝)の作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年5月号 4 / 4

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和元年5月)

岡崎市からのお知らせ

■新元号は「令和」となりました。
本日より、元号が「平成」から「令和」へと変わりました。
「令和」は日本最古の歌集である万葉集の文言を引用しており、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められているそうです。急速に変化する社会にあっても、日本の歴史、文化、伝統を引継ぎながら新しい時代を築いていけるといいですね。
さて、乙川リバーフロント地区の工事は5年目を迎えました。桜城橋の工事は乙川の出水期(梅雨や台風等による集中豪雨などが発生しやすい時期6月～10月)を迎えるにあたり、仮設足場の解体をしていきます。なお、6月以降も堤防より高い箇所での工事は継続して施工していきます。交通規制等ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

今月の関連行事

・五万石藤まつり4月20日～5月6日

乙川リバーフロント地区写真

籠田公園の工事状況




連絡先

- 岡崎市担当:
- ・乙川リバーフロント推進課 技術係
【人道橋、電線共同溝、籠田公園、中央緑道等】
山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
 - ・水道工事課【配水管布設替、人道橋】
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482
 - ・拠点整備課
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
【ベデストリアンデッキ、駅前広場、道路改良】
総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452【北東街区有効活用事業】
 - ・下水施設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川 TEL:0564-23-6730
 - ・道路建設課【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
 - ・建築課 計画係【籠田公園】
大橋 TEL:0564-23-6321
- 愛知県担当:
- ・西三河建設事務所道路整備課 【橋梁補修工事(明代橋)】
石川 TEL:0564-27-2756

- 施工者:
- 【人道橋】
- ・上部工事 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623
 - ・配水管添架 フジ興業(株) 西田 TEL:0564-25-0417
 - ・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
 - ・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
- 【籠田公園】
- ・整備工事 朝日・松尾JV 小出 TEL:0564-51-3657
 - ・トイレ・ステージ等新築工事 杉林建設(株) 宮城 TEL:0564-22-5215
- 【中央緑道等】
- ・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
- 【吹矢橋】
- ・朝日工業(株) 牧野 TEL:0564-51-3655
- 【橋梁補修工事(明代橋)】
- ・小原建設(株) 榊原 TEL:0564-51-2623
- 【工事完了】

- 【ベデストリアンデッキ】
- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655
 - ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623
 - ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013
 - ・その4 小原建設(株) 柴田 TEL:0564-51-2622
- 【駅前広場】
- ・朝日工業(株) 宮本 TEL:0564-51-3655
- 【道路改良】
- ・(株)加藤組 堤 TEL:0564-45-2013
- 【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】
- ・スターツC A M(株) 村山・金子 TEL:0564-65-5136
- 【配水管布設替】
- ・康生通 (株)河合設備 河合 TEL:0564-24-8533
 - ・耐震管3工区 セイコー建設(有) 鈴木 TEL:0564-25-2559
- 【下水道管渠】
- ・52工区 朝日工業(株) 永田 TEL:0564-51-3655

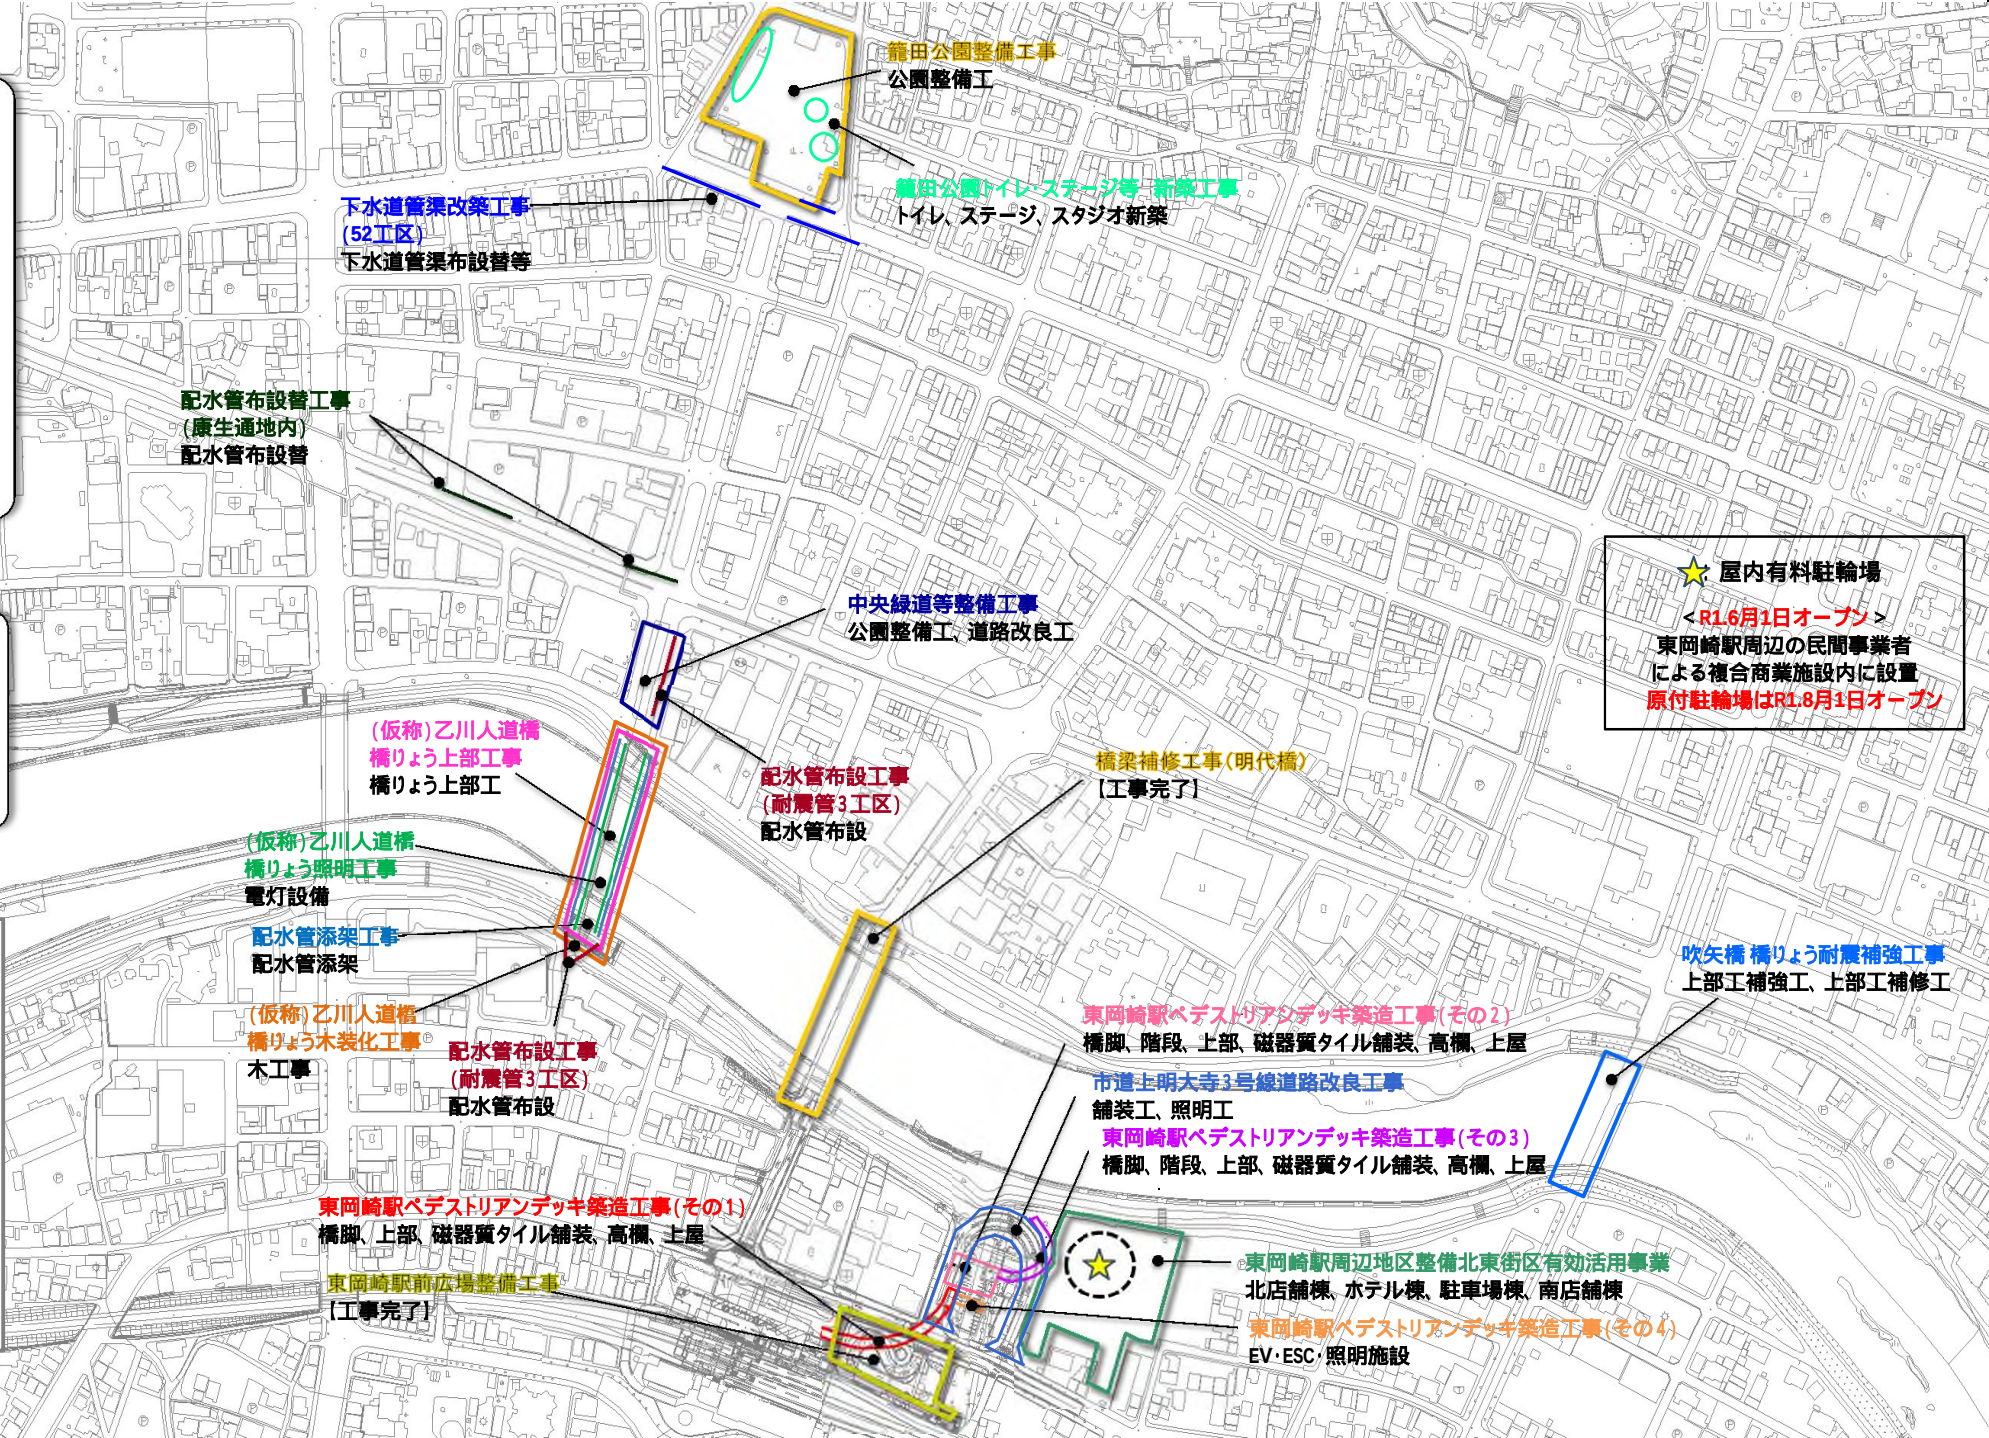

★ 屋内有料駐輪場
<R1.6月1日オープン>
東岡崎駅周辺の民間事業者
による複合商業施設内に設置
原付駐輪場はR1.8月1日オープン
