

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和2年2月)

| 工事名 | 工事種類 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工事担当部署/施工者 | | | |
|----------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | |
| | | 曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | |
| (仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /小原木材(株) | 1月末 工事進捗率 実績 82.0% 予定 82.0% | |
| | 吊り足場工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /第一電力建設(株) | 1月末 工事進捗率 実績 78.0% 予定 85.0% | |
| | 配線工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機器設置工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央緑道等整備工事 | 舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /小原建設(株) | 1月末 工事進捗率 実績 51.9% 予定 61.8% | |
| | 修景施設整備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 植栽工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 園路広場整備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央緑道等整備工事 その2 | 排水構造物工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV | 1月末 工事進捗率 実績 10.0% 予定 8.2% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙川河川緑地整備 工事その1 | アスファルト舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /株岡崎工業 | 1月末 工事進捗率 実績 46.9% 予定 46.9% | |
| | 照明設備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手摺工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙川河川緑地整備 工事その2 | 河川土工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /白濱建設(株) | 1月末 工事進捗率 実績 65.8% 予定 84.8% | |
| | 法覆護岸工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 園路広場・修景 施設整備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 管理施設整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 菅生川端石垣 整備工事 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /白濱建設(株) | 1月末 工事進捗率 実績 10.3% 予定 20.4% | |
| | 園路広場整備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 構造物撤去工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙川プロムナード整 備工事(右岸) | 舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /株山口土木 | 1月末 工事進捗率 実績 52.2% 予定 50.1% | |
| | 道路付属施設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 付帯工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 法面工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

小原木材(株)からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事
 請負金額:47,304,000円 工期:平成31年1月24日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:木工事 N=1式
 本工事は、桜城橋の木装化工事を行います。
 2月は、吊り足場の撤去工事を行います。
 24日は祝日ですが特定建設作業に該当しない作業を行います。
 工事期間中、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。

第一電力建設(株)からのお知らせ 工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事
 請負金額:51,300,000円 工期:平成31年1月23日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:電灯設備 N=1式
 本工事は、桜城橋へ照明を設置する工事を行います。
 2月は、機器取付工事となります。
 工事期間中、ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。

小原建設(株)からのお知らせ 工事名:中央緑道等整備工事
 請負金額:66,204,000円 工期:平成31年3月28日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:公園工事、道路改良工事、電気設備工事、機械設備工事
 本工事は、中央緑道の公園整備工事と市道籠田町線の道路改良工事を行います。
 2月は、中央緑道部の修景施設整備工、植栽工、園路広場整備工と道路部、緑道部の舗装工事を行います。
 16日、23日、24日は祝日ですが作業を行います。
 道路作業は、通行止め、幅員減少、片側交互通行規制にて施工します。
 誘導員を配置して一般車両及び歩行者に十分注意し安全第一で作業を行っていきます。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・朝日JVからのお知らせ 工事名:中央緑道等整備工事その2
 請負金額:499,400,000円 工期:令和元年6月25日~令和2年12月25日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:公園工事、道路改良工事、電気設備工事、機械設備工事
 2月は排水構造物工(側溝・樹)を行います。
 作業中は、歩道・車道幅員減少で施工します。誘導員を配置して安全第一で作業します。
 工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その1
 請負金額:134,530,000円 工期:令和元年9月24日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:アスファルト舗装工 A=3,045m²、園路緑石工 L=1,008m、照明設備工 N=382基
 2月は先月同様に河川敷内の園路舗装工事(仕上げ)を主に工事を進めていきます。
 河川敷内の規制に関しても、先月同様に工事区間を通行止めとして進めていきます。
 新しくなります河川敷内の利用まであと少しとなりました。
 沿線の方及び河川緑地利用者の方にはご迷惑をおかけしますが、
 安全第一で作業を行っていきますので、本工事へのご理解とご協力をお願い致します。

白濱建設(株)からのお知らせ 工事名:乙川河川緑地整備工事その2
 請負金額:74,360,000円 工期:令和元年9月25日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:法覆護岸工 A=1,400、舗装工 A=556m²、照明設備工 N=80基
 2月は、潜水橋下流(右岸)にて施工範囲立入禁止及び一部通行止による瓢箪池の護岸工事、
 殿橋上流(右岸)通行止による園路広場整備・植生工事を予定しています。
 工事期間中は、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

白濱建設(株)からのお知らせ 工事名:菅生川端石垣整備工事
 請負金額:17,930,000円 工期:令和元年12月24日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:アスファルト舗装工 A=301m²、園路緑石工 L=185m
 2月は、潜水橋右岸側に施工範囲立入禁止による構造物撤去工及び園路広場整備工、
 殿橋上流(右岸)にて園路広場整備工を予定しています。
 工事期間中は、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

(株)山口土木からのお知らせ 工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)
 請負金額:52,800,000円 工期:令和元年9月20日~令和2年3月19日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工 A=1,925m² 側溝工 L=80m 緑石工 L=83m
 本工事は、側溝、照明、舗装を設置する工事を行っています。
 2月は舗装工、道路付属施設工(車止めポスト)、付帯工(石張り護岸)、法面工を行います。
 舗装施工中、通行止(昼間)となります。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和2年2月)

| 工事名 | 工事種類 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工事担当部署/施工者 | | |
|-----------------------------------|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 |
| | | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 道路整備工事 | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 乙川リバーフロント推進課 /フジエ建設(株) | 1月末 工事進捗率 実績 14.4% 予定 14.4% |
| | 撤去工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水管布設工事 (唐沢町ほか1箇町) | バルブBOX調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水道工事課 /尾崎工業(株) | 1月末 工事進捗率 実績 97.0% 予定 94.0% |
| | 雑工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水管布設工事 (耐震管2工区) (唐沢町ほか1箇町) | バルブBOX調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 水道工事課 /尾崎工業(株) | 1月末 工事進捗率 実績 95.0% 予定 57.0% |
| | 雑工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 休工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道管渠改築工事 (56工区) | 付帯工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 下水施設課 /㈱東洋工務店 | 1月末 工事進捗率 実績 93.6% 予定 99.2% |
| | 舗装復旧工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道管渠改築工事 (61工区) | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 下水施設課 /㈱東洋工務店 | 1月末 工事進捗率 実績 6.8% 予定 6.8% |
| | 管渠更生工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道管渠改築工事 (76工区) | 集水樹工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 下水施設課 /丸三建設(株) | 1月末 工事進捗率 実績 55.6% 予定 32.0% |
| | 管渠布設替工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 埋戻し工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明大寺交通広場 整備工事 | 舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拠点整備課 /㈱加藤組 | 1月末 工事進捗率 実績 81.5% 予定 83.6% |
| | 安全施設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 付帯工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乙川プロムナード整 備工事(左岸) | 付帯工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道路建設課 /成瀬建設(株) | 1月末 工事進捗率 実績 96.0% 予定 89.2% |
| | 後片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

フジエ建設(株)からののお知らせ 工事名:道路整備工事
 請負金額:2,695,000円 工期:令和元年11月12日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工A=118m2
 歩道の舗装打ち換えを行う工事です。
 2月下旬より舗装の取り壊しと現場着手を予定しています。
 他工事との調整により、3月への工期延期を予定しています。
 工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

尾崎工業(株)からののお知らせ 工事名:配水管布設替工事
 請負金額:9,020,000円 工期:令和元年8月26日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:150DIP-E(GX) L=11.5m、100DIP-E(GX) L=104.2m
 布設替を終えた埋設配管のバルブBOX高さを、道路整備工事にあわせ調整作業を行います。
 道路部の掘削作業となりますが、車両・歩行者は通行出来るよう施工いたします。
 工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

尾崎工業(株)からののお知らせ 工事名:配水管布設工事(耐震管2工区)
 請負金額:7,590,000円 工期:令和元年9月17日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:250DIP-E(GX) L=33.3m、150DIP-E(GX) L=5.6m
 布設を終えた埋設配管のバルブBOX高さを、道路整備工事にあわせ調整作業を行います。
 道路部の掘削作業となりますが、車両・歩行者は通行出来るよう施工いたします。
 工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

㈱東洋工務店からののお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事(56工区)
 請負金額:48,730,000円 工期:令和元年6月14日~令和2年2月14日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠更生工 380 L=48m 230 L=266m
 管渠工(開削) 250 L=97m,人孔工 3箇所
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
 2月は舗装の復旧を行います。施工区域は片側交互通行および車両通行止となります。
 現場交通誘導員の誘導に従って迂回をお願いいたします。
 工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

㈱東洋工務店からののお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事(61工区)
 請負金額:72,270,000円 工期:令和元年8月2日~令和2年3月19日
 作業時間:原則21時~6時まで(夜間作業)(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠更生工 680 L=99m 230 L=85m
 本工事は長期間使用して老朽化した下水道管の機能回復を図るものです。
 2月は、管渠更生工を行います。
 施工区域は車線減少及び歩道幅員減少となります。現場交通誘導員の誘導に従って通行をお願いいたします。
 工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

丸三建設(株)からののお知らせ 工事名:下水道管渠改築工事(76工区)
 請負金額:4,466,000円 工期:令和元年11月5日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:管渠工 700 L=3.3m、樹工N=1箇所
 本工事は明大寺橋右岸にある乙川への排水管および樹を布設替えを行う工事です。
 2月は管渠及び樹の布設替え工事を行います。施工区域は遊歩道の通行規制を行います。
 工事中は皆さまにご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

㈱加藤組からののお知らせ 工事名:明大寺交通広場整備工事
 請負金額:82,720,000円 工期:令和元年7月29日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工A=2195m2 側溝工L=70m 照明工N=10基
 本工事は明大寺交通広場の整備工事を行います。
 2月は舗装工事、ライン、安全施設工事を行います。規制予定はありません。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からののお知らせ 工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)
 請負金額:107,690,000円 工期:令和元年7月26日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:舗装工A=1,420m2 側溝工L=121m 縁石工L=322m
 2月は、道路照明灯の設置と現場の片付けなどを行います。月末には新しい道路の完成となります。
 安全第一で工事を進めて参りますが、工事現場は危険ですので
 皆様方におかれましては十分ご注意ください。
 工事中ご迷惑をおかけしますが本工事へご理解ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和2年2月)

| 工事名 | 工事種類 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工事担当部署/施工者 | |
|--------------------------------------|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|--|
| | | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 |
| | | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 市道明大寺本町1号線ほか1路線道路改良工事 | 構造物取壊工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道路建設課 /株アースベル 1月末 工事進捗率 実績 71.4% 予定 91.1% |
| | 地覆工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | タイル舗装(歩道) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車道舗装・区画線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吹矢橋 橋りょう修繕工事(その2) | 仮設足場工事(撤去) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道路建設課 /太田建設(株) 1月末 工事進捗率 実績 85.0% 予定 85.0% |
| | 防水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路整備工事 市道伝馬町線 | 側溝工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道路維持課 /フジ建設(株) 1月末 工事進捗率 実績 67.3% 予定 67.3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川環境整備工事 (交付金) 河川環境対策工事 併工事 | 5号坂路工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 愛知県 西三河建設事務所 河川港湾整備課 /株岡崎工業 1月末 工事進捗率 実績 48.1% 予定 58.9% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁修繕工事 (明代橋) | 明代橋右岸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 愛知県 西三河建設事務所 道路整備課 /株岡崎工業 1月末 工事進捗率 実績 54.5% 予定 60.8% |
| | 殿橋右岸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)アース・ベルのお知らせ 工事名:市道明大寺本町1号線ほか1路線 道路改良工事
 請負金額:12,496,000円 工期:令和元年10月7日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:工事延長 L=26 m 舗装工 A=172 m² 側溝工 L=22 m
 2月は地覆工及び車道舗装、区画線の施工を行い、完成する予定です。
 工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

太田建設(株)からののお知らせ 工事名:吹矢橋 橋りょう修繕工事(その2)
 請負金額:97,900,000円 工期:令和元年7月25日~令和2年3月27日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:塗装塗替工A=1588m²、足場工A=755m²
 2月は足場と作業ステージの解体作業を行います。その他、歩道の防水シーリング工事を合わせて行います。
 工事に伴い、左岸堤防道路通行止め又は幅員減少(昼間)、左岸河川敷遊歩道通行止め(終日)、
 右岸河川敷遊歩道通行止め(昼間)、吹矢橋歩道(西側又は東側)の通行止めを行います。
 また、祝日も特定建設作業にあたらぬ作業を行います。
 工事中は皆さまにご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

フジ建設(株)からののお知らせ 工事名:道路整備工事
 請負金額:62,040,000円 工期:令和元年8月27日~令和2年2月28日
 作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
 工事概要:工事延長 L=118m 側溝工L=177m 舗装工A=1471m²
 2月は道路の側溝工事の作業を行う予定をしています。車道について、車線減少の規制での作業を行います。
 誘導員を配置し一般車両、歩行者に十分注意し安全第一で作業を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業のお知らせ 工事名:河川環境整備工事(交付金)河川環境対策工事併工事
 請負金額:28,380,000円 工期:令和元年10月9日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:坂路工1式、階段工1式
 2月は、殿橋下流左岸側の5号坂路を施工していきます。
 現在左岸側の明代橋上流から殿橋下流までの河川敷は通行止めとなっております。
 沿線住民の方や河川敷利用の皆様には、ご迷惑をお掛けしていますが、ご理解とご協力をお願いします。

(株)岡崎工業のお知らせ 工事名:橋梁修繕工事(一般県道 東大見岡崎線(明代橋))
 請負金額:15,235,000円 工期:令和元年10月29日~令和2年3月19日
 作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
 工事概要:工事延長(右岸)L=16.4m(左岸)L=16.1m 平ブロック張工(右岸)A=144m²(左岸)A=142m²
 コンクリート張工(右岸)A=76m²(左岸)A=50m² 基礎工(右岸)L=16m(左岸)L=16m
 2月は、明代橋右岸側の平板ブロック、殿橋右岸側の張コンクリートを施工していきます。
 現在左岸側の明代橋上流から殿橋下流までの河川敷は通行止めとなっております。
 沿線住民の方や河川敷利用の皆様には、ご迷惑をお掛けしていますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

令和2年2月号 4/4

乙川リバーフロント関連工事工程表 (令和2年2月)

今月の関連行事

おとがワンダーランド
・新鮮野菜の朝市 2月8、22日

岡崎市からのお知らせ


3月22日桜城橋完成・徳川四天王像披露式典を開催
2020年1月の気温は平年を2~3 上回りました。この影響か今年の桜の開花は平年より数日早い3月20~24日と予想されています。暖かい日が続くとさらに早まるか開花時期が気になりますね。
さて、平成27年度より進めてきました桜城橋の完成式典を3月22日に開催(一般開放は昼12時頃を予定)します。あわせて、中央緑道(国道1号南)にて徳川四天王像のうち、本多忠勝と酒井忠次の石像2体を披露します。5年に渡り河川緑地等の利用者の方には大変なご迷惑をおかけしました。開放後もまもなく名前の由来ともなっている桜が見ごろを迎えそうです。桜城橋から桜と川を眺めながらゆっくりと過ごしてみたいかがでしょうか。

乙川リバーフロント地区写真

乙川プロムナード整備工事の状況



吹矢橋 橋りょう修繕工事(その2)
塗装塗替工、足場工

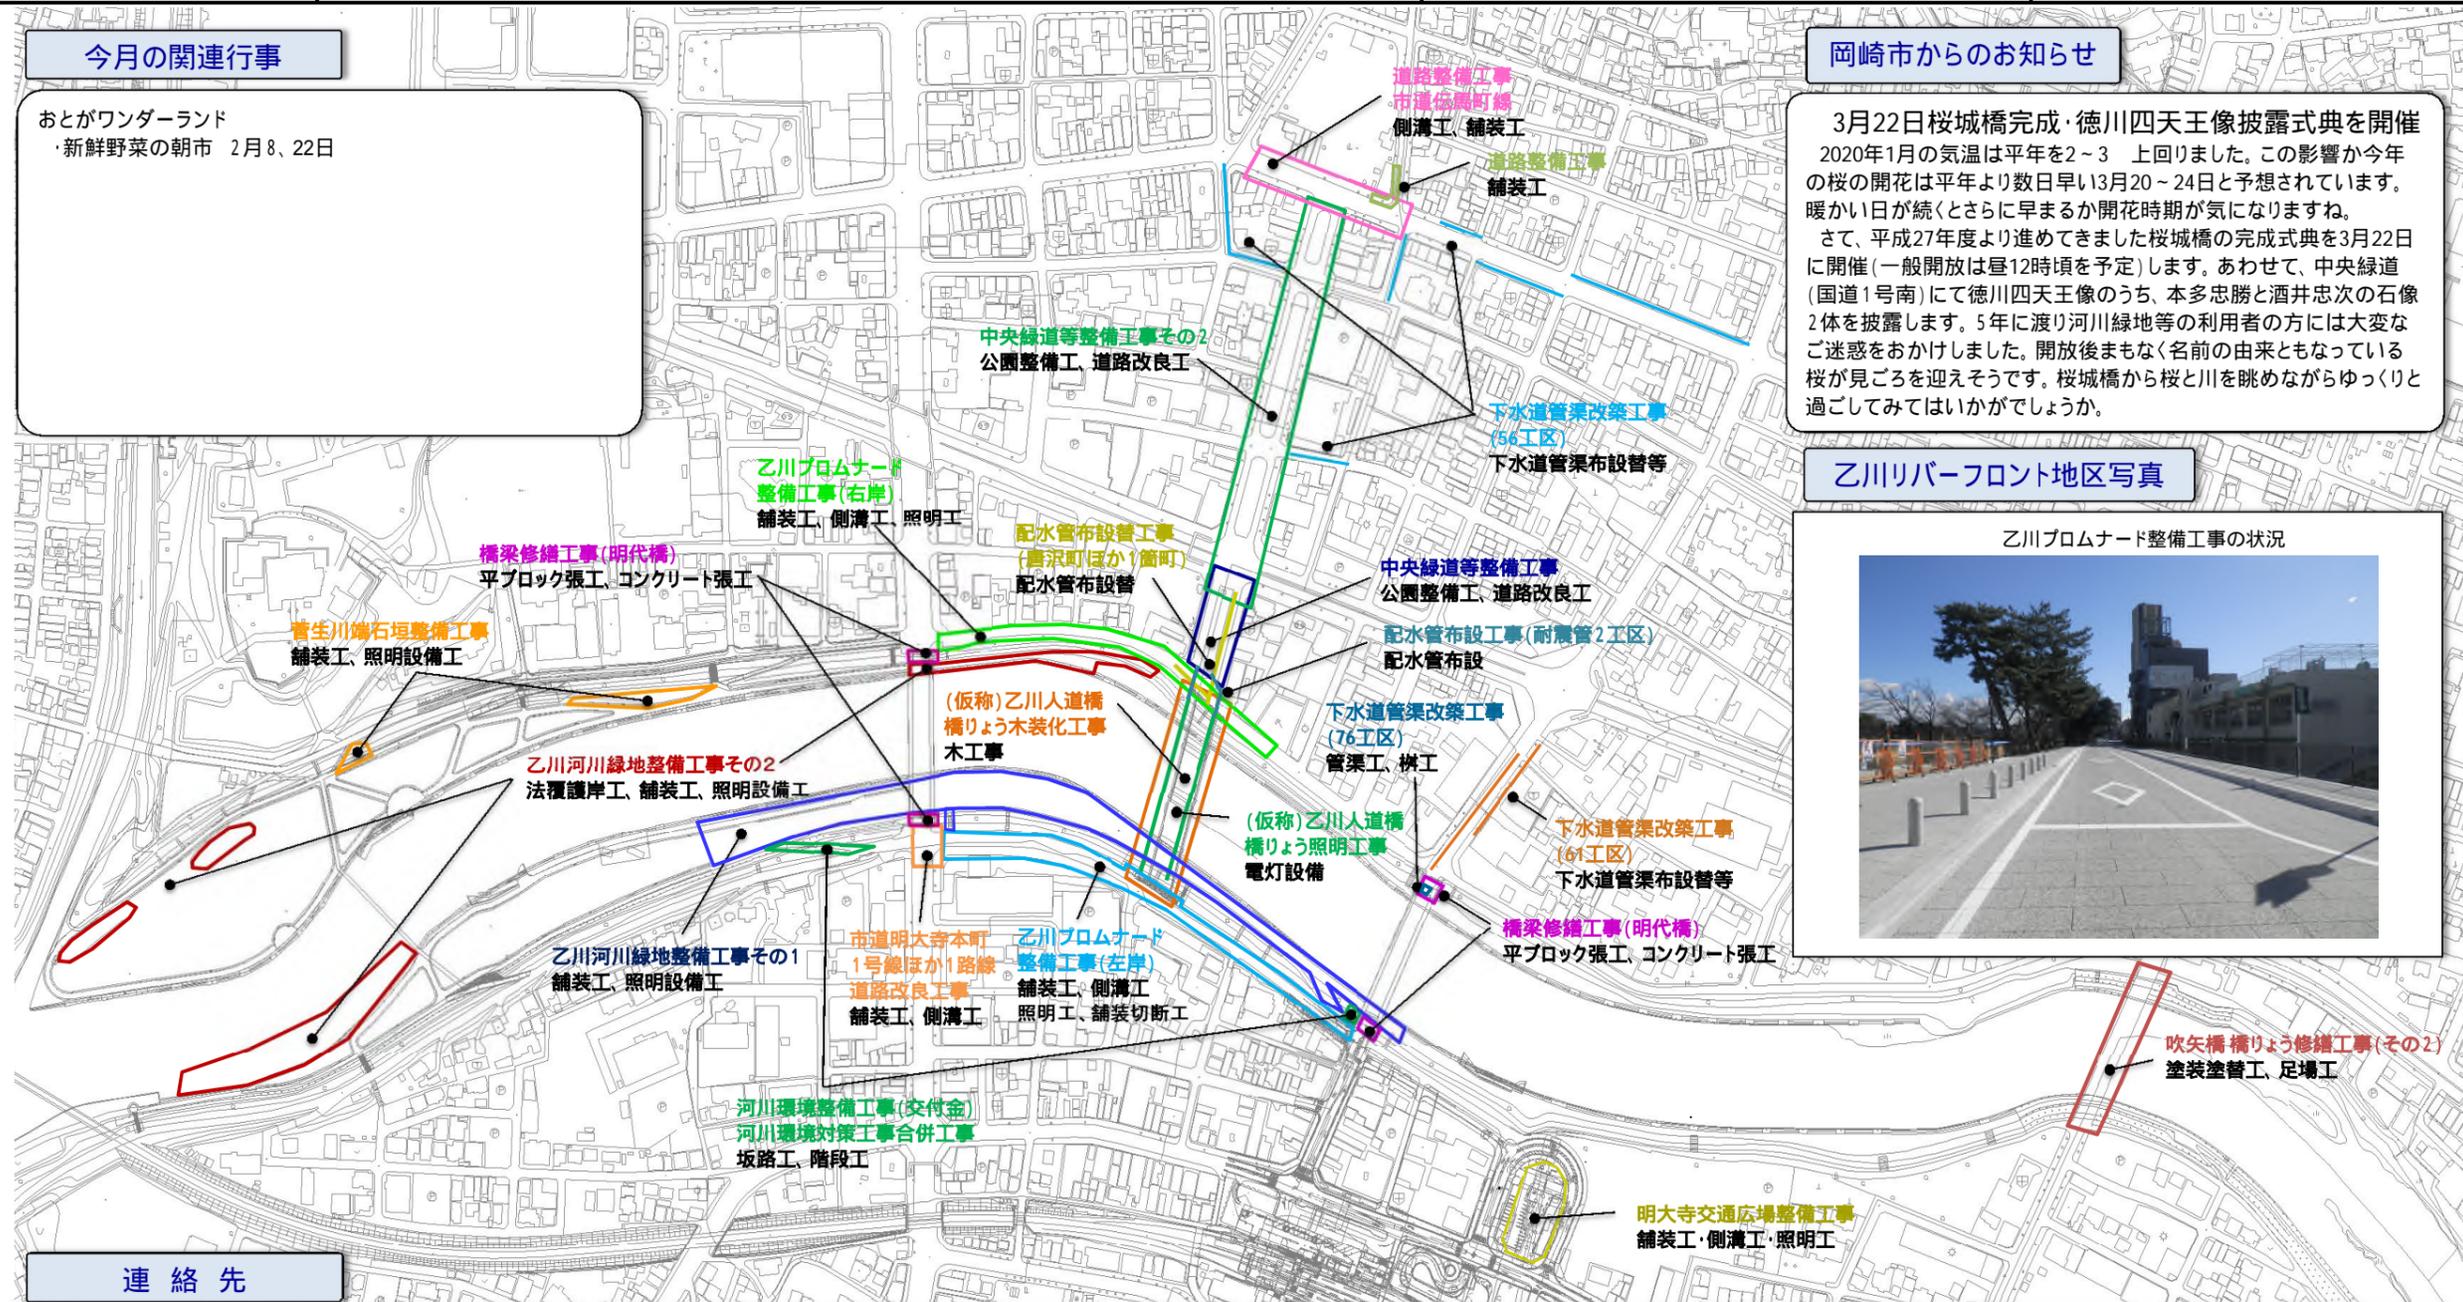

連絡先

岡崎市担当:
・乙川リバーフロント推進課
【人道橋、河川緑地、プロムナード、道路整備、中央緑道等】
技術係 山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
・水道工事課【配水管布設替】
北部方面係 加藤 TEL:0564-23-6482
・下水道設課【下水道管渠】
管渠対策係 古川、中西 TEL:0564-23-6730
管理係 永田 TEL:0564-23-6295
・拠点整備課【交通広場】
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
・道路建設課
【プロムナード】
街路係 櫻井 TEL:0564-23-6251
【吹矢橋】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230
【道路改良】
工事係 和出 TEL:0564-23-6231
・道路維持課【道路整備】
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233

愛知県担当:
・河川港湾整備課
【河川環境整備】
事業第一G 西川、中田 TEL:0564-27-2751
・道路整備課
【橋梁修繕工事】
事業第二G 徳田、石川 TEL:0564-27-2756

施工者:
【人道橋】
・木装化工事 小原木材(株) 大山 TEL:0564-51-4556
・照明工事 第一電力建設(株) 木村 TEL:0564-21-3078
【中央緑道等】
・その1 小原建設(株) 森野 TEL:0564-51-2623
・その2 小原・朝日JV 太田 TEL:0564-51-2623
【河川緑地】
・その1 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814
・その2 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161
・菅生川端石垣 (株)白濱建設 柴田 TEL:0564-24-1161

【配水管布設替】
・唐沢町ほか1 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
・耐震管2工区 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
【下水道管渠】
・56工区 (株)東洋工務店 森田 TEL:0564-31-6301
・61工区 (株)東洋工務店 早川 TEL:0564-31-6301
・76工区 丸三建設(株) 榎木 TEL:0564-73-5311
【道路改良】
・明大寺本町1号 (株)アースベル 谷川 TEL:0564-33-2606
【交通広場】
・(株)加藤組 山田 TEL:0564-45-2013
【プロムナード】
・左岸 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050
・右岸 (株)山口土木 島崎 TEL:0564-65-6570
【吹矢橋】
・その2 太田建設(株) 榎山 TEL:0564-22-1658

【道路整備】
・フジ建設(株) 柴田 TEL:0564-31-1261
【河川環境整備】
・(株)岡崎工業 大嶋 TEL:0564-48-2814
【橋梁修繕工事】
・(株)岡崎工業 川合 TEL:0564-48-2814
