

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成29年11月号 1/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年11月）																																			
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		工事担当部署/施工者	
		曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事その2	仮設工 仮設道路																																乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV 10月末 工事進捗率 実績 2.1 % 予定 2.1 %		
	汚濁防止設備工																																		
	仮栈橋																																		
	A1盛土・鋼矢板																																		
	構造物取壊工																																		
乙川河川緑地整備工事その1	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /松尾建設(株) 10月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /(株)加藤組 10月末 工事進捗率 実績 0.3 % 予定 0.3 %		
仮設駐輪場整備工事	構造物撤去工																																拠点整備課 /朝日工業(株) 10月末 工事進捗率 実績 47.3 % 予定 39.4 %		
	フェンス工																																		
	舗装工																																		
	施設設備工																																		
乙川河川緑地（吹矢橋公園）整備工事	園路広場整備工																																乙川リバーフロント推進課 /岩附造園(株) 10月末 工事進捗率 実績 81.2 % 予定 90.1 %		
	植栽工																																		
乙川河川緑地（吹矢橋公園）トイレ新築工事																																	乙川リバーフロント推進課 /杉林建設(株)		
河川環境整備工事（交付金）・河川環境対策工事合併工事	準備工・仮設工																																愛知県西三河建設事務所 河川港湾整備課 /(株)山口土木 10月末 工事進捗率 実績 2.0 % 予定 2.0 %		
	撤去工																																		
	土工																																		
	擁壁工																																		
吹矢橋 橋りょう耐震補強工事	準備工																																道路建設課 /朝日工業(株) 10月末 工事進捗率 実績 3.0 % 予定 3.0 %		
	工事用道路工																																		
	仮設工																																		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名：（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事その2
■請負金額：343,440,000円 ■工期：平成29年10月3日～平成30年7月31日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
◎11月は河川内の工事着手が可能となり、仮設工の仮設道路、汚濁防止設備工、仮栈橋工、A1橋台仮設盛土、鋼矢板打込を順次、施工を行います。
23日は祝日ですが、軽微な作業（著しい騒音又は振動を発生させない作業）を予定しています。
工事中は、近隣にお住いの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便や迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その1
■請負金額：55,404,000円 ■工期：平成29年10月20日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：アスファルト舗装工700㎡、照明設備工N=187基、坂路工1箇所、階段工1箇所
◎11月は準備工を行います。現場測量や保安設備の設置等を行います。
工事が始まると、園路の通行を規制する箇所がございます。
来園者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名：市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
■請負金額：98,539,200円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：管路工 L=448m、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工1式
◎11月は準備工を行います。プレキャストボックスの工場製作を始めます。
また、現場では測量を行う予定です。近接工事が多くあるため、業者間調整を密にし、工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：仮設駐輪場整備工事
■請負金額：19,872,000円 ■工期：平成29年9月8日～平成30年3月30日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。）
■工事概要：舗装工 A=487㎡ 施設設備工1式
◎11月は、フェンス工・施設設備工等を行います。
11月3日（祝日）は重機を使用しない作業をさせていただきます。
11月13日より仮設駐輪場（明代橋公園・太陽の城跡地南駐車場）が供用開始となります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

岩附造園(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地（吹矢橋公園）整備工事
■請負金額：96,876,000 円 ■工期：平成29年3月6日～平成29年12月26日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をすることがあります）
■工事概要：公園舗装工A=661m2、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式
◎吹矢橋公園整備工事は残すところ、舗装工と植栽工のみとなりました。
11月は舗装を中心に工事を進めてまいります。舗装工では、振動・騒音でご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、十分注意して作業を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地（吹矢橋公園）トイレ新築工事【工事完了】
◎ユニットトイレの設置が完了しました。女性やお子様も安心して利用できる、清潔感溢れる綺麗なトイレとなりました。
吹矢橋公園の供用開始までトイレの利用はできませんが、吹矢橋公園の利用と共に楽しみにしていただけると幸いです。工事中は皆様にご迷惑・ご不便をお掛けしましたが、皆様のご理解ご協力のおかげで、無事に工事を完了することができました。ありがとうございました。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名：河川環境整備工事（交付金）・河川環境対策工事合併工事
■請負金額：30,121,200円 ■工期：平成29年9月26日～平成30年3月16日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。）
■工事概要：坂路工1ヶ所、階段工1ヶ所
◎11月は11号坂路工の準備工・仮設工から始まり、擁壁工の作業を行います。
11/3（祝日）には軽微な作業（著しい騒音又は振動を発生させない作業）を行う予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
■請負金額：111,240,000円 ■工期：平成29年9月15日～平成30年3月26日
■作業時間：原則8時～17時まで
■工事概要：下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
◎11月は工事用道路設置工事を行うため、堤防道路を大型車両が通行します。（交通誘導員が誘導します。）
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名：（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事その2
■請負金額：343,440,000円 ■工期：平成29年10月3日～平成30年7月31日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
◎11月は河川内の工事着手が可能となり、仮設工の仮設道路、汚濁防止設備工、仮栈橋工、A1橋台仮設盛土、鋼矢板打込を順次、施工を行います。
23日は祝日ですが、軽微な作業（著しい騒音又は振動を発生させない作業）を予定しています。
工事中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その1
■請負金額：55,404,000円 ■工期：平成29年10月20日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：アスファルト舗装工700㎡、照明設備工N=187基、坂路工1箇所、階段工1箇所
◎11月は準備工を行います。現場測量や保安設備の設置等を行います。
工事が始めると、園路の通行を規制する箇所がございます。
来園者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名：市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
■請負金額：98,539,200円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により時間延長をすることがあります。）
■工事概要：管路工 L=448m、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工1式
◎11月は準備工を行います。プレキャストボックスの工場製作を始めます。
また、現場では測量を行う予定です。近接工事が多くあるため、業者間調整を密にし、工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：仮設駐輪場整備工事
■請負金額：19,872,000円 ■工期：平成29年9月8日～平成30年3月30日
■作業時間：原則9時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。）
■工事概要：舗装工 A=487㎡ 施設設備工1式
◎11月は、フェンス工・施設設備工等を行います。
11月3日（祝日）は重機を使用しない作業をさせていただきます。
11月13日より仮設駐輪場（明代橋公園・太陽の城跡地南駐車場）が供用開始となります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

岩附造園(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地（吹矢橋公園）整備工事
■請負金額：96,876,000円 ■工期：平成29年3月6日～平成29年12月26日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をすることがあります）
■工事概要：公園舗装工A=661㎡、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式
◎吹矢橋公園整備工事は残すところ、舗装工と植栽工のみとなりました。
11月は舗装を中心に工事を進めてまいります。舗装工では、振動・騒音でご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、十分注意して作業を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地（吹矢橋公園）トイレ新築工事
【工事完了】
◎ユニットトイレの設置が完了しました。女性やお子様も安心して利用できる、清潔感溢れる綺麗なトイレとなりました。
吹矢橋公園の供用開始までトイレの利用はできませんが、吹矢橋公園の利用と共に楽しみにしていただけると幸いです。工事中は皆様にご迷惑・ご不便をお掛けしましたが、皆様のご理解ご協力のおかげで、無事に工事を完了することができました。ありがとうございました。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名：河川環境整備工事（交付金）・河川環境対策工事合併工事
■請負金額：30,121,200円 ■工期：平成29年9月26日～平成30年3月16日
■作業時間：原則8時～17時まで（作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。）
■工事概要：坂路工1ヶ所、階段工1ヶ所
◎11月は11号坂路工の準備工・仮設工から始まり、擁壁工の作業を行います。
11/3（祝日）には軽微な作業（著しい騒音又は振動を発生させない作業）を行う予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
■請負金額：111,240,000円 ■工期：平成29年9月15日～平成30年3月26日
■作業時間：原則8時～17時まで
■工事概要：下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
◎11月は工事用道路設置工事を行うため、堤防道路を大型車両が通行します。（交通誘導員が誘導します。）
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

工事ニュース

乙川リパーフフロント地区整備事業

乙川リパーフフロント関連工事工程表（平成29年11月）

この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年11月号 2/5

工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者
		曜日	日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
配水管撤去工事																																	水道工事課 /王神工事
配水管布設替工事 (明大寺本町ほか1箇町)	準備工																																水道工事課 /スズキ水道(株)
	配水管布設工																																
配水管布設替工事 (耐震管2工区)	試掘工																																水道工事課 /石田設備(株)
	配水管布設工(北側)																																
	配水管布設工(南側)																																
配水管布設替工事 (康生通南地内)	仮設給水管工																																水道工事課 /尾崎工業(株)
	配水管布設工																																
	撤去工																																
	仮設撤去工																																
配水管布設替工事 (明大寺町地内)	準備工																																水道工事課 /(有)今井水道設備
	配水管布設工																																
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	仮設工																																拠点整備課 /朝日・大伸JV
	P1橋脚工																																
	P2橋脚工																																
	P3橋脚工																																
道路占用事業者 による工事	西日本電信電話(株)																																拠点整備課 /西日本電信電話(株) 中部電力(株)
	中部電力(株)																																
配水管布設替工事 (島町ほか3箇町)	準備工																																水道工事課 /石田設備(株)
	配水管布設工																																
岡崎警察署明大寺 交番曳家工事	土工																																建築課 /小原建設(株)
	設備工																																
	外構工																																
	雑工																																

王神工事からのお知らせ

■工事名:配水管撤去工事

■請負金額: 1,252,800円

■工期:平成29年7月11日～平成29年11月10日

■作業時間:原則9時～17時まで

■工事概要:配水管撤去 L=68m

◎工事期間中は通行規制など、皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。

ご協力ありがとうございました。

スズキ水道(株)からのお知らせ

■工事名:配水管布設替工事

■請負金額: 3,510,000円

■工期:平成29年9月15日～平成30年2月28日

■作業時間:原則9時～17時まで

■工事概要:配水管布設 L=48m

◎11月より配水管の布設を行います。工事中は交通規制があり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますのでご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ

■工事名:配水管布設替工事(耐震管2工区)

■請負金額: 96,357,600円

■工期:平成29年7月21日～平成30年2月28日

■作業時間:原則9時～17時まで

■工事概要:配水管(耐震管)布設 L=599m

◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えします。11月は仮設管及び配水管布設工を行います。

配水管布設後は道路が一部仮舗装となりますが、通行には支障がないよう安全に施工いたします。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

尾崎工業(株)からのお知らせ

■工事名:配水管布設替工事

■請負金額: 25,056,000円

■工期:平成29年6月16日～平成29年11月30日

■作業時間:原則9時～17時まで

■工事概要:配水管布設 L=254m

◎11月は配水管の布設を行った後、道路の舗装復旧を行います。

工事終了まで残り少となりましたが、引き続き安全には十分配慮して工事を進めてまいります。

皆様のご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ

■工事名:配水管布設替工事

■請負金額: 4,536,000円

■工期:平成29年9月15日～平成30年1月31日

■作業時間:原則9時～17時まで

■工事概要:配水管布設 L=111m

◎11月から配水管の布設替えを行います。

工事施工中は道路が一部仮舗装となり、通行される皆さまや近隣住民の方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・大伸JVからのお知らせ

■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)

■請負金額: 565,920,000円

■工期:平成29年6月27日～平成31年3月1日

■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)

■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡

◎11月は、橋脚工(P1:基礎杭打設、仮締切矢板打設、P3:床堀～コンクリート打設～埋戻)等を行います。

11月23日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。

細心の注意を払って工事を進めてまいります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について

■工事概要:道路占用物の設置、撤去など

◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事をを行います。

中部電力(株)の工事は、夜間作業を伴います。

詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ

■工事名:配水管布設替工事

■請負金額: 24,732,000円

■工期:平成29年10月19日～平成30年3月23日

■作業時間:原則9時～17時まで

■工事概要:配水管布設 L=173m

◎本工事は配水管の布設替えを行います。

11月は準備工として試掘及び既設水道管の位置出しを行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ

■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事

■請負金額: 29,688,120円

■工期:平成29年3月27日～平成29年12月15日

■作業時間:原則8時～17時まで

■工事概要:交番曳家一式

◎10月で交番の移動作業が終了致しました。11月は移動した交番に対する設備工事、外構工事を

行います。工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様に

大変ご不便やご迷惑をお掛けしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成29年11月号 3/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年11月）																																			
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者		
		曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
乙川プロムナード整備工事(右岸)その1	準備工																																道路維持課 /(株)ハラダ建工		
																																	10月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
乙川プロムナード整備工事(左岸)その1	準備工																																道路建設課 /大金建設(株)		
	構造物撤去工																																10月末 工事進捗率 実績 7.0 % 予定 7.0 %		
	土工																																土工		
	仮設工																																仮設フェンス設置工		
乙川プロムナード整備工事(左岸)その2	準備工																																道路建設課 /(株)岡崎工業		
																																	10月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
道路占用事業者による工事	東邦ガス㈱																																乙川リバーフロント推進課 /東邦ガス㈱岡崎導管課		
工事完了																																			
下水道管渠改築工事(唐沢町ほか1箇町)	準備工																																下水道施設課 /浦上建設(株)		
																																	10月末 工事進捗率 実績 2.0 % 予定 2.0 %		
下水道管渠改築工事(唐沢町ほか3箇町地内)	準備工																																下水道施設課 /浦上建設(株)		
																																	10月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
乙川河川緑地整備工事その2	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株)		
	敷地造成工																																10月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
	仮設工																																保安設備 堆積土撤去 工事用道路工		
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2	準備工																																道路維持課 /朝日工業(株)		
																																	10月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事	準備工																																拠点整備課 /浅井土木建設(株)		
																																	10月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
■請負金額: 17,874,000円 ■工期: 平成29年10月20日～平成30年3月16日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。
11月は準備工を行い、現地測量を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
■請負金額: 27,885,600円 ■工期: 平成29年9月20日～平成30年3月5日
■作業時間: 原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工 A=214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 1式
◎11月は準備工(測量等)、構造物撤去工、土工、仮設工を行います。
工事中は幅員減少にて道路規制し、工事を進めさせていただきます。
皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その2
■請負金額: 56,592,000円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月14日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 舗装工 A=1548m2、側溝工 L=105m、縁石工 L=373m
◎本工事は河川側へ歩道を新設し、舗装を全面きれいにします。
11月は準備工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

道路占用事業者による工事について
【工事完了】
◎工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。
ご理解ご協力ありがとうございました。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
■請負金額: 27,108,000円 ■工期: 平成29年9月26日～平成30年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 管推進工 L=22.5m
◎本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法(地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法)にて
取り替えます。
11月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
■請負金額: 46,440,000円 ■工期: 平成29年10月24日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 管渠工 L=308.7m
◎下水道管渠改築工事(唐沢町ほか1箇町)と合わせて、本工事を担当することとなりました。
11月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地整備工事その2
■請負金額: 119,556,000円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: アスファルト舗装工 A=623㎡、坂路工 N=1箇所、階段工 N=6箇所
◎この工事は園路、坂路、階段などをつくり河川緑地をきれいにします。11月は工事の準備をすすめて
下旬頃から本格的に着手する予定です。工事中は十分安全に注意し作業をすすめて参りますが
皆様方におかれましても、ご注意くださいますようご協力お願い申し上げます。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
■請負金額: 62,748,000円 ■工期: 平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
11月は準備工を行い、現地測量を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名: 市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事
■請負金額: 37,929,600円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工 A=1415m2、側溝工 L=171m、縁石工 L=338m
◎本工事は市道明大寺川端4号線と市道明大寺3号線の道路改良工事を行います。
11月は準備工(測量等)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
■請負金額: 17,874,000円 ■工期: 平成29年10月20日～平成30年3月16日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。
11月は準備工を行い、現地測量を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
■請負金額: 27,885,600円 ■工期: 平成29年9月20日～平成30年3月5日
■作業時間: 原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 舗装工 A=214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 1式
◎11月は準備工(測量等)、構造物撤去工、土工、仮設工を行います。
工事中は幅員減少にて道路規制し、工事を進めさせていただきます。
皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その2
■請負金額: 56,592,000円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月14日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 舗装工 A=1548m2、側溝工 L=105m、縁石工 L=373m
◎本工事は河川側へ歩道を新設し、舗装を全面きれいにします。
11月は準備工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

道路占用事業者による工事について
【工事完了】
◎工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。
ご理解ご協力ありがとうございました。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
■請負金額: 27,108,000円 ■工期: 平成29年9月26日～平成30年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 管推進工 L=22.5m
◎本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法(地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法)にて取り替えます。
11月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
■請負金額: 46,440,000円 ■工期: 平成29年10月24日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 管渠工 L=308.7m
◎下水道管渠改築工事(唐沢町ほか1箇町)と合わせて、本工事を担当することとなりました。
11月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地整備工事その2
■請負金額: 119,556,000円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: アスファルト舗装工 A=623㎡、坂路工 N=1箇所、階段工 N=6箇所
◎この工事は園路、坂路、階段などをつくり河川緑地をきれいにします。11月は工事の準備をすすめて下旬頃から本格的に着手する予定です。工事中は十分安全に注意し作業をすすめて参りますが皆様方におかれましても、ご注意くださいまようご協力お願い申し上げます。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
■請負金額: 62,748,000円 ■工期: 平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
11月は準備工を行い、現地測量を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名: 市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事
■請負金額: 37,929,600円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 舗装工 A=1415m2、側溝工 L=171m、縁石工 L=338m
◎本工事は市道明大寺川端4号線と市道上明大寺3号線の道路改良工事を行います。
11月は準備工(測量等)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

[illegible]


工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年11月）

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年11月号 5/5

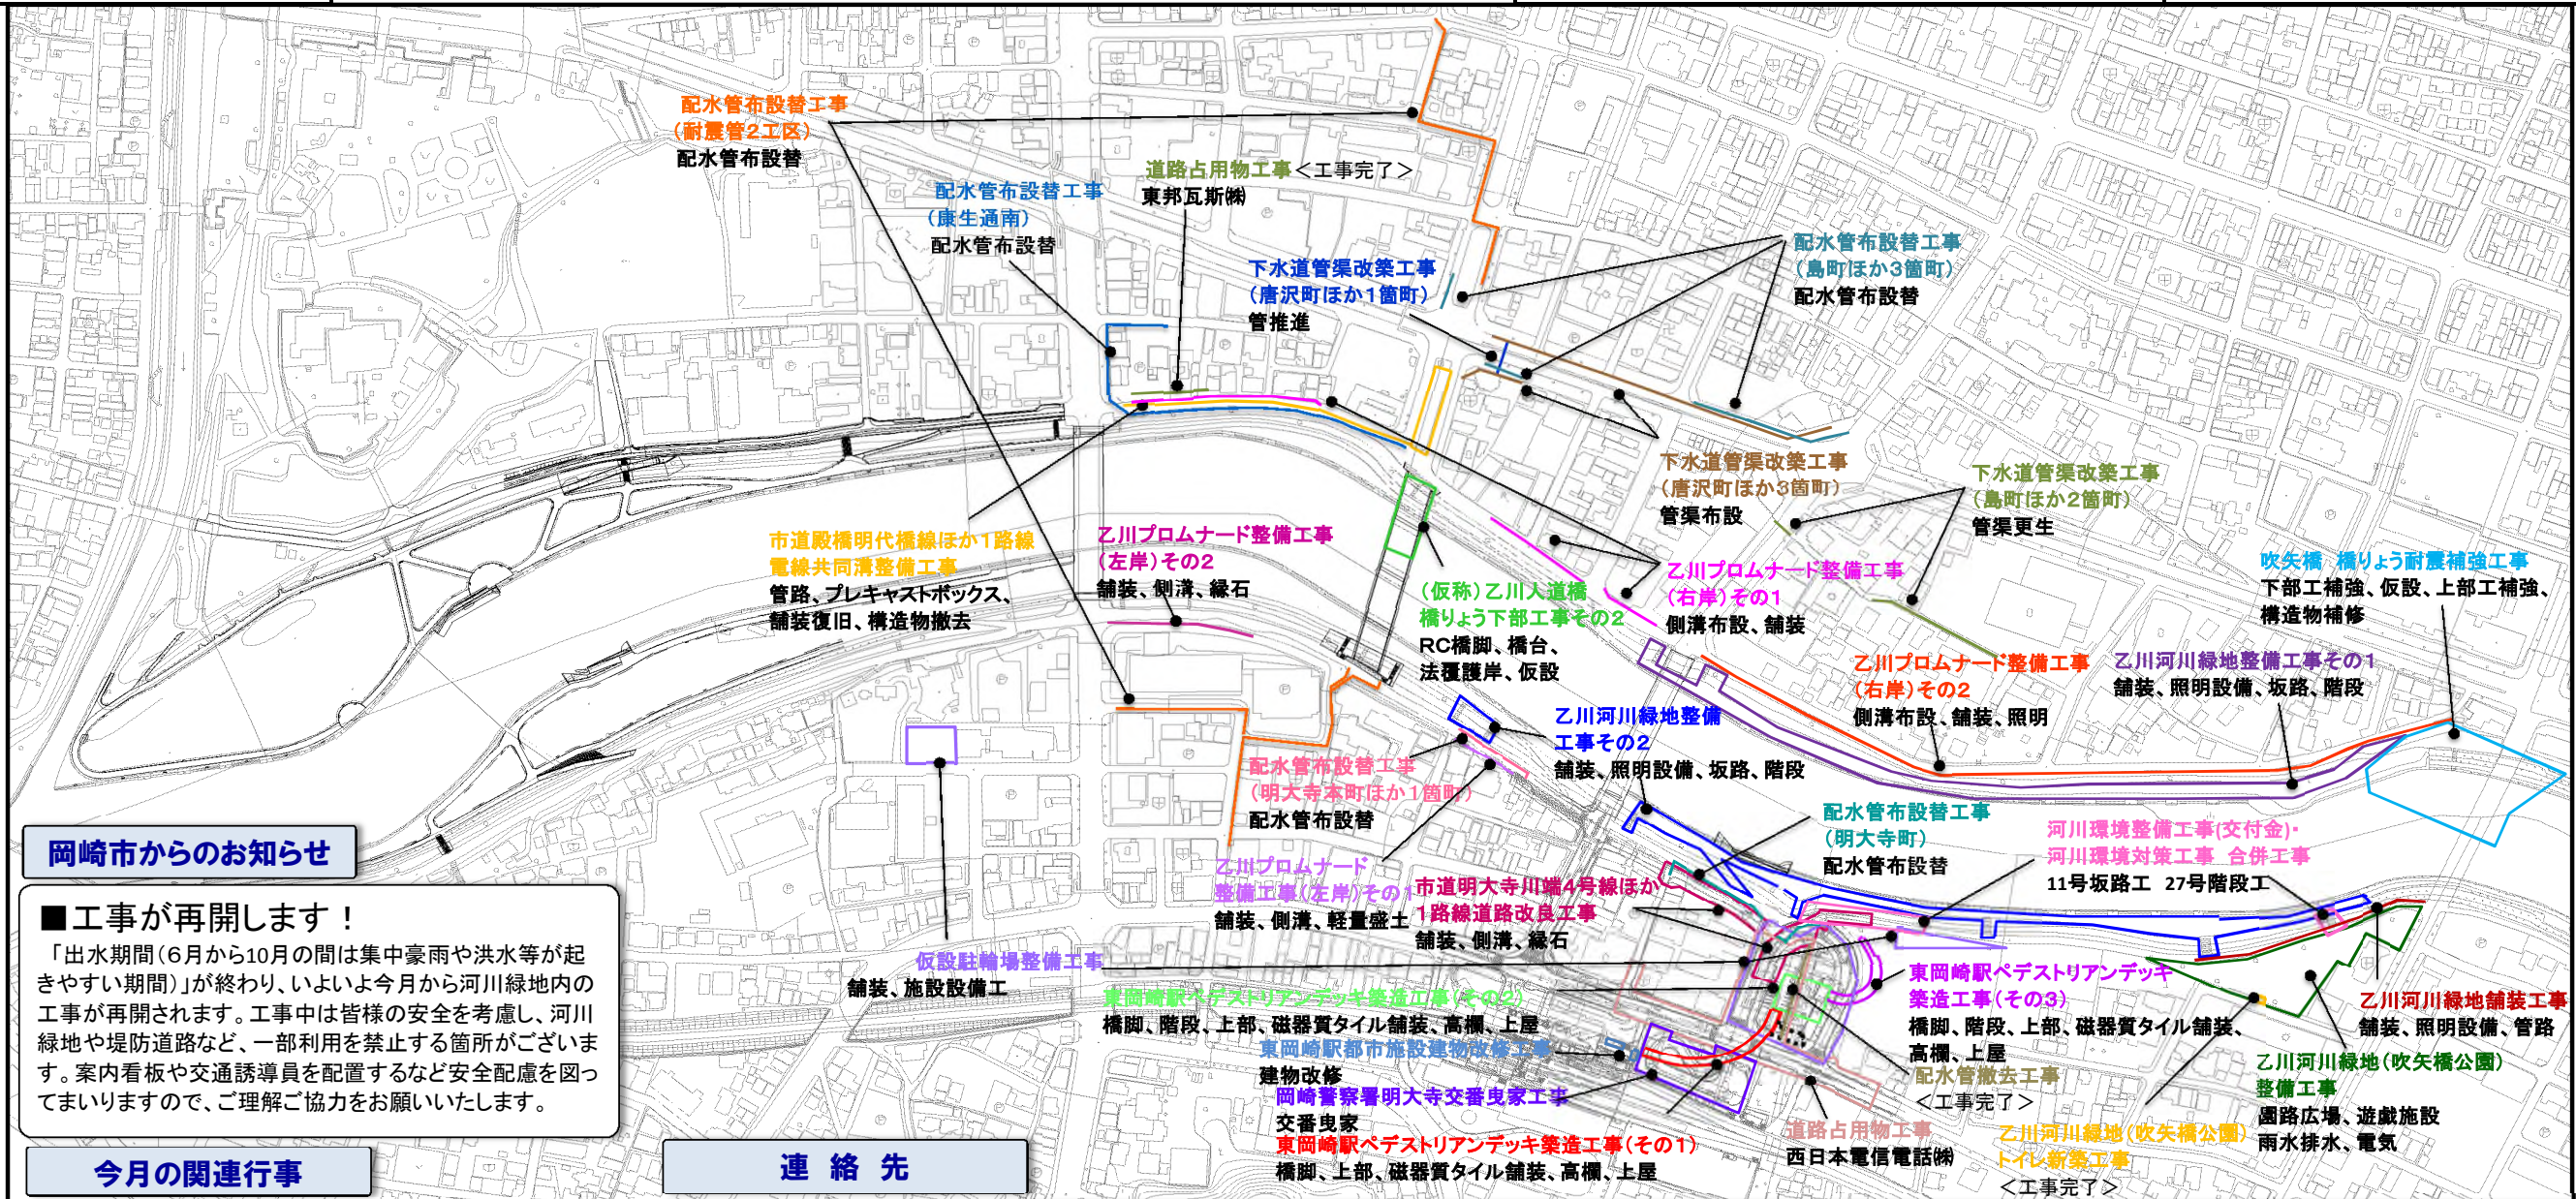

岡崎市からのお知らせ

■工事が再開します！

「出水期間（6月から10月の間は集中豪雨や洪水等が起きやすい期間）」が終わり、いよいよ今月から河川緑地内の工事が再開されます。工事中は皆様の安全を考慮し、河川緑地や堤防道路など、一部利用を禁止する箇所がございます。案内看板や交通誘導員を配置するなど安全配慮を図ってまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

今月の関連行事

岡崎城下家康公秋まつり 11月4、5日
岡崎市消防団連合観閲式 11月19日
岡崎泰平の祈り 11月25日
おとがワ！ンダーランド 7月22日～

乙川リバーフロント地区写真

社会実験の様子
（籠田公園）



連絡先

■岡崎市担当：

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【吹矢橋公園、人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】
中田、山本、山崎、大野 TEL：0564-23-6982
- ・水道工事課 北部方面係【配水管布設替（耐震管2工区、康生通南、島町ほか3箇町）】
前森 TEL：0564-23-6482
- ・水道工事課 南部方面係【配水管撤去、配水管布設替（明大寺本町ほか、明大寺町）】
永井 TEL：0564-23-6367
- ・拠点整備課 技術係【ペDESTリアンデッキ、仮設駐輪場、明大寺川端4号線】
吉居、井上、大高 TEL：0564-23-6607

■施工者：

- 【吹矢橋公園】
 - ・岩附造園（株） 三浦 TEL：0564-31-0171
 - ・杉林建設（株） 辻 TEL：0564-22-5215 <工事完了>
- 【人道橋】
 - ・朝日・小原JV 小林 TEL：0564-51-3657
- 【電線共同溝】
 - ・（株）加藤組 西尾 TEL：0564-45-2013
- 【仮設駐輪場】
 - ・朝日工業（株） 深谷 TEL：0564-51-3655
- 【明大寺川端4号線】
 - ・浅井土木建設（株） 浅井 TEL：0564-51-0308
- 【交番】
 - ・小原建設（株） 岡田 TEL：0564-51-2623
- 【東岡崎駅建物改修】
 - ・小原建設（株） 日迫 TEL：0564-51-2622
- 【吹矢橋 橋りょう耐震】
 - ・朝日工業（株） 竹内 TEL：0564-51-3657

【乙川河川緑地】

- ・その1 松尾建設（株） 市川 TEL：0564-21-0305
- ・その2 成瀬建設（株） 深田 TEL：0564-46-2050
- ・舗装 朝日工業（株） 武田 TEL：0564-51-3655
- 【プロムナード（左岸）】
 - ・その1 大金建設（株） 田中 TEL：0564-22-6855
 - ・その2 （株）岡崎工業 堀 TEL：0564-48-2814
- 【プロムナード（右岸）】
 - ・その1 ハラダ建工（株） 浦野 TEL：0564-25-7970
 - ・その2 朝日工業（株） 戸城 TEL：0564-51-3655
- 【配水管布設替】
 - ・耐震管2工区 石田設備（株） 米田 TEL：0564-24-0139
 - ・康生通南 尾崎工業（株） 尾崎 TEL：0564-22-7411
 - ・明大寺本町ほか スズキ水道（株） 鈴木 TEL：0564-22-1868
 - ・明大寺町 （有）今井水道設備 今井 TEL：0564-21-4820
 - ・島町ほか 石田設備（株） 仲川 TEL：0564-24-0139
- 【ペDESTリアンデッキ】
 - ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL：0564-51-3655

- ・道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】
市川、浅井 TEL：0564-23-6230
- ・道路建設課 工事係【プロムナード（左岸）】
大澤、宮地 TEL：0564-23-6743
- ・下水道施設課 管渠対策係【下水道管渠】
都筑 TEL：0564-23-6730
- ・道路維持課 北西部係【プロムナード（右岸）】
津田、平岩 TEL：0564-23-6225

- ・建築課 計画係 【交番、東岡崎駅建物改修】
中村、鈴木 TEL：0564-23-6465

■愛知県担当：

- ・西三河建設事務所河川港湾整備課【11号坂路、27号階段】
太田、富田 TEL：0564-27-2752

【下水道管渠】

- ・唐沢町ほか1 浦上建設（株） 牧野 TEL：0564-51-1460
- ・唐沢町ほか3 “ “ “
- ・島町ほか2 朝日工業（株） 武田 TEL：0564-51-3655

【配水管撤去】

- ・王神工事 石川 TEL：0564-23-3210 <工事完了>

【11号坂路、27号階段】

- ・（株）山口土木 水野 TEL：0564-65-6570

【道路占用物（西日本電信電話）担当 鬼頭 TEL：052-746-6814】

- ・NDS（株） 鈴木 TEL：0564-55-2010（ケーブル）
- ・NDS（株） 野村 TEL：0564-55-2020（管路）

【道路占用物工事（中部電力）担当 鈴木（電柱新設・ケーブル） TEL：0564-55-5071
原（管路・入線） TEL：0564-55-5070】

- ・トーエネック（株） 天野 TEL：0564-51-0800（電柱新設）
- ・トーエネック（株） 小野、林 TEL：0564-23-3220（管路・入線）
- ・トーエネック（株） 深見 TEL：0564-51-0800（ケーブル）

【道路占用物（東邦瓦斯）担当 井本 TEL：0564-21-0823】

- ・水金工事（株） 米持 TEL：0564-21-5103 <工事完了>
