

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																																この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成29年12月号 1/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年12月）																																					
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者			
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事 その2	仮栈橋																																冬季 休 暇	乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV 11月末 工事進捗率 実績 14.0 % 予定 13.0 %			
	A1場所打ち杭工																																				
	P1場所打ち杭工																																				
乙川河川緑地整備 工事その1	準備工 測量・剪定																																	冬季 休 暇	乙川リバーフロント推進課/ 松尾建設(株) 11月末 工事進捗率 実績 0.5 % 予定 0.5 %		
	準備工 保安設備																																				
	敷地造成工 掘削																																				
	残土処理工																																				
市道殿橋明代橋線ほ か1路線電線共同溝 整備工事	準備工																																	冬季 休 暇	乙川リバーフロント推進課 /(株)加藤組 11月末 工事進捗率 実績 7.4 % 予定 7.4 %		
	構造物取壊工																																				
仮設駐輪場整備工事	準備工																																	冬季 休 暇	拠点整備課 /朝日工業(株) 11月末 工事進捗率 実績 75.0 % 予定 70.2 %		
乙川河川緑地(吹矢 橋公園)整備工事	園路広場整備工																																	乙川リバーフロント推進課 /岩附造園(株) 11月末 工事進捗率 実績 92.5 % 予定 99.0 %			
	植栽工																																				
	片付け																																				
	清掃・片付け																																				
乙川河川緑地 舗装工事	準備工・仮設工																																	冬季 休 暇	乙川リバーフロント推進課 /朝日工業(株) 11月末 工事進捗率 実績 0.5 % 予定 0.5 %		
河川環境整備工事 (交付金)・河川環境 対策工事合併工事	擁壁工																																	冬季 休 暇	愛知県西三河建設事務所 河川港湾整備課 /(株)山口土木 11月末 工事進捗率 実績 8.0 % 予定 10.5 %		
	階段工																																				
吹矢橋 橋りょう 耐震補強工事	工事用道路工																																	冬季 休 暇	道路建設課 /朝日工業(株) 11月末 工事進捗率 実績 12.0 % 予定 15.0 %		
	護岸工																																				
	仮設工																																				

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2
■請負金額: 343,440,000円 ■工期: 平成29年10月3日～平成30年7月31日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
◎12月は仮栈橋工の施工完了後、P1橋脚場所打ち杭の施工を行います。並行してA1橋台場所打ち杭工の施工を行います。23日は祝日ですが、軽微な作業(著しい騒音又は振動を発生させない作業)を予定しています。12/29～1/3は年末年始休暇の予定です。
工事中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地整備工事その1
■請負金額: 55,404,000円 ■工期: 平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: アスファルト舗装工700㎡、照明設備工N=187基、坂路工1箇所、階段工1箇所
◎12月は準備工(測量、剪定、保安設備設置)後、掘削・残土処理工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名: 市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
■請負金額: 98,539,200円 ■工期: 平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 管路工 L=448m、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工1式
◎12月初旬は測量等の準備工を行い、中旬より試掘、中央緑道内の樹木伐採、石積み撤去を行う予定です。
近接工事が多いため、業者間調整を密にし、工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 仮設駐輪場整備工事
■請負金額: 19,872,000円 ■工期: 平成29年9月8日～平成30年3月30日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工 A=487㎡ 施設設備工1式
◎12月は、準備工(仮設駐輪場撤去に伴う照明・カメラ等の撤去準備)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

岩附造園(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事
■請負金額: 96,876,000 円 ■工期: 平成29年3月6日～平成29年12月26日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
■工事概要: 公園舗装工A=661㎡、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式
◎吹矢橋公園整備工事もいよいよ最終仕上げ作業に入ります。
デザインカッター、植栽、土舗装仕上げ、車道舗装を行います。
工事完了まで安全第一で作業を進めてまいりますので、ご迷惑をおかけしますが引き続き皆様のご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地舗装工事
■請負金額: 22,032,000 円 ■工期: 平成29年11月27日～平成30年3月26日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
■工事概要: 半たわみ舗装工A=541㎡、照明設備工1式、管路工1式
◎12月は準備工で看板設置と現地測量を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名: 河川環境整備工事(交付金)・河川環境対策工事合併工事
■請負金額: 30,121,200円 ■工期: 平成29年9月26日～平成30年3月16日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 坂路工1ヶ所、階段工1ヶ所
◎12月は11号坂路工と27号階段工(12/11頃～)を同時に施工する予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
■請負金額: 111,240,000円 ■工期: 平成29年9月15日～平成30年3月26日
■作業時間: 原則8時～17時まで
■工事概要: 下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
◎12月は工事用道路設置工事を行うため、堤防道路を大型車両が通行します。(交通誘導員が誘導します。)
12月25日より護岸撤去工事を行う予定です。(騒音が発生します。)
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名：(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2
■請負金額：343,440,000円 ■工期：平成29年10月3日～平成30年7月31日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要：RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
◎12月は仮栈橋工の施工完了後、P1橋脚場所打ち杭の施工を行います。並行してA1橋台場所打ち杭工の施工を行います。23日は祝日ですが、軽微な作業(著しい騒音又は振動を発生させない作業)を予定しています。12/29～1/3は年末年始休暇の予定です。
工事中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その1
■請負金額：55,404,000円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要：アスファルト舗装工700㎡、照明設備工N=187基、坂路工1箇所、階段工1箇所
◎12月は準備工(測量、剪定、保安設備設置)後、掘削・残土処理工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名：市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
■請負金額：98,539,200円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要：管路工 L=448m、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工1式
◎12月初旬は測量等の準備工を行い、中旬より試掘、中央緑道内の樹木伐採、石積み撤去を行う予定です。
近接工事が多くあるため、業者間調整を密にし、工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：仮設駐輪場整備工事
■請負金額：19,872,000円 ■工期：平成29年9月8日～平成30年3月30日
■作業時間：原則9時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要：舗装工 A=487㎡ 施設設備工1式
◎12月は、準備工(仮設駐輪場撤去に伴う照明・カメラ等の撤去準備)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

岩附造園(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事
■請負金額：96,876,000 円 ■工期：平成29年3月6日～平成29年12月26日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります)
■工事概要：公園舗装工A=661m2、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式
◎吹矢橋公園整備工事もいよいよ最終仕上げ作業に入ります。
デザインカッター、植栽、土舗装仕上げ、車道舗装を行います。
工事完了まで安全第一で作業を進めてまいりますので、ご迷惑をおかけしますが引き続き皆様のご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地舗装工事
■請負金額：22,032,000 円 ■工期：平成29年11月27日～平成30年3月26日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります)
■工事概要：半たわみ舗装工A=541m2、照明設備工1式、管路工1式
◎12月は準備工で看板設置と現地測量を行います。
工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名：河川環境整備工事(交付金)・河川環境対策工事合併工事
■請負金額：30,121,200円 ■工期：平成29年9月26日～平成30年3月16日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要：坂路工1ヶ所、階段工1ヶ所
◎12月は11号坂路工と27号階段工(12/11頃～)を同時に施工する予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
■請負金額：111,240,000円 ■工期：平成29年9月15日～平成30年3月26日
■作業時間：原則8時～17時まで
■工事概要：下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
◎12月は工事用道路設置工事を行うため、堤防道路を大型車両が通行します。(交通誘導員が誘導します。)
12月25日より護岸撤去工事を行う予定です。(騒音が発生します。)
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成29年12月号 2/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年12月）																																				
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者		
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
配水管布設替工事 （明大寺本町ほか1箇町）	配水管布設工																																水道工事課 /スズキ水道(株)	11月末 工事進捗率 実績 60.0 % 予定 37.0 %		
	配水管撤去工																																			
	雑工																																			
配水管布設替工事 （耐震管2工区）	試掘工																																水道工事課 /石田設備(株)	11月末 工事進捗率 実績 37.5 % 予定 46.1 %		
	配水管布設工(北側)																																			
	配水管布設工(南側)																																			
配水管布設替工事 （康生通地内）	舗装切断工																																水道工事課 /尾崎工業(株)	11月末 工事進捗率 実績 88.0 % 予定 88.0 %		
	舗装復旧工																																			
	平板復旧工																																			
	雑工																																			
配水管布設替工事 （明大寺町地内）	準備工																																水道工事課 /(有)今井水道設備	11月末 工事進捗率 実績 43.0 % 予定 41.6 %		
	配水管布設工																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	仮設工																																拠点整備課 /朝日・大伸JV	11月末 工事進捗率 実績 21.5 % 予定 22.1 %		
	P1橋脚工																																			
	P2橋脚工																																			
	P3橋脚工																																			
道路占用事業者 による工事	西日本電信電話(株) (NDS株)																																拠点整備課 /西日本電信電話(株) 中部電力(株)	12/29 1/4 12/29 1/3		
	中部電力(株) (トーエネック株)																																			
配水管布設替工事 （島町ほか3箇町）	準備工																																水道工事課 /石田設備(株)	11月末 工事進捗率 実績 0.1 % 予定 0.1 %		
岡崎警察署明大寺 交番曳家工事	事後調査																																建築課 /小原建設(株)	11月末 工事進捗率 実績 92.1 % 予定 92.1 %		
	片付工																																			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

スズキ水道(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 3,510,000円 ■工期:平成29年9月15日～平成30年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=48m
◎12月は配水管の布設及び撤去を行います。工事中は交通規制があり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますのでご理解とご協力をお願い致します。（年末年始休暇 12/28～1/5）

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事(耐震管2工区)
■請負金額: 96,357,600円 ■工期:平成29年7月21日～平成30年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管(耐震管)布設 L=599m
◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えします。
12月は南側路線の試掘から布設替を順次進めています。
通行には支障がないよう安全に施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

尾崎工業(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 25,056,000円 ■工期:平成29年6月16日～平成29年12月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=254m
◎12月は配水管の布設を行った箇所の舗装復旧及び県道歩道復旧を行います。
工事終了まで残り少となりましたが、引き続き安全には十分配慮して工事を進めてまいります。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 4,536,000円 ■工期:平成29年9月15日～平成30年1月31日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=111m
◎12月は道路予定地での配水管の布設を行います。
工事施工中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
（年末年始休暇 12/29～1/3）

朝日・大伸JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日～平成31年3月1日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
◎12月は橋脚工(P1:仮締切矢板圧入、床掘、均コン打設、杭頭処理、鉄筋組、アンカーフレーム設置 P3:埋戻)等を行います。12月23日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について
■工事概要:道路占用物の設置、撤去など
◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。
中部電力(株)の工事は、夜間作業を伴います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 24,732,000円 ■工期:平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=173m
◎本工事は配水管の布設替えを行います。
12月は準備工として国道協議及び関係者との現地立会いを行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事
■請負金額: 29,688,120円 ■工期:平成29年3月27日～平成29年12月15日
■作業時間:原則8時～17時まで
■工事概要:交番曳家一式
◎11月で外構工事も終了致しました。12月は事後調査、片付け工を行います。
工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様に大変ご不便やご迷惑をお掛けしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

スズキ水道(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 3,510,000円 ■工期:平成29年9月15日～平成30年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=48m
◎12月は配水管の布設及び撤去を行います。工事中は交通規制があり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますのでご理解とご協力をお願い致します。（年末年始休暇 12/28～1/5）

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事(耐震管2工区)
■請負金額: 96,357,600円 ■工期:平成29年7月21日～平成30年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管(耐震管)布設 L=599m
◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えます。
12月は南側路線の試掘から布設替を順次進めていきます。
通行には支障がないよう安全に施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

尾崎工業(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 25,056,000円 ■工期:平成29年6月16日～平成29年12月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=254m
◎12月は配水管の布設を行った箇所の舗装復旧及び県道歩道復旧を行います。
工事終了まで残り少しとなりましたが、引き続き安全には十分配慮して工事を進めてまいります。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 4,536,000円 ■工期:平成29年9月15日～平成30年1月31日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=111m
◎12月は道路予定地での配水管の布設を行います。
工事施工中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
（年末年始休暇 12/29～1/3）

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日～平成31年3月1日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
◎12月は橋脚工(P1:仮締切矢板圧入、床掘、均コン打設、杭頭処理、鉄筋組、アンカーフレーム設置 P3:埋戻)等を行います。12月23日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について
■工事概要:道路占用物の設置、撤去など
◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。
中部電力(株)の工事は、夜間作業を伴います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 24,732,000円 ■工期:平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=173m
◎本工事は配水管の布設替えを行います。
12月は準備工として国道協議及び関係者との現地立会いを行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事
■請負金額: 29,688,120円 ■工期:平成29年3月27日～平成29年12月15日
■作業時間:原則8時～17時まで
■工事概要:交番曳家一式
◎11月で外構工事も終了致しました。12月は事後調査、片付け工を行います。
工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様に大変ご不便やご迷惑をお掛けしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成29年12月号 3/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年12月）																																				
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者		
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
乙川プロムナード整備工事(右岸)その1	準備工																																冬季休暇	道路維持課 /(株)ハラダ建工		
乙川プロムナード整備工事(左岸)その1	準備工																																冬季休暇	道路建設課 /大金建設(株)		
	構造物撤去工																																			
	土工																																			
	軽量盛土工																																			
乙川プロムナード整備工事(左岸)その2	構造物撤去工																																冬季休暇	道路建設課 /(株)岡崎工業		
	緑石工・側溝工																																			
	舗装工																																			
	その他																																			
下水道管渠改築工事(唐沢町ほか1箇町)	準備工																																冬季休暇	下水施設課 /浦上建設(株)		
下水道管渠改築工事(唐沢町ほか3箇町地内)	準備工																																冬季休暇	下水施設課 /浦上建設(株)		
乙川河川緑地整備工事その2	敷地造成工																																冬季休暇	乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株)		
	園路広場整備工																																			
	ベンチテーブル工																																			
	構造物撤去工																																			
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2	準備工																																冬季休暇	道路維持課 /朝日工業(株)		
市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事	仮舗装工																																冬季休暇	拠点整備課 /浅井土木建設(株)		
	側溝工・緑石工																																			
	舗装工																																			
	擁壁工																																			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
■請負金額: 17,874,000円 ■工期:平成29年10月20日～平成30年3月16日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。
12月は準備工を行い、現地測量を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
■請負金額: 27,885,600円 ■工期:平成29年9月20日～平成30年3月5日
■作業時間:原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:舗装工 A=214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 1式
◎12月は準備工(保安設備等)、構造物撤去工、土工、軽量盛土工を行います。
工事中は幅員減少にて道路規制し、12月中旬～1月中旬に取付道路を通行止規制させていただきます。
皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その2
■請負金額: 56,592,000円 ■工期:平成29年11月6日～平成30年3月14日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:舗装工 A=1548m2、側溝工 L=105m、縁石工 L=373m
◎12月は西三河総合庁舎側の歩道工事から車線を規制し作業を行っていきます。
西三河総合庁舎側の歩道完了後は、河川側の歩道工事、車道工事の順に工事を進めていきます。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事
■請負金額: 27,108,000円 ■工期:平成29年9月26日～平成30年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:管推進工 L=22.5m
◎本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法(地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法)にて取り替えます。
12月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事
■請負金額: 46,440,000円 ■工期:平成29年10月24日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:管渠工 L=308.7m
◎本工事は古くなった下水管を新しい管へ布設替えを行います。
12月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地整備工事その2
■請負金額: 119,556,000円 ■工期:平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:アスファルト舗装工 A=623㎡、坂路工 N=1箇所、階段工 N=6箇所
◎12月は堆積土の撤去を行った後、既設の階段を取壊してきれいに作り直します。
工事中は十分安全に注意し作業をすすめて参りますが皆様方におかれましても、ご注意くださいようご協力お願い申し上げます。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
■請負金額: 62,748,000円 ■工期:平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
12月は準備工を行い、現地測量及び境界立会を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名:市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事
■請負金額: 37,929,600円 ■工期:平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:舗装工 A=1415m2、側溝工 L=171m、縁石工 L=338m
◎12月から上明大寺3号線にて本工事を開始致します。
12月中旬から下旬に歩行者通路の切り替えを予定しています。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
■請負金額: 17,874,000円 ■工期: 平成29年10月20日～平成30年3月16日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。
12月は準備工を行い、現地測量を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
■請負金額: 27,885,600円 ■工期: 平成29年9月20日～平成30年3月5日
■作業時間: 原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工 A=214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 1式
◎12月は準備工(保安設備等)、構造物撤去工、土工、軽量盛土工を行います。
工事中は幅員減少にて道路規制し、12月中旬～1月中旬に取付道路を通行止規制させて頂きます。
皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その2
■請負金額: 56,592,000円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月14日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 舗装工 A=1548m2、側溝工 L=105m、緑石工 L=373m
◎12月は西三河総合庁舎側の歩道工事から車線を規制し作業を行っていきます。
西三河総合庁舎側の歩道完了後は、河川側の歩道工事、車道工事の順に工事を進めていきます。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
■請負金額: 27,108,000円 ■工期: 平成29年9月26日～平成30年2月28日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 管推進工 L=22.5m
◎本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法(地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法)にて取り替えます。
12月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
■請負金額: 46,440,000円 ■工期: 平成29年10月24日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで
■工事概要: 管渠工 L=308.7m
◎本工事は古くなった下水管を新しい管へ布設替えを行います。
12月は準備工を行います。現場では既設下水管の位置出し等を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地整備工事その2
■請負金額: 119,556,000円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: アスファルト舗装工 A=623㎡、坂路工 N=1箇所、階段工 N=6箇所
◎12月は堆積土の撤去を行った後、既設の階段を取壊してきれいに作り直します。
工事中は十分安全に注意し作業をすすめて参りますが皆様方におかれましても、ご注意くださいようご協力お願い申し上げます。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
■請負金額: 62,748,000円 ■工期: 平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
12月は準備工を行い、現地測量及び境界立会を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名: 市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事
■請負金額: 37,929,600円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 舗装工 A=1415m2、側溝工 L=171m、緑石工 L=338m
◎12月から上明大寺3号線にて本工事を開始致します。
12月中旬から下旬に歩行者通路の切り替えを予定しています。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。


工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年12月）

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年12月号 5/5

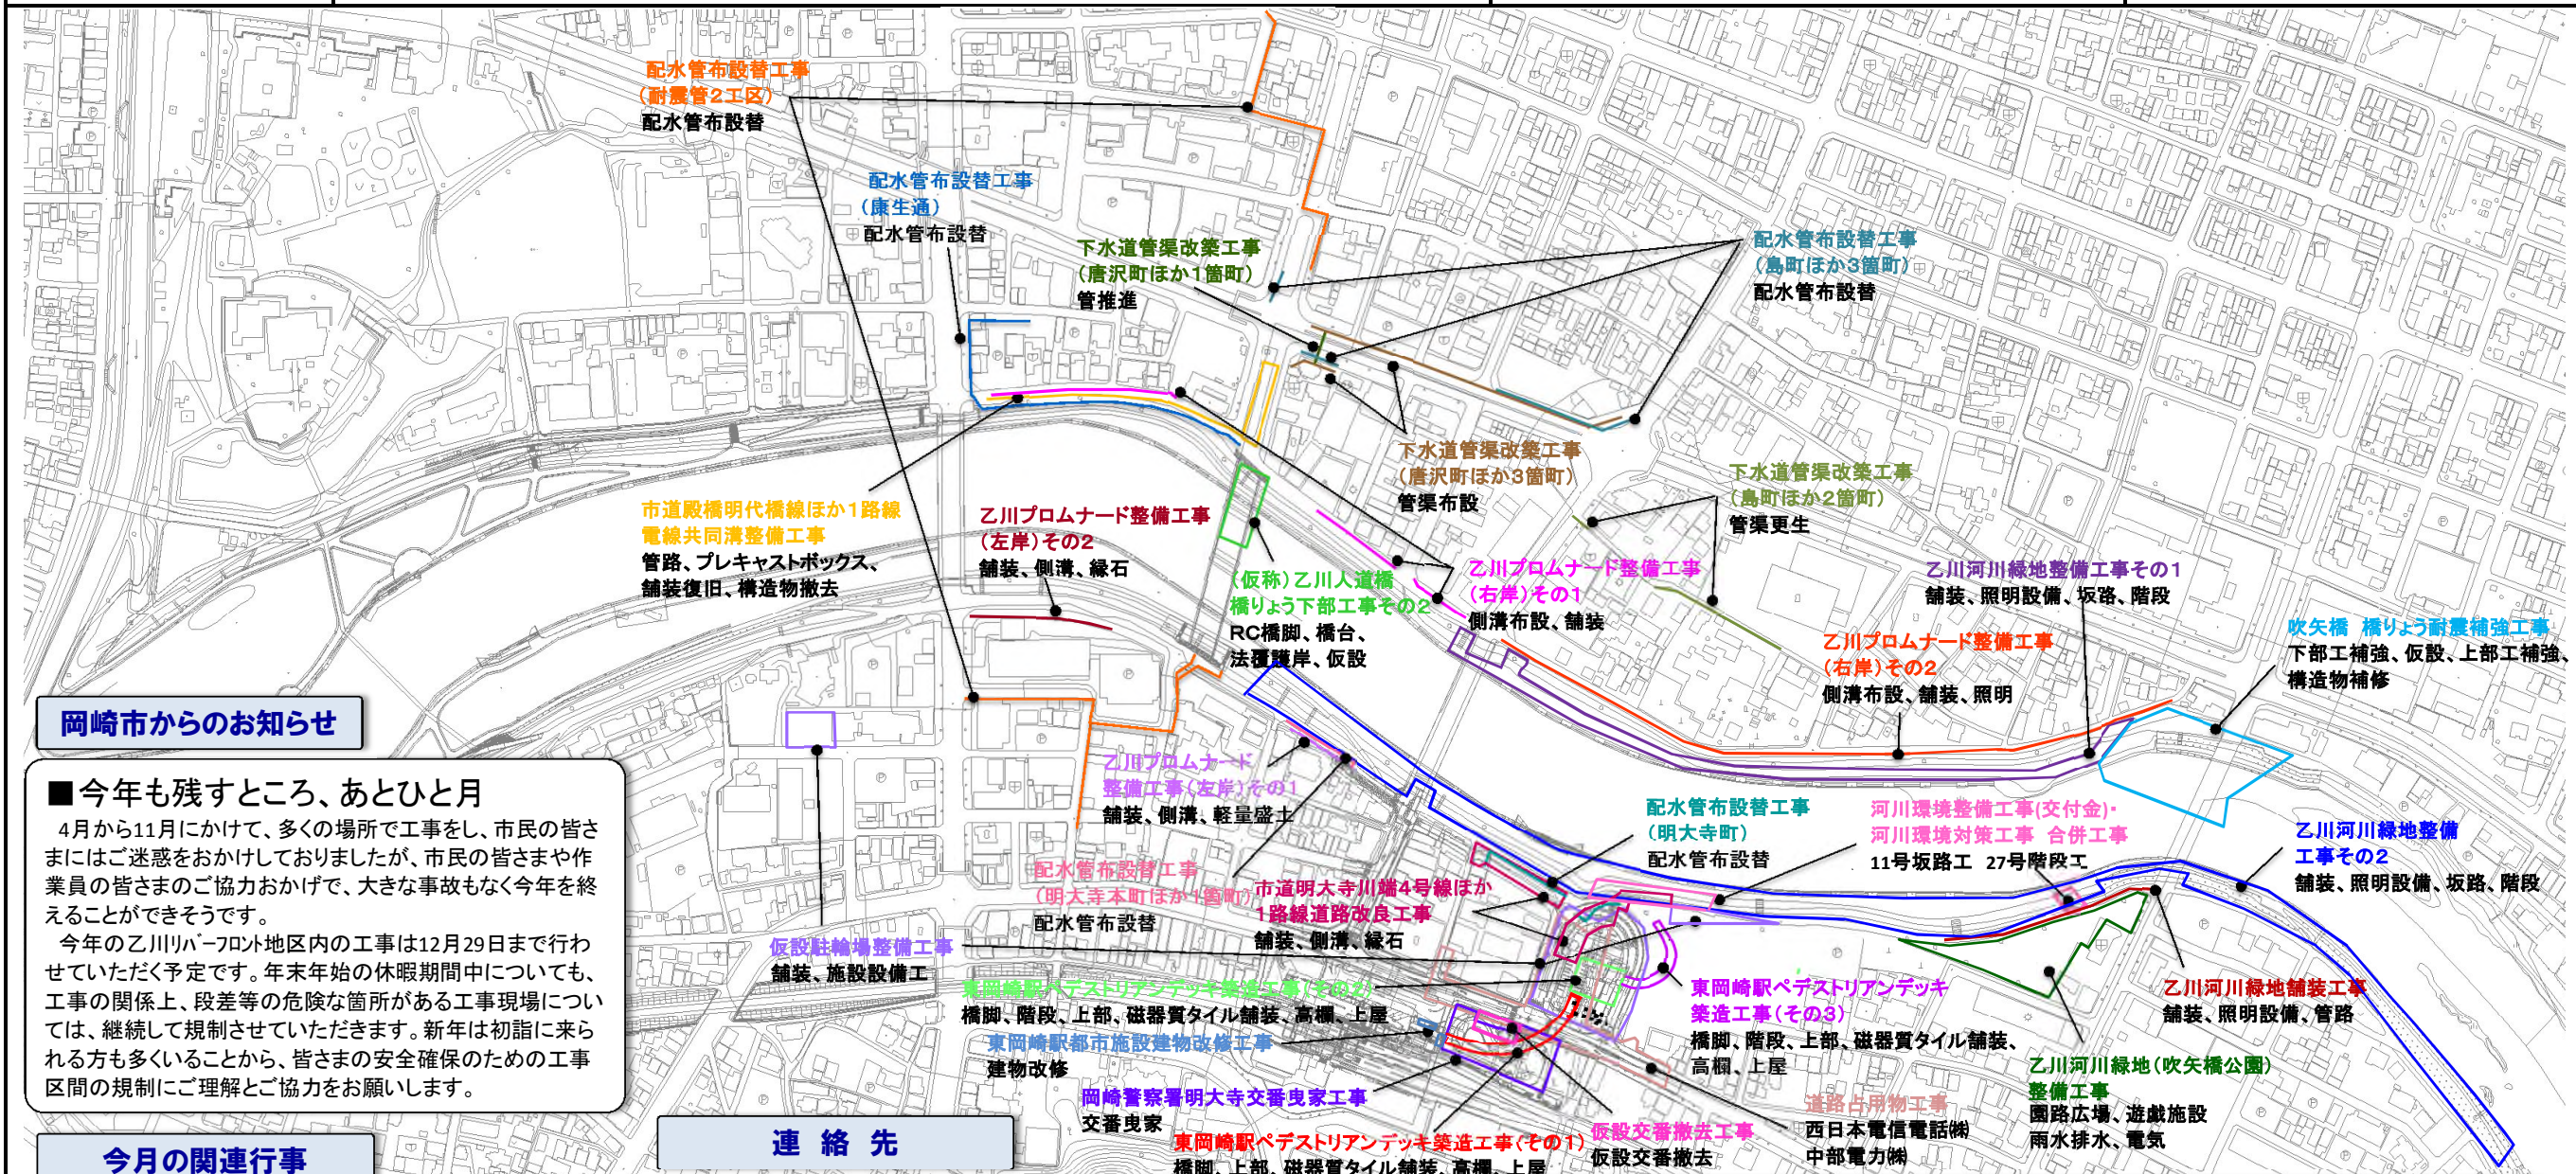

岡崎市からのお知らせ

■今年も残すところ、あとひと月

4月から11月にかけて、多くの場所で工事をし、市民の皆さまにはご迷惑をおかけしておりましたが、市民の皆さまや作業員の皆さまのご協力おかげで、大きな事故もなく今年を終えることができそうです。

今年の乙川リバーフロント地区内の工事は12月29日まで行わせていただく予定です。年末年始の休暇期間中についても、工事の関係上、段差等の危険な箇所がある工事現場については、継続して規制させていただきます。新年は初詣に来られる方も多くいることから、皆さまの安全確保のための工事区間の規制にご理解とご協力をお願いします。

今月の関連行事

家康公生誕祭 12月23日～26日
おとがワ！ンダーランド 7月22日～
岡崎イヤスカルネーション2017 11月25日～平成30年1月8日

乙川リバーフロント地区写真

乙川河川緑地の様子
(岡崎泰平の祈り)



連絡先

■岡崎市担当:

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【吹矢橋公園、人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】
中田、山本、山崎、大野 TEL: 0564-23-6982
- ・水道工事課 北部方面係【配水管布設替（耐震管2工区、康生通、島町ほか3箇町）】
前森 TEL: 0564-23-6482
- ・水道工事課 南部方面係【配水管布設替（明大寺本町ほか、明大寺町）】
永井 TEL: 0564-23-6367
- ・拠点整備課 技術係【ペDESTリアンデッキ、仮設駐輪場、明大寺川端4号線、仮設交番】
吉居、井上、大高 TEL: 0564-23-6607

■施工者:

- 【吹矢橋公園】
・岩附造園(株) 三浦 TEL: 0564-31-0171
- 【人道橋】
・朝日・小原JV 小林 TEL: 0564-51-3657
- 【電線共同溝】
・(株)加藤組 西尾 TEL: 0564-45-2013
- 【仮設駐輪場】
・朝日工業(株) 深谷 TEL: 0564-51-3655
- 【明大寺川端4号線】
・浅井土木建設(株) 浅井 TEL: 0564-51-0308
- 【交番】
・小原建設(株) 岡田 TEL: 0564-51-2623
- 【東岡崎駅建物改修】
・小原建設(株) 日迫 TEL: 0564-51-2622
- 【吹矢橋 橋りょう耐震】
・朝日工業(株) 竹内 TEL: 0564-51-3657

【乙川河川緑地】

- ・その1 松尾建設(株) 市川 TEL: 0564-21-0305
- ・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL: 0564-46-2050
- ・舗装 朝日工業(株) 武田 TEL: 0564-51-3655
- 【プロムナード(左岸)】
・その1 大金建設(株) 田中 TEL: 0564-22-6855
- ・その2 (株)岡崎工業 堀 TEL: 0564-48-2814
- 【プロムナード(右岸)】
・その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL: 0564-25-7970
- ・その2 朝日工業(株) 戸城 TEL: 0564-51-3655
- 【配水管布設替】
・耐震管2工区 石田設備(株) 米田 TEL: 0564-24-0139
- ・康生通 尾崎工業(株) 尾崎 TEL: 0564-22-7411
- ・明大寺本町ほか スズキ水道(株) 鈴木 TEL: 0564-22-1868
- ・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL: 0564-21-4820
- ・島町ほか 石田設備(株) 仲川 TEL: 0564-24-0139

【下水道管渠】

- ・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL: 0564-51-1460
- ・唐沢町ほか3 " " " " TEL: 0564-51-3655
- ・島町ほか2 朝日工業(株) 武田 TEL: 0564-51-3655

【ペDESTリアンデッキ】

- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL: 0564-51-3655

【11号坂路、27号階段】

- ・(株)山口土木 水野 TEL: 0564-65-6570

【道路占用物(西日本電信電話)】担当 鬼頭 TEL: 052-746-6814

- ・NDS(株) 鈴木 TEL: 0564-55-2010 (ケーブル)

【道路占用物工事(中部電力)】担当 原 TEL: 0564-55-5070

- ・トーエネック(株) 小野、林 TEL: 0564-23-3220 (管路・入線)

【仮設交番撤去工事】

- ・サンモク工業(株) 太田 TEL: 0564-21-0038

- ・建築課 計画係 【交番、東岡崎駅建物改修】
中村、鈴木 TEL: 0564-23-6465

■愛知県担当:

- ・西三河建設事務所河川港湾整備課【11号坂路、27号階段】
太田、富田 TEL: 0564-27-2752
