

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																																この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年1月号 2/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年1月）																																					
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者			
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
配水管布設替工事 （明大寺本町ほか1箇町）																																			水道工事課 /スズキ水道(株)		
																																				12月末 工事進捗率 実績 100.0 % 予定 100.0 %	
配水管布設替工事 （耐震管2工区）	仮設工																																		水道工事課 /石田設備(株)		
	配水管布設工																																			12月末 工事進捗率 実績 59.3 % 予定 78.6 %	
配水管布設替工事 （康生通地内）																																			水道工事課 /尾崎工業(株)		
																																				12月末 工事進捗率 実績 100.0 % 予定 100.0 %	
配水管布設替工事 （明大寺町地内）	配水管布設工																																		水道工事課 /(有)今井水道設備		
	舗装工																																			12月末 工事進捗率 実績 82.0 % 予定 82.6 %	
	附帯工																																				
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	仮設工																																		拠点整備課 /朝日・大伸JV		
	P1橋脚工																																			12月末 工事進捗率 実績 27.3 % 予定 27.3 %	
	P2橋脚工																																				
	P3橋脚工																																				
道路占用事業者 による工事	西日本電信電話(株) (NDS株)																																		拠点整備課 /西日本電信電話(株) 中部電力(株)		
	中部電力(株) (トーエネック株)																																				
配水管布設替工事 （島町ほか3箇町）	準備工(国道協議)																																		水道工事課 /石田設備(株)		
																																				12月末 工事進捗率 実績 0.3 % 予定 0.3 %	
岡崎警察署明大寺 交番曳家工事																																			建築課 /小原建設(株)		
																																				12月末 工事進捗率 実績 100.0 % 予定 100.0 %	

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

スズキ水道(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
◎工事期間中は通行規制など、皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。
ご協力ありがとうございました。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事(耐震管2工区)
■請負金額: 96,357,600円 ■工期:平成29年7月21日～平成30年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管(耐震管)布設 L=599m
◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えます。
1月は南側路線の布設替を順次進めていきます。
通行には支障がないよう安全に施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

尾崎工業(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
◎工事期間中は通行規制など、皆様にご迷惑をお掛けしましたが、無事工事完了いたしました。
ご協力ありがとうございました。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 4,536,000円 ■工期:平成29年9月15日～平成30年1月31日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=111m
◎1月は、配水管の布設と舗装復旧を行います。
工事施工中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日～平成31年3月1日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
◎1月は橋脚工(P1:鉄筋型枠組立、底版コン打設、埋戻し、鋼矢板引抜 P3:掘削、均しコン打設)等を行います。
1月8日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について
■工事概要:道路占用物の設置、撤去など
◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。
中部電力(株)の工事は、夜間作業を伴います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 24,732,000円 ■工期:平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=173m
◎本工事は配水管の布設替えを行います。
1月は準備工として国道協議を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

スズキ水道(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
◎工事期間中は通行規制など、皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。
ご協力ありがとうございました。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事(耐震管2工区)
■請負金額: 96,357,600円 ■工期:平成29年7月21日～平成30年2月28日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管(耐震管)布設 L=599m
◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えます。
1月は南側路線の布設替を順次進めていきます。
通行には支障がないよう安全に施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

尾崎工業(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
◎工事期間中は通行規制など、皆様にご迷惑をお掛けしましたが、無事工事完了いたしました。
ご協力ありがとうございました。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 4,536,000円 ■工期:平成29年9月15日～平成30年1月31日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=111m
◎1月は、配水管の布設と舗装復旧を行います。
工事施工中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565, 920,000円 ■工期:平成29年6月27日～平成31年3月1日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
◎1月は橋脚工(P1:鉄筋型枠組立、底版コン打設、埋戻し、鋼矢板引抜 P3:掘削、均しコン打設)等を行います。
1月8日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について
■工事概要:道路占用物の設置、撤去など
◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。
中部電力(株)の工事は、夜間作業を伴います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 24,732,000円 ■工期:平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=173m
◎本工事は配水管の布設替えを行います。
1月は準備工として国道協議を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																																この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年1月号 4/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年1月）																																					
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事担当部署/施工者			
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
仮設交番撤去工事	電気設備撤去工	冬季休暇 12/30 1/4							引込線取外し																									拠点整備課 /サンモク工業(株) 12月末 工事進捗率 実績 43.7 % 予定 43.7 %			
	給排水設備撤去工								引込・放流管取外し																												
	構造物撤去工									外構躯体・基礎躯体撤去																											
	片付け										雑工・片付け・清掃																										
東岡崎駅都市施設建物改修工事	準備工	冬季休暇 12/29 1/3																																建築課 /小原建設(株) 12月末 工事進捗率 実績 6.0 % 予定 6.0 %			
	仮設工																																				
	建具工																																				
下水道管渠改築工事 (島町ほか2箇町地内)	準備工	冬季休暇 12/30 1/8																																下水施設課 /朝日工業(株) 12月末 工事進捗率 実績 26.7 % 予定 26.7 %			
	付帯工																																				
	管渠更生工																																				
道路占用事業者による工事	東邦ガス㈱ (水金工事株)	冬季休暇 12/29 1/4																																道路維持課 /東邦ガス(株)岡崎導管課			
仮設駐輪場整備工事(その2)	準備工	冬季休暇 12/30 1/4																																拠点整備課 /(株)アイセイ電設 12月末 工事進捗率 実績 2.0 % 予定 2.0 %			
	電気設備工																																				
	防護柵工																																				
	区画線工																																				
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	準備工	冬季休暇 12/30 1/4																																拠点整備課 /小原・松尾JV 12月末 工事進捗率 実績 0.1 % 予定 0.1 %			
	仮設工																																				
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工	冬季休暇 12/30 1/4																																拠点整備課 /加藤・岡崎JV 12月末 工事進捗率 実績 0.1 % 予定 0.1 %			
	仮設工																																				
(仮称)人道橋 橋りょう上部工事	準備工	冬季休暇 12/30 1/4																																乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV 12月末 工事進捗率 実績 0.1 % 予定 0.1 %			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

サンモク工業(株)からのお知らせ

■工事名：仮設交番撤去工事
■請負金額：4,914,000円 ■工期：平成29年4月12日～平成30年2月20日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要：仮設交番撤去 1式
◎1月は、給排水等の引込撤去、基礎の撤去を行います。他工事との調整により工期を延期しました。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ

■工事名：東岡崎駅都市施設建物改修工事
■請負金額：22,032,000円 ■工期：平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要：ペDESTリアンデッキ取付用開口1カ所、施設設備工1式、排煙口設置1式
◎本工事では東岡崎駅都市施設を改修しペDESTリアンデッキが接続できるようにします。1月は現場事務所等の設置を行い、北面外壁カーテンウォールに排煙窓を設置します。
工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様に大変ご不便やご迷惑をお掛けしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

朝日工業(株)からのお知らせ

■工事名：下水道管渠改築工事
■請負金額：18,684,000円 ■工期：平成29年10月17日～平成30年3月2日
■作業時間：原則9時～17時まで(一部で21時ごろまで行います。)
(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要：管渠更生工 L=92m
◎本工事では老朽化した下水道管の改築を行います。
1月は付帯工および管渠更生工を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について

■工事概要：道路占用物の設置・撤去など
◎乙川プロムナード整備事業(右岸)その1 に伴い、道路占用物工事を行います。
詳細な交通規制等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からのお知らせ

■工事名：仮設駐輪場整備工事(その2)
■請負金額：3,605,040円 ■工期：平成29年12月14日～平成30年2月28日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要：照明・カメラ機器設置工 1式
◎1月中旬より現場に着手し、2月上旬頃に駐輪場の供用開始をする予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ

■工事名：東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額：462,996,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要：橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
1月は準備工、現場事務所設置を行います。 細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ

■工事名：東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■請負金額：336,960,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要：橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。1月は準備工、現場事務所設置を行います。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・朝日JV からのお知らせ

■工事名：(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事
■請負金額：851,040,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成32年2月28日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要： 橋りょう上部工N=1式
◎(仮称)乙川人道橋の上部工架設工事をします。
まず架設する桁を工場にて製作し、現場施工はH30年11月より開始する予定です。
1月は準備工を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

サンモク工業(株)からのお知らせ ■工事名: 仮設交番撤去工事
■請負金額: 4,914,000円 ■工期: 平成29年4月12日～平成30年2月20日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 仮設交番撤去 1式
◎1月は、給排水等の引込撤去、基礎の撤去を行います。他工事との調整により工期を延期しました。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅都市施設建物改修工事
■請負金額: 22,032,000円 ■工期: 平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: ペDESTリアンデッキ取付用開口1カ所、施設設備工1式、排煙口設置1式
◎本工事では東岡崎駅都市施設を改修しペDESTリアンデッキが接続できるようにします。1月は現場事務所等の設置を行い、北面外壁カーテンウォールに排煙窓を設置します。
工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様に大変ご不便やご迷惑をお掛けしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
■請負金額: 18,684,000円 ■工期: 平成29年10月17日～平成30年3月2日
■作業時間: 原則9時～17時まで(一部で21時ごろまで行います。)
(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 管渠更生工 L=92m
◎本工事では老朽化した下水道管の改築を行います。
1月は付帯工および管渠更生工を行います。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。


道路占用事業者による工事について
■工事概要: 道路占用物の設置・撤去など
◎乙川プロムナード整備事業(右岸)その1 に伴い、道路占用物工事を行います。
詳細な交通規制等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名: 仮設駐輪場整備工事(その2)
■請負金額: 3,605,040円 ■工期: 平成29年12月14日～平成30年2月28日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 照明・カメラ機器設置工 1式
◎1月中旬より現場に着手し、2月上旬頃に駐輪場の供用開始をする予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額: 462,996,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
1月は準備工、現場事務所設置を行います。 細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■請負金額: 336,960,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。1月は準備工、現場事務所設置を行います。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・朝日JV からのお知らせ ■工事名: (仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事
■請負金額: 851,040,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成32年2月28日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋りょう上部工N=1式
◎(仮称)乙川人道橋の上部工架設工事をします。
まず架設する桁を工場にて製作し、現場施工はH30年11月より開始する予定です。
1月は準備工を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

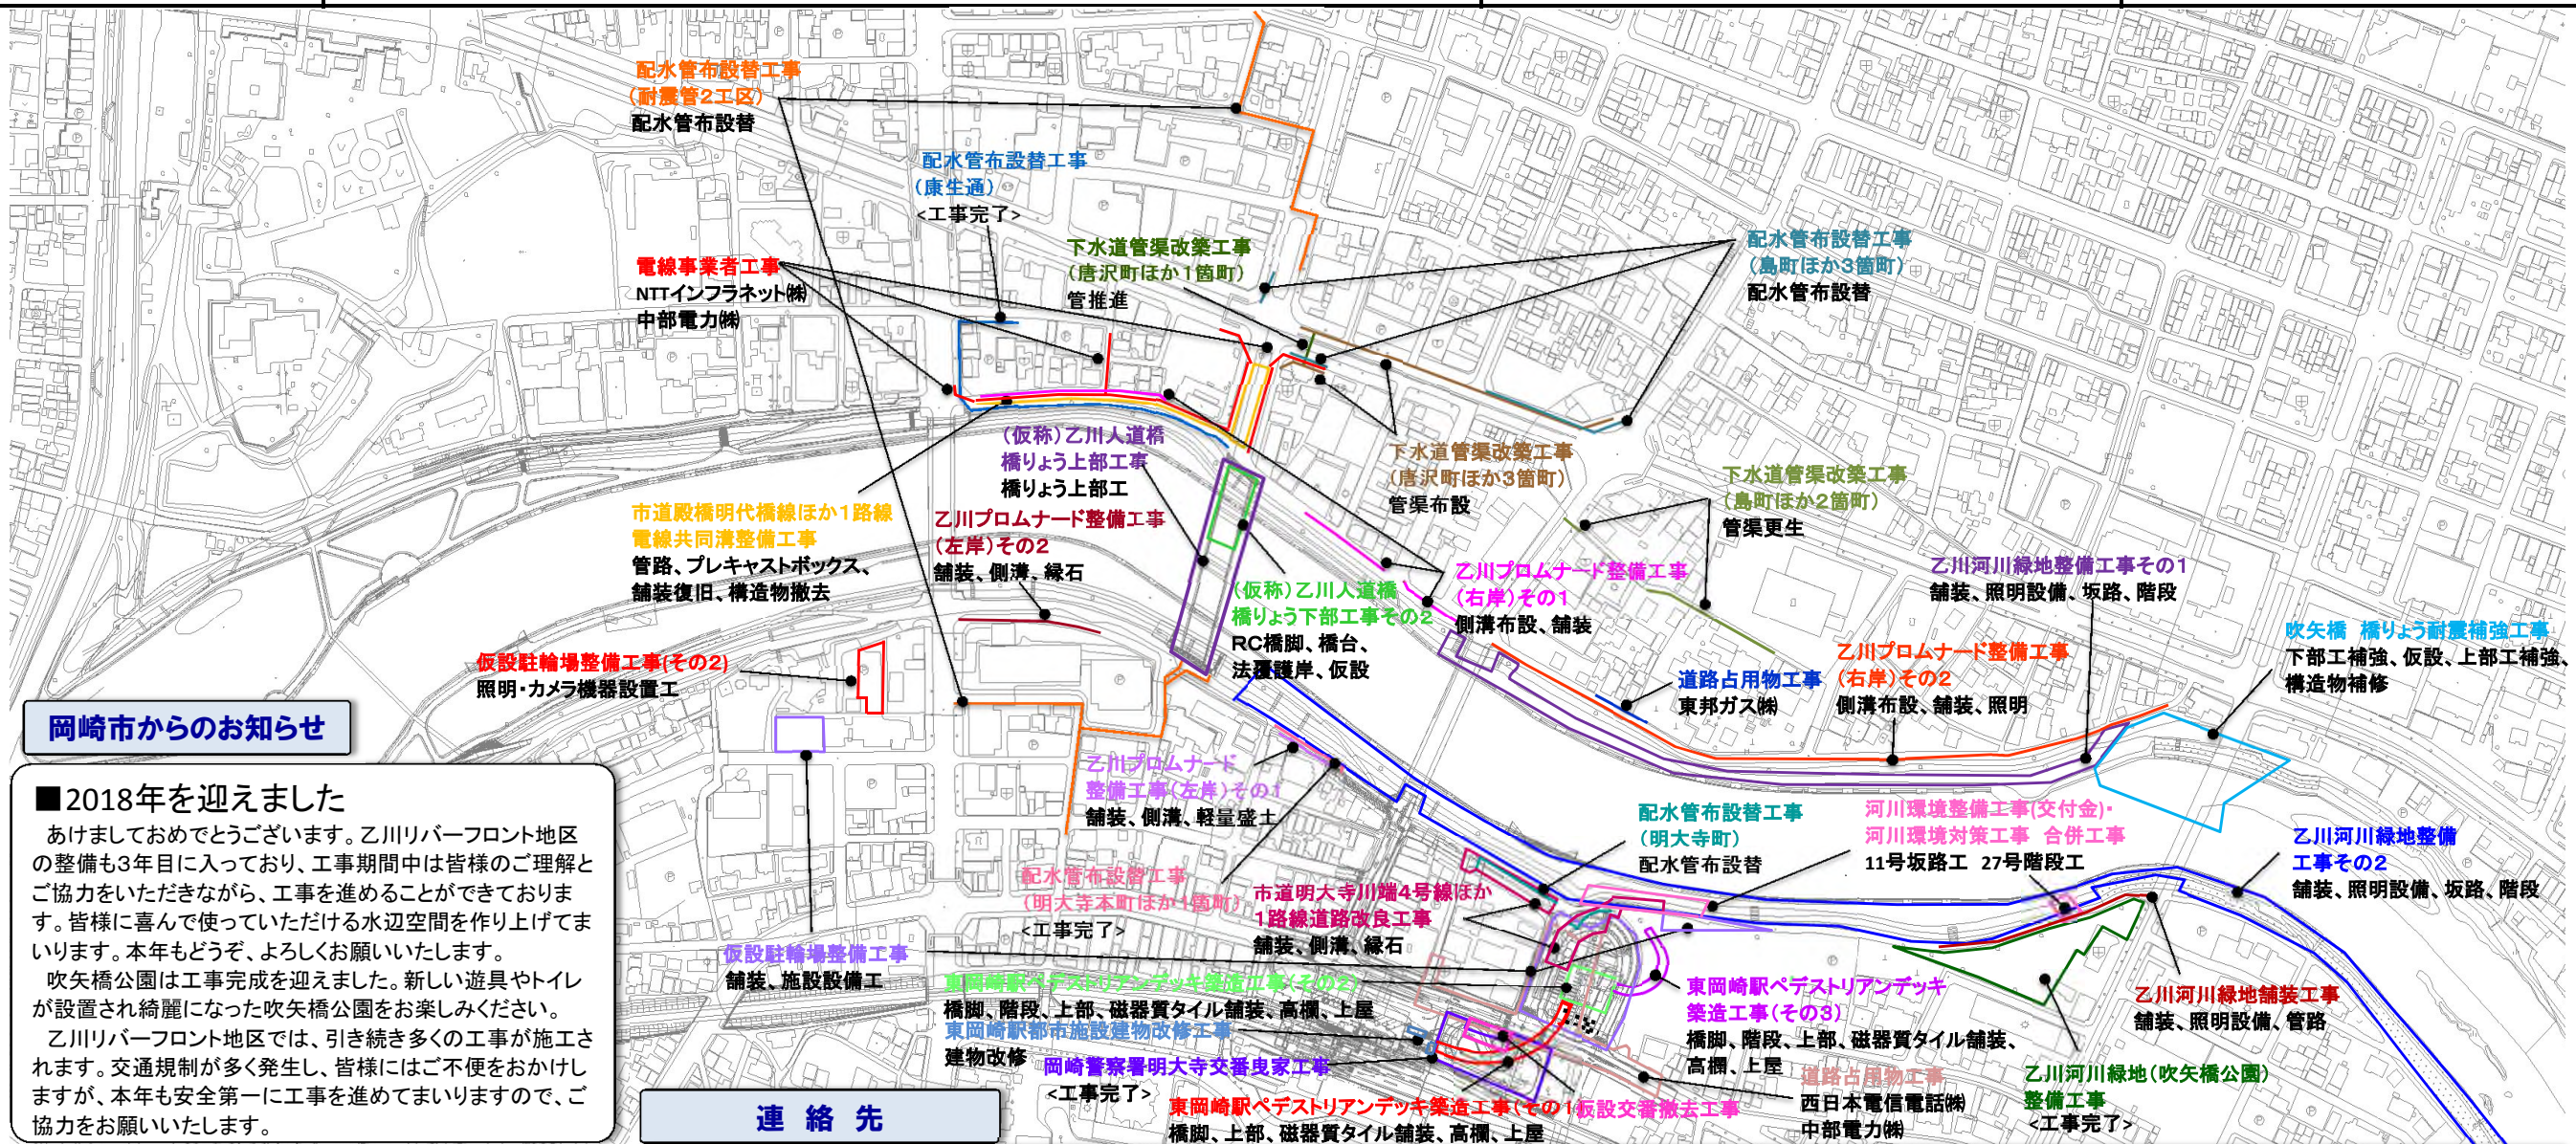

岡崎市からのお知らせ

■2018年を迎えました

あけましておめでとうございます。乙川リバーフロント地区の整備も3年目に入っており、工事期間中は皆様のご理解とご協力をいただきながら、工事を進めることができております。皆様に喜んで使っていただける水辺空間を作り上げてまいります。本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

吹矢橋公園は工事完成を迎えました。新しい遊具やトイレが設置され綺麗になった吹矢橋公園をお楽しみください。

乙川リバーフロント地区では、引き続き多くの工事が施工されます。交通規制が多く発生し、皆様にはご不便をおかけしますが、本年も安全第一に工事を進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。

今月の関連行事

おとがワ！ンダーランド ～1月31日
岡崎イェスウィルミネーション2017 ～1月8日
平成30年岡崎市消防出初式 1月14日

乙川リバーフロント地区写真



連絡先

■岡崎市担当:				・道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】 市川、浅井 TEL:0564-23-6230				・建築課 計画係 【交番、東岡崎駅建物改修】 中村、鈴木 TEL:0564-23-6465			
・乙川リバーフロント推進課 技術係【吹矢橋公園、人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】 中田、山本、山崎、大野 TEL:0564-23-6982				・道路建設課 工事係【プロムナード（左岸）】 大澤、宮地 TEL:0564-23-6743				■愛知県担当:			
・水道工事課 北部方面係【配水管布設替（耐震管2工区、康生通、島町ほか3箇町）】 前森 TEL:0564-23-6482				・下水道施設課 管渠対策係【下水道管渠】 都筑、小倉 TEL:0564-23-6730				・西三河建設事務所河川港湾整備課【11号坂路、27号階段】 太田、富田 TEL:0564-27-2752			
・水道工事課 南部方面係【配水管布設替（明大寺本町ほか、明大寺町）】 永井 TEL:0564-23-6367				・道路維持課 北西部係【プロムナード（右岸）】 津田、平岩 TEL:0564-23-6225							
・拠点整備課 技術係【ベストリアンデッキ、仮設駐輪場、明大寺川端4号線、仮設交番】 吉居、井上、大高 TEL:0564-23-6607											
■施工者:											
【吹矢橋公園】				【ベストリアンデッキ】				【仮設駐輪場】			
・岩附造園(株) 三浦 TEL:0564-31-0171 <工事完了>				・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655				・整備工事 朝日工業(株) 深谷 TEL:0564-51-3655			
【人道橋】				・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623				・ " (その2) (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260			
・朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657				・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013							
・小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623				【プロムナード（左岸）】				【仮設交番撤去工事】			
【電線共同溝】				・その1 大金建設(株) 田中 TEL:0564-22-6855				・サンモク工業(株) 太田 TEL:0564-21-0038			
・(株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013				・その2 (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814				【道路占用物工事（西日本電信電話(株)） 担当 鬼頭 TEL:052-746-6814】			
【明大寺川端4号線】				【プロムナード（右岸）】				・NDS(株) 鈴木 TEL:0564-55-2010 (ケーブル)			
・浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308				・その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970				【道路占用物工事（中部電力(株)） 担当 鈴木 TEL:0564-55-5071】			
【交番】				・その2 朝日工業(株) 戸城 TEL:0564-51-3655				担当 原 TEL:0564-55-5070】			
・小原建設(株) 岡田 TEL:0564-51-2623 <工事完了>				【配水管布設替】				・トーエネック(株) 田中 TEL:0564-51-0800 (支線取付・電柱撤去)			
【東岡崎駅建物改修】				・耐震管2工区 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139				・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)			
・小原建設(株) 日迫 TEL:0564-51-2622				・康生通 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411 <工事完了>				・ " 小野、林 TEL:0564-23-3220 (入線・立上り管・舗装復旧)			
【吹矢橋 橋りょう耐震】				・明大寺本町ほか スズキ水道(株) 鈴木 TEL:0564-22-1868 <工事完了>				【道路占用物工事（東邦ガス(株)） 担当 井本 TEL:0564-21-0823】			
・朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657				・(有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820				・水金工事(株) 米持 TEL:0564-21-5103			
【11号坂路、27号階段】				・島町ほか 石田設備(株) 仲川 TEL:0564-24-0139				【電線事業者工事（NTTインフラネット(株)） 担当 木下 TEL:052-746-6814】			
・(株)山口土木 水野 TEL:0564-65-6570				【下水道管渠】				・NDS(株) 近藤 TEL:0564-55-2020			
【乙川河川緑地】				・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460				【電線事業者工事（中部電力(株)） 担当 原 TEL:0564-55-5070】			
・その1 松尾建設(株) 市川 TEL:0564-21-0305				・唐沢町ほか3 " " TEL:0564-51-3655				・(株)トーエネック 林 TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装復旧)			
・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050				・島町ほか 朝日工業(株) 武田 TEL:0564-51-3655				・ " 田中 TEL:0564-51-0800 (電柱工事)			
・舗装 朝日工業(株) 武田 TEL:0564-51-3655								・ " 鈴木 TEL:0564-51-0800 (電線移替え)			
