

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																												この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年2月号 1/5		
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年2月）																																		
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			工事担当部署/施工者	
		曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
(仮称)乙川人道橋 橋りょう下部工事 その2	P1場所打ち杭工																																乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV	
	P1橋脚工																																	1月末 工事進捗率 実績 38.9 % 予定 39.0 %
	A1橋台工																																	
(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV	
																																		1月末 工事進捗率 実績 0.4 % 予定 0.4 %
市道殿橋明代橋線ほ か1路線電線共同溝 整備工事	管路工																																乙川リバーフロント推進課 /(株)加藤組	
	プレキャストBOX工																																	1月末 工事進捗率 実績 38.2 % 予定 44.5 %
電線事業者 による工事	NTTインフラネット ㈱(NDS㈱)																																乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱ 中部電力㈱	
	中部電力㈱ (トーエネック㈱)																																	
乙川河川緑地整備 工事その1	敷地造成工																																乙川リバーフロント推進課/ 松尾建設(株)	
	張芝工																																	1月末 工事進捗率 実績 23.0 % 予定 23.0 %
	構造物取壊工																																	
	園路広場整備工																																	
乙川河川緑地整備 工事その2	敷地造成工																																乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株)	
	園路広場整備工																																	1月末 工事進捗率 実績 41.5 % 予定 36.2 %
	構造物撤去工																																	
乙川河川緑地 舗装工事	準備工・仮設工																																乙川リバーフロント推進課 /朝日工業(株)	
	照明設備工																																	1月末 工事進捗率 実績 5.3 % 予定 5.3 %
	電線管工																																	
	構造物取壊工																																	
道路占用事業者 による工事	西日本電信電話㈱ (NDS㈱)																																拠点整備課 /西日本電信電話㈱ 中部電力㈱	
	中部電力㈱ (トーエネック㈱)																																	

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名：(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2
■請負金額：343,440,000円 ■工期：平成29年10月3日～平成30年7月31日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要：RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
◎2月はA1橋台躯体工を行います。並行してP1橋脚場所打ち杭工の施工を行い、施工完了後にP1橋脚土工作業に移ります。
12日は祝日ですが、軽微な作業(著しい騒音又は振動を発生させない作業)を予定しています。
工事中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

小原・朝日JVからのお知らせ ■工事名：(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事
■請負金額：851,040,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成32年2月28日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要：橋りょう上部工N=1式
◎(仮称)乙川人道橋の上部工架設工事をします。
まず架設する桁を工場にて製作し、現場施工はH30年11月より開始する予定です。
2月も引き続き準備工を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名：市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
■請負金額：98,539,200円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要：管路工 L=448m、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工1式
◎1月より交通規制を行い殿橋から中央緑道に向けて、プレキャストボックス(マンホール)の据付と管路の埋設をしています。2月上旬より殿橋明代橋線の通行止め、2月下旬より竜田町線西側の通行止めを行う予定です。地域住民の方にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

電線事業者による工事について
■工事概要：電線共同溝設備の設置など
◎乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その1
■請負金額：55,404,000円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要：アスファルト舗装工700㎡、照明設備工N=187基、坂路工1箇所、階段工1箇所
◎2月は掘削・残土処理工と階段工と並行して園路整備に着手します。
工事車両の出入りが多く沿線の皆様方にご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その2
■請負金額：119,556,000円 ■工期：平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要：アスファルト舗装工 A=623㎡、坂路工 N=1箇所、階段工 N=6箇所
◎2月は階段と坂路と園路を作っていきます。工事車両の出入りも多く、近隣の皆様方にご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。工事中は十分安全に注意し作業を進めて参りますが皆様方におかれましても、ご注意くださいようご協力お願い申し上げます。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地舗装工事
■請負金額：22,032,000円 ■工期：平成29年11月27日～平成30年3月26日
■作業時間：原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります)
■工事概要：半たわみ舗装工A=541㎡、照明設備工1式、管路工1式
◎2月8日から堤防道路の通行止めを行い、電線管敷設と照明設備の取付作業を行います。
堤防道路が通行止めとなり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、1日でも早い供用開始を目指して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について
■工事概要：道路占用物の設置、撤去など
◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。
NDS株式会社の工事は、夜間作業を伴います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2
■請負金額: 343,440,000円 ■工期: 平成29年10月3日～平成30年7月31日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
◎2月はA1橋台躯体工を行います。並行してP1橋脚場所打ち杭工の施工を行い、施工完了後にP1橋脚土工作業に移ります。
12日は祝日ですが、軽微な作業(著しい騒音又は振動を発生させない作業)を予定しています。
工事中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

小原・朝日JVからのお知らせ ■工事名:(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事
■請負金額: 851,040,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成32年2月28日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 橋りょう上部工N=1式
◎(仮称)乙川人道橋の上部工架設工事をします。
まず架設する桁を工場にて製作し、現場施工はH30年11月より開始する予定です。
2月も引き続き準備工を行います。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名: 市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
■請負金額: 98,539,200円 ■工期: 平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: 管路工 L=448m、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工1式
◎1月より交通規制を行い殿橋から中央緑道に向けて、プレキャストボックス(マンホール)の据付と管路の埋設をしています。2月上旬より殿橋明代橋線の通行止め、2月下旬より菟田町線西側の通行止めを行う予定です。地域住民の方にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

電線事業者による工事について
■工事概要: 電線共同溝設備の設置など
◎乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地整備工事その1
■請負金額: 55,404,000円 ■工期: 平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: アスファルト舗装工700㎡、照明設備工N=187基、坂路工1箇所、階段工1箇所
◎2月は掘削・残土処理工と階段工と並行して園路整備に着手します。
工事車両の出入りが多く沿線の皆様方にご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願い致します。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地整備工事その2
■請負金額: 119,556,000円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要: アスファルト舗装工 A=623㎡、坂路工 N=1箇所、階段工 N=6箇所
◎2月は階段と坂路と園路を作っていきます。工事車両の出入りも多く、近隣の皆様方にご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。工事中は十分安全に注意し作業を進めて参りますが皆様方におかれましては、ご注意くださいようご協力お願い申し上げます。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地舗装工事
■請負金額: 22,032,000円 ■工期: 平成29年11月27日～平成30年3月26日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
■工事概要: 半たわみ舗装工A=541㎡、照明設備工1式、管路工1式
◎2月8日から堤防道路の通行止めを行い、電線管敷設と照明設備の取付作業を行います。
堤防道路が通行止めとなり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、1日でも早い供用開始を目指して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について
■工事概要: 道路占用物の設置、撤去など
◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。
NDS株式会社の工事は、夜間作業を伴います。
詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース		乙川リバーフロント地区整備事業																												この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年2月号 2/5	
乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年2月）																																	
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			工事担当部署/施工者
		曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	準備工																																拠点整備課 /朝日・大伸JV 1月末 工事進捗率 実績 32.6 % 予定 32.5 %
	P2橋脚工																																
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	準備工																																拠点整備課 /小原・松尾JV 1月末 工事進捗率 実績 0.5 % 予定 1.4 %
	仮設工																																
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	準備工																																拠点整備課 /加藤・岡崎JV 1月末 工事進捗率 実績 0.5 % 予定 2.0 %
	仮設工																																
仮設交番撤去工事	雑工・片付け																																拠点整備課 /サンモク工業(株) 1月末 工事進捗率 実績 92.4 % 予定 92.4 %
仮設駐輪場整備 工事	照明・カメラ機器 移設工																																拠点整備課 /朝日工業(株) 1月末 工事進捗率 実績 94.0 % 予定 98.0 %
仮設駐輪場整備 工事(その2)	雑工・片付け																																拠点整備課 /(株)アイセイ電設 1月末 工事進捗率 実績 95.5 % 予定 95.5 %
市道明大寺川端4号 線ほか1路線道路改 良工事	構造物撤去工																																拠点整備課 /浅井土木建設(株) 1月末 工事進捗率 実績 51.2 % 予定 51.2 %
	側溝工・縁石工																																
	舗装工																																
	路床工																																
吹矢橋 橋りょう 耐震補強工事	P4橋脚補強																																道路建設課 /朝日工業(株) 1月末 工事進捗率 実績 38.9 % 予定 42.9 %
	P5橋脚補強																																
	P6橋脚補強																																
	上部工補強工																																

工事中、皆様にはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565,920,000円 ■工期: 平成29年6月27日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
◎2月は橋脚工(P2: 鉄筋型枠組立、底板コン打設、埋戻し、残土搬出)等を行います。
2月12日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額: 462,996,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
2月は準備工として測量等、仮設工として仮囲いを設置する作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■請負金額: 336,960,000円 ■工期: 平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。
2月初旬は準備工(測量)を行い、中旬頃から仮設工(仮囲い)を行う予定をしています。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

サンモク工業(株)からのお知らせ ■工事名: 仮設交番撤去工事
■請負金額: 4,914,000円 ■工期: 平成29年4月12日～平成30年2月20日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 仮設交番撤去 1式
◎2月は、雑工と片付けを行います。
工事完了まで安全第一で作業を行いますので、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 仮設駐輪場整備工事
■請負金額: 19,872,000円 ■工期: 平成29年9月8日～平成30年3月30日
■作業時間: 原則9時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 舗装工 A=487㎡ 施設設備工1式
◎2月は、仮設駐輪場撤去に伴う照明・カメラ等の撤去作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名: 仮設駐輪場整備工事(その2)
■請負金額: 3,605,040円 ■工期: 平成29年12月14日～平成30年2月28日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 照明・カメラ機器設置工 1式
◎1月30日に仮設駐輪場の供用を開始しました。2月は雑工と片付けを行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名: 市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事
■請負金額: 37,929,600円 ■工期: 平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要: 舗装工 A=1415m2、側溝工 L=171m、縁石工 L=338m
◎2月から市道明大寺川端4号線を施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
■請負金額: 111,240,000円 ■工期: 平成29年9月15日～平成30年3月26日
■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長する場合があります。)
■工事概要: 下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
◎2月は橋脚の下部と上部の補強工事を行います。
多少の騒音が発生すると思われますが、細心の注意を払って作業を行います。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■請負金額: 565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日～平成31年3月1日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
◎2月は橋脚工(P2:鉄筋型枠組立、底版コン打設、埋戻し、残土搬出)等を行います。
2月12日(祝日)は重機を使用しない作業をさせていただきます。
細心の注意を払って工事を進めてまいります。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

小原・松尾JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■請負金額: 462,996,000円 ■工期:平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要:橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
◎ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
2月は準備工として測量等、仮設工として仮囲いを設置する作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■請負金額: 336,960,000円 ■工期:平成29年12月25日～平成31年3月1日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要:橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
◎ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します。
2月初旬は準備工(測量)を行い、中旬頃から仮設工(仮囲い)を行う予定をしています。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

サンモク工業(株)からのお知らせ ■工事名:仮設交番撤去工事
■請負金額: 4,914,000円 ■工期:平成29年4月12日～平成30年2月20日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:仮設交番撤去 1式
◎2月は、雑工と片付けを行います。
工事完了まで安全第一で作業を行いますので、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名:仮設駐輪場整備工事
■請負金額: 19,872,000円 ■工期:平成29年9月8日～平成30年3月30日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要:舗装工 A=487㎡ 施設設備工1式
◎2月は、仮設駐輪場撤去に伴う照明・カメラ等の撤去作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名:仮設駐輪場整備工事(その2)
■請負金額: 3,605,040円 ■工期:平成29年12月14日～平成30年2月28日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:照明・カメラ機器設置工 1式
◎1月30日に仮設駐輪場の供用を開始しました。2月は雑工と片付けを行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名:市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良工事
■請負金額: 37,929,600円 ■工期:平成29年11月6日～平成30年3月23日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:舗装工 A=1415m2、側溝工 L=171m、縁石工 L=338m
◎2月から市道明大寺川端4号線を施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名:吹矢橋 橋りょう耐震補強工事
■請負金額: 111,240,000円 ■工期:平成29年9月15日～平成30年3月26日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■工事概要:下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
◎2月は橋脚の下部と上部の補強工事を行います。
多少の騒音が発生すると思われませんが、細心の注意を払って作業を行います。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																												この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成30年2月号 3/5	
			乙川リバーフロント関連工事工程表（平成30年2月）																															
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			工事担当部署/施工者	
		曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
乙川プロムナード整備工事(左岸)その1	軽量盛土工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	道路建設課 /大金建設(株)	
	土工																															1月末 工事進捗率 実績 65.2 % 予定 73.0 %		
	舗装工																																	
	その他																																	
乙川プロムナード整備工事(左岸)その2	構造物撤去工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	道路建設課 /(株)岡崎工業	
	縁石工・側溝工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1月末 工事進捗率 実績 50.5 % 予定 50.5 %	
	舗装工																																	
	その他																																	
乙川プロムナード整備工事(右岸)その1	準備工																																道路維持課 /(株)ハラダ建工	
	撤去工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1月末 工事進捗率 実績 39.4 % 予定 39.4 %	
	排水構造物工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	付帯工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
乙川プロムナード整備工事(右岸)その2	構造物撤去工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	道路維持課 /朝日工業(株)	
	排水構造物工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1月末 工事進捗率 実績 17.0 % 予定 18.8 %	
	照明灯工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	縁石工																																	
道路占用事業者による工事	東邦ガス株(水金工事株)																																道路維持課 /東邦ガス(株)岡崎導管課	
配水管布設替工事(島町ほか3箇町)	準備工(国道協議)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	水道工事課 /石田設備(株)	
																																	1月末 工事進捗率 実績 0.5 % 予定 0.5 %	
配水管布設替工事(耐震管2工区)	配水管布設工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	水道工事課 /石田設備(株)	
	給水管切替工																																1月末 工事進捗率 実績 76.3 % 予定 95.2 %	
	仮設配水管撤去工																																	
	洗管																																	
配水管布設替工事(明大寺町地内)																																	水道工事課 /(有)今井水道設備	
																																	1月末 工事進捗率 実績 100.0 % 予定 100.0 %	

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
■請負金額:27,885,600円 ■工期:平成29年9月20日～平成30年3月5日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:舗装工 A=214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 1式
◎2月は軽量盛土工、土工、舗装工、その他を行います。
引き続き工事中は幅員減少にて道路規制をさせていただきます。
皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その2
■請負金額:56,592,000円 ■工期:平成29年11月6日～平成30年3月14日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:舗装工 A=1548m2、側溝工 L=105m、縁石工 L=373m
◎2月上旬より車道の舗装工事を行っていきます。車道舗装が完了後、河川側の歩道舗装工事を進めていきます。
歩行者通行帯は、先月同様に庁舎側の完成された歩道を通行できます。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
■請負金額:17,874,000円 ■工期:平成29年10月20日～平成30年3月16日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。
2月は東側が終わり次第、近接業者と調整の上、西側の側溝を施工します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
■請負金額:62,748,000円 ■工期:平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
2月は排水構造物・縁石工・照明の基礎設置・ケーブル配管を施工予定です。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
※1工区:岡崎信用金庫の南側T字路以东 2工区:岡崎信用金庫の南側T字路以西

道路占用事業者による工事について
【工事完了】
◎工事期間中は通行規制など、皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。
ご協力ありがとうございました。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額:24,732,000円 ■工期:平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=173m
◎本工事は配水管の布設替えを行います。
2月は準備工として国道協議を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事(耐震管2工区)
■請負金額:96,357,600円 ■工期:平成29年7月21日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管(耐震管)布設 L=599m
◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えします。
2月は南側路線の布設替を順次進めていきます。
通行には支障がないよう安全に施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
■請負金額: 27,885,600円 ■工期:平成29年9月20日～平成30年3月5日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:舗装工 A=214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 1式
◎2月は軽量盛土工、土工、舗装工、その他を行います。
引き続き工事中は幅員減少にて道路規制をさせていただきます。
皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(左岸)その2
■請負金額: 56,592,000円 ■工期:平成29年11月6日～平成30年3月14日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:舗装工 A=1548m2、側溝工 L=105m、縁石工 L=373m
◎2月上旬より車道の舗装工事を行っています。車道舗装が完了後、河川側の歩道舗装工事を進めていきます。
歩行者通行帯は、先月同様に片舎側の完成された歩道を通行できます。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
■請負金額: 17,874,000円 ■工期:平成29年10月20日～平成30年3月16日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。
2月は東側が終わり次第、近接業者と調整の上、西側の側溝を施工します。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。


朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名:乙川プロムナード整備工事(右岸)その2
■請負金額: 62,748,000円 ■工期:平成29年11月13日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。
2月は排水構造物・縁石工・照明の基礎設置・ケーブル配管を施工予定です。
工事中は交通規制等で皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
※1工区:岡崎信用金庫の南側T字路以東 2工区:岡崎信用金庫の南側T字路以西

道路占用事業者による工事について
【工事完了】
◎工事期間中は通行規制など、皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。
ご協力ありがとうございました。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 24,732,000円 ■工期:平成29年10月19日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管布設 L=173m
◎本工事は配水管の布設替えを行います。
2月は準備工として国道協議を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事(耐震管2工区)
■請負金額: 96,357,600円 ■工期:平成29年7月21日～平成30年3月23日
■作業時間:原則9時～17時まで
■工事概要:配水管(耐震管)布設 L=599m
◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えします。
2月は南側路線の布設替を順次進めていきます。
通行には支障がないよう安全に施工いたします。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

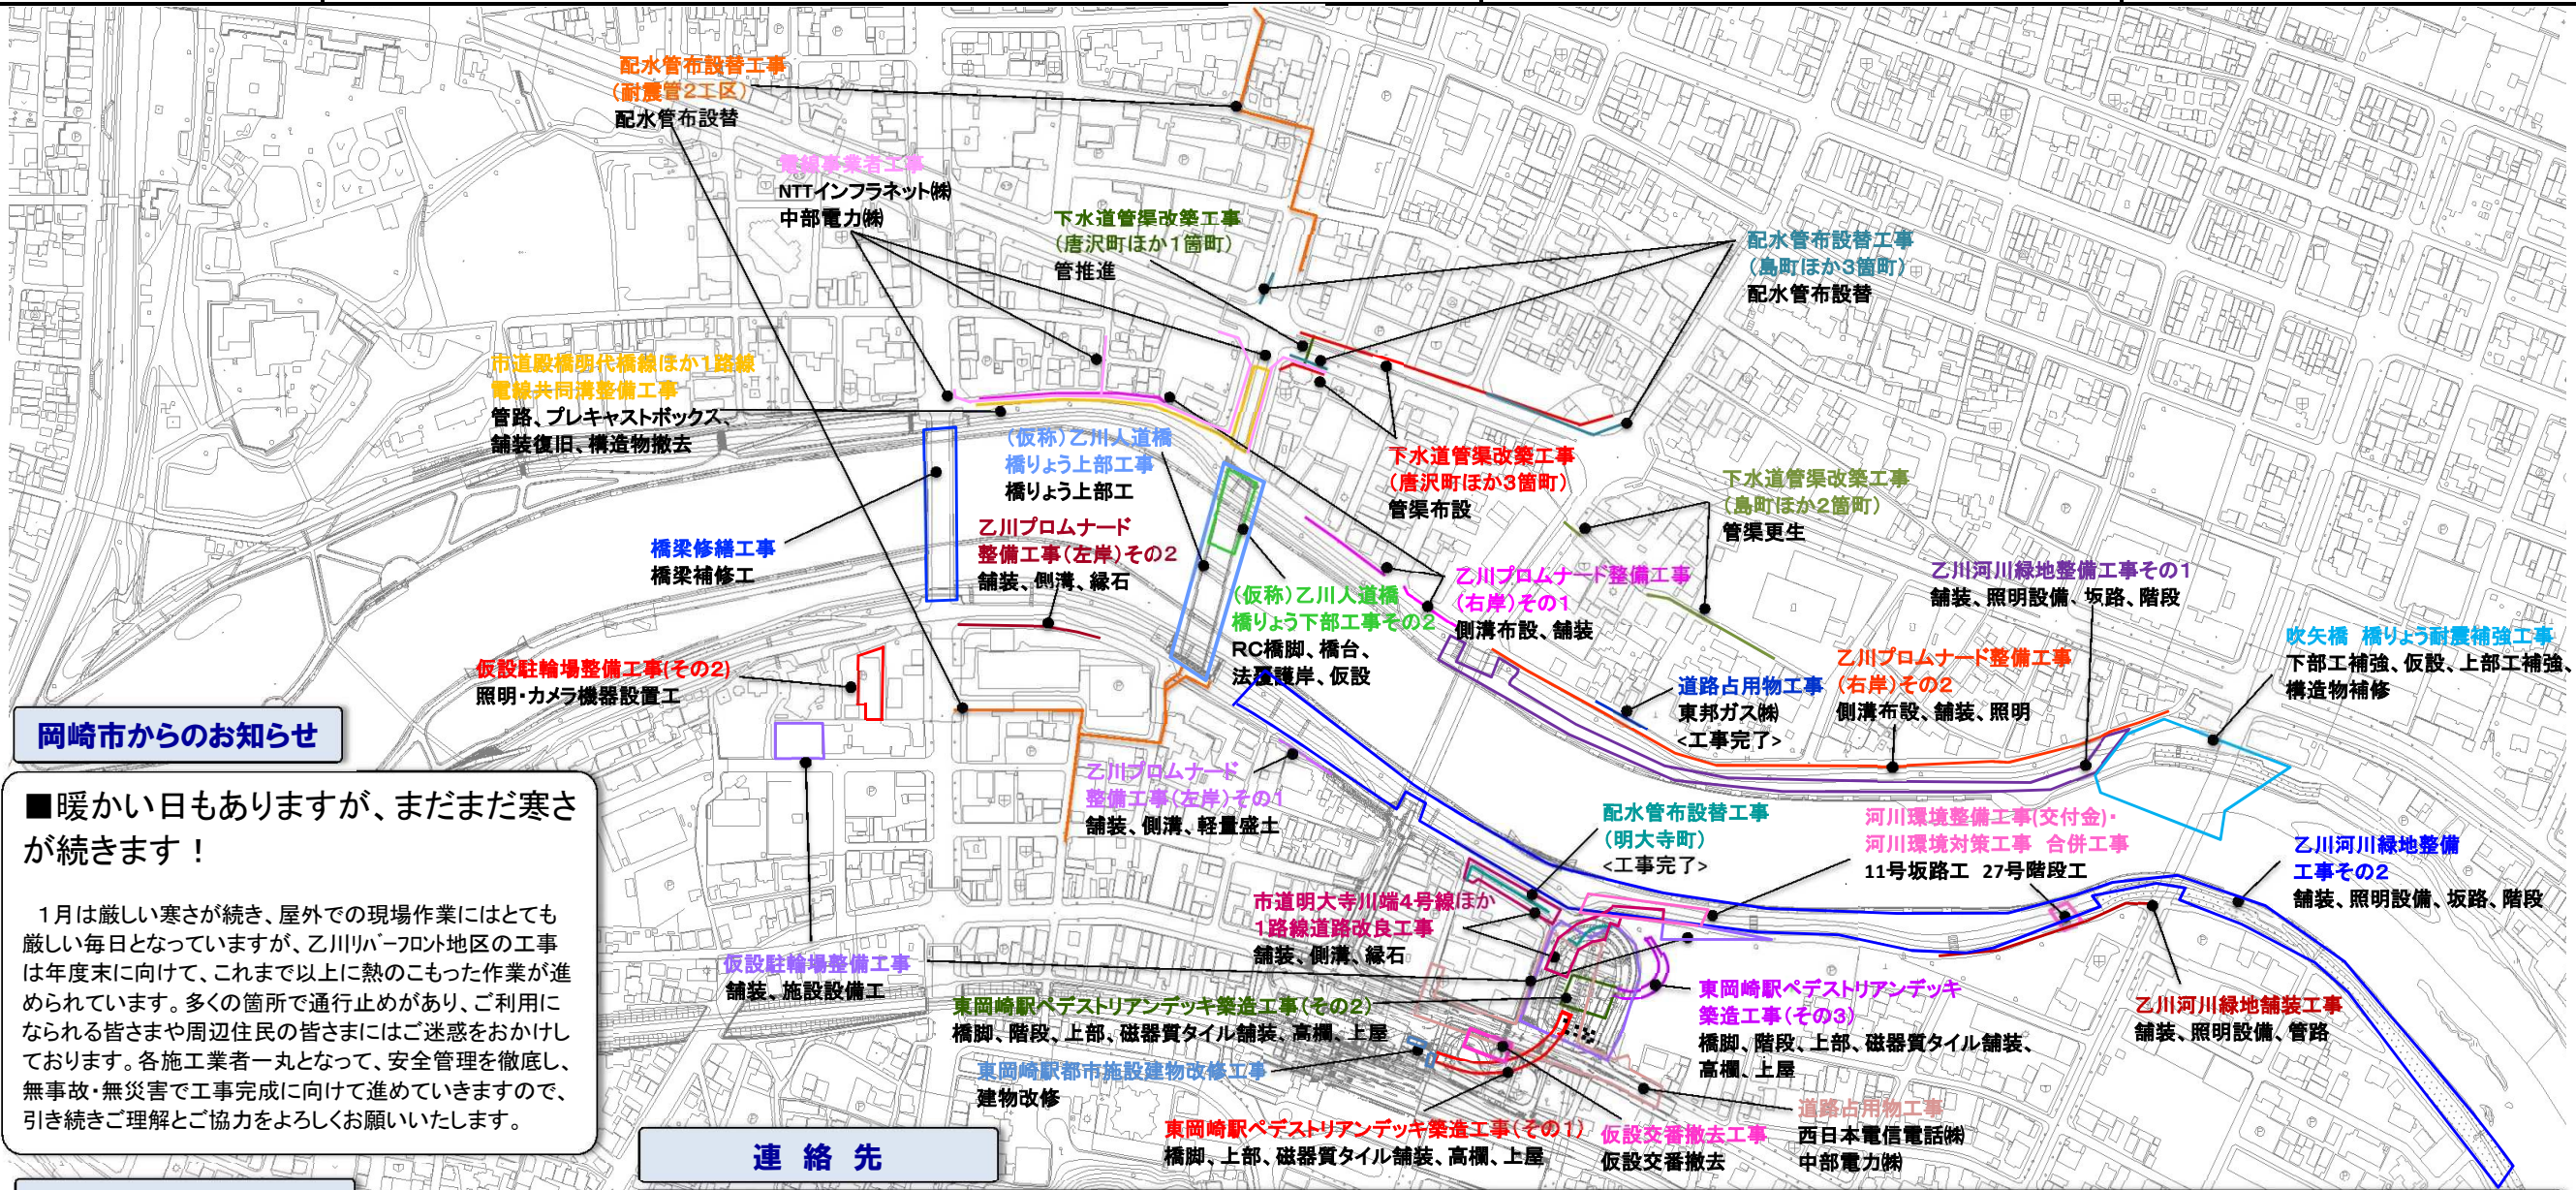

岡崎市からのお知らせ

■暖かい日もありますが、まだまだ寒さが続きます！

1月は厳しい寒さが続き、屋外での現場作業にはとても厳しい毎日となっていますが、乙川リバーフロント地区の工事は年度末に向けて、これまで以上に熱のこもった作業が進められています。多くの箇所で行き止まりがあり、ご利用になられる皆さまや周辺住民の皆さまにはご迷惑をおかけしております。各施工業者一丸となって、安全管理を徹底し、無事故・無災害で工事完成に向けて進めていきますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

今月の関連行事

特になし

乙川リバーフロント地区写真

乙川河川緑地利用状況
【消防出初式】



連絡先

■岡崎市担当:

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】
中田、山本、山崎、大野 TEL: 0564-23-6982
- ・水道工事課 北部方面係【配水管布設替（耐震管2工区、島町ほか）】
前森 TEL: 0564-23-6482
- ・水道工事課 南部方面係【配水管布設替（明大寺町）】
永井 TEL: 0564-23-6367
- ・拠点整備課 技術係【ベストリアンデッキ、仮設駐輪場、明大寺川端4号線、仮設交番】
吉居、井上、大高 TEL: 0564-23-6607

■施工者:

- 【人道橋】
 - ・下部工 朝日・小原JV 小林 TEL: 0564-51-3657
 - ・上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL: 0564-51-2623
- 【乙川河川緑地】
 - ・その1 松尾建設(株) 市川 TEL: 0564-21-0305
 - ・その2 成瀬建設(株) 深田 TEL: 0564-46-2050
 - ・舗装 朝日工業(株) 武田 TEL: 0564-51-3655
- 【電線共同溝】
 - ・(株)加藤組 西尾 TEL: 0564-45-2013
- 【明大寺川端4号線】
 - ・浅井土木建設(株) 浅井 TEL: 0564-51-0308
- 【東岡崎駅建物改修】
 - ・小原建設(株) 日迫 TEL: 0564-51-2622
- 【11号坂路、27号階段】
 - ・(株)山口土木 水野 TEL: 0564-65-6570
- 【橋梁修繕工事】
 - ・朝日工業(株) 杉山 TEL: 0564-51-3657

【ベストリアンデッキ】

- ・その1 朝日・大伸JV 鈴木 TEL: 0564-51-3655
- ・その2 小原・松尾JV 磯谷 TEL: 0564-51-2623
- ・その3 加藤・岡崎JV 青井 TEL: 0564-45-2013

【プロムナード（左岸）】

- ・その1 大金建設(株) 田中 TEL: 0564-22-6855
- ・その2 (株)岡崎工業 堀 TEL: 0564-48-2814

【プロムナード（右岸）】

- ・その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL: 0564-25-7970
- ・その2 朝日工業(株) 戸城 TEL: 0564-51-3655

【配水管布設替】

- ・耐震管2工区 石田設備(株) 米田 TEL: 0564-24-0139
- ・島町ほか " 仲川 TEL: "
- ・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL: 0564-21-4820 <工事完了>

【下水道管渠】

- ・唐沢町ほか1 浦上建設(株) 牧野 TEL: 0564-51-1460
- ・唐沢町ほか3 " " TEL: "
- ・島町ほか 朝日工業(株) 武田 TEL: 0564-51-3655

- ・道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】
市川、浅井 TEL: 0564-23-6230
- ・道路建設課 工事係【プロムナード（左岸）】
大澤、宮地 TEL: 0564-23-6743
- ・下水道施設課 管渠対策係【下水道管渠】
都筑、小倉 TEL: 0564-23-6730
- ・道路維持課 北西部係【プロムナード（右岸）】
津田、平岩 TEL: 0564-23-6225

- ・建築課 計画係【東岡崎駅建物改修】
中村、鈴木 TEL: 0564-23-6465

■愛知県担当:

- ・西三河建設事務所河川港湾整備課【11号坂路、27号階段】
太田、富田 TEL: 0564-27-2752
- ・西三河建設事務所道路整備課【橋梁修繕工事】
成瀬 TEL: 0564-27-2756

【仮設駐輪場】

- ・整備工事 朝日工業(株) 深谷 TEL: 0564-51-3655
- ・" (その2) (株)アイセイ電設 兼元 TEL: 0564-25-2260

【仮設交番撤去工事】

- ・サンモク工業(株) 太田 TEL: 0564-21-0038

【吹矢橋 橋りょう耐震】

- ・朝日工業(株) 竹内 TEL: 0564-51-3657

【道路占用物工事（西日本電信電話）】 担当 鬼頭 TEL: 052-746-6814

- ・NDS(株) 鈴木 TEL: 0564-55-2010

【道路占用物工事（中部電力）】 担当 原 TEL: 0564-55-5070

- ・(株)トーエネック 小野、林 TEL: 0564-23-3220 (舗装復旧)

【道路占用物工事（東邦ガス）】 担当 井本 TEL: 0564-21-0823

- ・水金工事(株) 米持 TEL: 0564-21-5103 <工事完了>

【電線事業者工事（NTTインフラネット）】 担当 木下 TEL: 0564-21-0823

- ・NDS(株) 近藤 TEL: 0564-55-2020

【電線事業者工事（中部電力）】 担当 原 TEL: 0564-21-0823

- ・(株)トーエネック 林 TEL: 0564-23-3220 (管路工事・舗装工事)
- ・" 田中 TEL: 0564-51-0800 (電柱工事)
- ・" 鈴木 TEL: 0564-51-0800 (電線移替え)
