

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。		平成31年4月号 1 / 5	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年4月)																																	
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		工事担当部署/施工者		
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
(仮称)乙川人道橋 橋りょう上部工事	床版工 型枠工																																	乙川リバーフロント推進課 /小原・朝日JV		
	鉄筋工																																	3月末 工事進捗率 実績 81.8 % 予定 86.2 %		
	橋梁付属物工 排水装置工																																			
配水管添架工事 (耐震管2工区)	工場製作																																	水道工事課 /フジ興業(株)		
	添架工 上流側																																	3月末 工事進捗率 実績 70.0 % 予定 40.0 %		
	添架工 下流側																																			
(仮称)乙川人道橋 橋りょう木装化工事	準備工																																	乙川リバーフロント推進課 /小原木材(株)		
																																		3月末 工事進捗率 実績 0.3 % 予定 0.3 %		
(仮称)乙川人道橋 橋りょう照明工事	ケーブルラック取付																																	乙川リバーフロント推進課 /第一電力建設(株)		
																																		3月末 工事進捗率 実績 3.0 % 予定 3.0 %		
乙川河川緑地整備 工事その1																																		乙川リバーフロント推進課 /㈱加藤組		
乙川河川緑地整備 工事その2																																		乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株)		
市道籠田町線 仮設道路設置工事																																		乙川リバーフロント推進課 /㈱山口土木		
電線事業者 による工事	NTTインフラネット(株)																																	乙川リバーフロント推進課 /エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 中部電力(株)		
	中部電力(株) (トーエネック(株))																																			
工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。																																				
小原・朝日JV からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう上部工事 ■ 請負金額: 851,040,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日 ~ 平成32年2月28日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 橋りょう上部工N=1式 今月より、床版工事(型枠、鉄筋)が始まります。橋面上の人力作業が主ですので大きな騒音振動はありません。 型枠材、鉄筋の荷下し時、堤防道路の道路規制(幅員減少)を行います。 工事の進捗状況により、日曜又は祝日に特定建設作業に該当しない作業を行う場合があります。 工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。																																				
フジ興業(株) からのお知らせ ■ 工事名: 配水管添架工事(耐震管2工区) ■ 請負金額: 75,600,000円 ■ 工期: 平成30年12月10日 ~ 平成31年5月31日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: φ250A SUS 249.2m 4月の工事予定は人道橋(桜城橋)の左岸側堤防道路での作業になります。 幅員減少規制を実施しますのでよろしくお願い致します。																																				
小原木材(株) からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう木装化工事 ■ 請負金額: 47,304,000 円 ■ 工期: 平成31年1月24日 ~ 平成32年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 木工事N=1式 本工事は、桜城橋の木装化工事を行います。 4月は、準備工となります。 工事期間中、ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力願います。																																				
第一電力建設(株) からのお知らせ ■ 工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう照明工事 ■ 請負金額: 51,300,000円 ■ 工期: 平成31年1月23日 ~ 平成32年3月19日 ■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで (作業状況により時間延長をすることがあります。) ■ 工事概要: 電灯設備N=1式 本工事は、桜城橋へ照明を設置する工事を行います。 4月は、ケーブルラックの取付工事を行います。 工事期間中、ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力願います。																																				
(株)加藤組からのお知らせ ■ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その1 [工事完了] 3月22日に工事を完了し、規制を解除しました。工事中は沿線住民の方及び河川緑地を利用される 皆様には大変ご迷惑をおかけしました。工事完了までの間安全に施工することができました。 工事中は、ご協力ありがとうございました。																																				
成瀬建設(株) からのお知らせ ■ 工事名: 乙川河川緑地整備工事その2 [工事完了] 吹矢橋下流(左岸側)の堤防道路は、修景良く仕上がり、夜は照明が明るくなったことで 安心して通れるようになりました。たくさんの方々にご利用いただけると幸いです。 桜城橋(左岸側)の擁壁や階段も綺麗に出来上がりました。関連工事が続くため、 お披露目はまだ先となります。供用開始まで今しばらくお待ちください。 皆様のご理解とご協力を賜り、無事竣工することができました。 工事関係者一同、心から感謝しています。ありがとうございました。																																				
(株)山口土木からのお知らせ ■ 工事名: 市道籠田町線仮設道路設置工事 [工事完了] 工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。 皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。 工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。																																				
電線事業者による工事について ■ 工事概要: 電線共同溝設備の設置など 乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。 詳細な交通規制・作業時間等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。																																				

工事完了

工事完了

工事完了

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																														この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	平成31年4月号 2 / 5	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年4月)																																
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者		
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
籠田公園整備工事	建築基礎工事																																	乙川リバーフロント推進課 /朝日・松尾JV 3月末 工事進捗率 実績 24.8 % 予定 24.8 %	
	東屋工事																																		
	公園土木工事																																		
籠田公園トイレ・ステージ等新築工事	トイレ新築工事																																	建築課 /杉林建設(株) 3月末 工事進捗率 実績 83.4 % 予定 89.9 %	
	ステージ新築工事																																		
	スタジオ新築工事																																		
配水管布設替工事 (鳥町ほか3箇町)																																		水道工事課 /石田設備(株)	
配水管布設替工事 (明大寺町ほか2箇町)																																		水道工事課 /(有)今井水道設備	
配水管布設工事 (耐震管3工区)	準備工																																	水道工事課 /セイコー建設(有) 3月末 工事進捗率 実績 2.5 % 予定 2.5 %	
	管布設工 (φ250)																																		
配水管布設替工事	準備工																																	水道工事課 /株)河合設備 3月末 工事進捗率 実績 1.4 % 予定 1.4 %	
	仮設配水管工																																		
	配水管布設替工事																																		
下水道管渠改築工事 (籠田町ほか1箇町)																																		下水施設課 /(株)山口土木	
下水道管渠改築工事 (明大寺町地内)																																		下水施設課 /小原建設(株)	

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・松尾JVからのお知らせ ■工事名:籠田公園整備工事
■請負金額: 365,040,000円 ■工期:平成30年6月26日～平成31年7月26日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事
本工事は公園のリニューアルを行います。
今月も引き続き東屋の鉄骨工事、公園北側の築山工事を行っていきます。
ゴールデンウィーク中は特定建設作業に該当しない作業を行います。
工事中皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名:籠田公園トイレ・ステージ等新築工事
■請負金額: 117,828,000円 ■工期:平成30年9月6日～平成31年6月7日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:トイレ新築 120.6㎡、ステージ新築 90.16㎡、スタジオ新築 3基
本工事は籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。
埋設物による設計変更に伴い、工期延長となりました。
今月は、トイレ・ステージの仕上工事、スタジオ(パーゴラ)の設置を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力お願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
[工事完了]
皆様のご理解とご協力がありまして無事工事を完了することが出来ました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。

(有)今井水道設備 からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
[工事完了]
工事期間中は大変ご不便をおかけしました。
皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了する事が出来ました。
誠に、ありがとうございました。

セイコー建設(有)からのお知らせ ■工事名:配水管布設工事(耐震管3工区)
■請負金額: 31,536,000円 ■工期:平成31年1月23日～平成31年8月30日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ400DIP-E(GX) L=51.2m、φ250DIP-E(GX) L=58.1m
4月の工事予定は桜まつり明けの13日より人道橋(桜城橋)左岸側の堤防部分での
幅員減少規制を予定しています。工事中はご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。

河合設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 18,457,200円 ■工期:平成31年1月11日～平成31年7月31日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
■工事概要:φ150DIP-E(GX) L=99.0m、φ100DIP-E(GX) L=16.8m
4月の工事予定は、仮設配水管への切替え作業を行った後、布設替工事へと移っていく予定です。
工事中は歩道幅員減少となりますのでご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事
[工事完了]
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事
[工事完了]
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・松尾JVからのお知らせ ■工事名:籠田公園整備工事
■請負金額: 365,040,000円 ■工期:平成30年6月26日～平成31年7月26日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:公園工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事
本工事は公園のリニューアルを行います。
今月も引き続き東屋の鉄骨工事、公園北側の築山工事を行っていきます。
ゴールデンウィーク中は特定建設作業に該当しない作業を行います。
工事中皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名:籠田公園トイレ・ステージ等新築工事
■請負金額: 117,828,000円 ■工期:平成30年9月6日～平成31年6月7日
■作業時間:原則8時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:トイレ新築 120.6㎡、ステージ新築 90.16㎡、スタジオ新築 3基
本工事は籠田公園内にトイレ・ステージ・スタジオの新築工事を行います。
埋設物による設計変更に伴い、工期延長となりました。
今月は、トイレ・ステージの仕上工事、スタジオ(パーゴラ)の設置を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力お願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
皆様のご理解とご協力がありまして無事工事を完了することが出来ました。
この場をお借りしましてお礼申し上げます。

(有)今井水道設備 からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
【工事完了】
工事期間中は大変ご不便をおかけしました。
皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了する事が出来ました。
誠に、ありがとうございました。

セイコー建設(有) からのお知らせ ■工事名:配水管布設工事(耐震管3工区)
■請負金額: 31,536,000円 ■工期:平成31年1月23日～平成31年8月30日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:φ400DIP-E(GX) L=51.2m、φ250DIP-E(GX) L=58.1m
4月の工事予定は桜まつり明けの13日より人道橋(桜城橋)左岸側の堤防部分での
幅員減少規制を予定しています。工事中はご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。

河合設備(株)からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
■請負金額: 18,457,200円 ■工期:平成31年1月11日～平成31年7月31日
■作業時間:原則9時～17時まで(作業状況により時間延長をすることがあります。)
■工事概要:φ150DIP-E(GX) L=99.0m、φ100DIP-E(GX) L=16.8m
4月の工事予定は、仮設配水管への切替え作業を行った後、布設替工事へと移っていく予定です。
工事中は歩道幅員減少となりますのでご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事
【工事完了】
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:下水道管渠改築工事
【工事完了】
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

工事ニュース			乙川リバーフロント地区整備事業																															この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。	平成31年4月号 3 / 5	
			乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年4月)																																	
工事名	工事種類	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事担当部署/施工者			
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
東岡崎駅前広場整備工事	敷地造成工		掘削	残土搬出	不陸整正																												拠点整備課 /朝日工業(株)			
	広場整備工									車道舗装工																										
	付帯工																		路側防護柵設置																	
	準備工																							片付け												
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	準備工		準備工																														拠点整備課 /朝日・大伸JV			
	鋼橋上部工																							桁架設工、吊足場工												
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その2)	足場工																			鋼床版溶接 ボルト本締め 現場塗装													拠点整備課 /小原・松尾JV			
	鋼橋上部工		鋼床版溶接							鋼床版溶接																現場塗装										
	橋梁付属物工																			支承																
	上屋工・高欄工																									足場組立										
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その3)	鋼橋上部工																			吊足場解体													拠点整備課 /加藤・岡崎JV			
	上屋工・高欄工																			高欄工																
	橋梁付属物工		地覆工																																	
	橋脚工 (P9・P10・P11)																								根巻コンクリート工											
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その4)	準備工																																拠点整備課 /小原建設(株)			
交通信号機等 移設工事																																	拠点整備課 /名鉄EIエンジニア(株)			
市道上明大寺3号線 ほか1路線道路改良 工事																																	拠点整備課 /小原建設(株)			
東岡崎駅周辺 地区整備北東街区 有効活用事業	北店舗棟									内外装工事										内外装、外構工事													拠点整備課 /スターツCAM(株)			
	ホテル棟																			内外装工事																
	駐車場棟																			内外装、外構工事																
	南店舗棟																			内外装工事																
																																	3月末 工事進捗率 実績 72.0 % 予定 72.0 %			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日工業(株)からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅前広場整備工事
■ 請負金額: 62,424,000円 ■ 工期: 平成30年9月7日 ~ 平成31年4月26日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■ 工事概要: 舗装工2,775㎡、側溝工120m、地盤改良工707㎡
ペDESTリアンデッキ(駅前通路)下の広場整備を行います。
4月は、敷地造成工、広場整備工、付帯工を行います。工期を延長しました。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

朝日・大伸JV からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
■ 請負金額: 565,920,000円 ■ 工期: 平成29年6月27日 ~ 平成31年10月31日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■ 工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡
ペDESTリアンデッキ(駅前通路)を築造します。
4月は、準備工、桁架設作業を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

小原・松尾JV からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その2)
■ 請負金額: 462,996,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日 ~ 平成31年12月27日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■ 工事概要: 橋脚工 N=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡
高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡
ペDESTリアンデッキ(中央デッキ)を築造します。
4月は、鋼桁・鋼床版の溶接、ボルトの本締め、現場塗装を行います。
ゴールデンウィーク中にも作業を行います。騒音・振動の少ない作業の予定です。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めますので、ご理解とご協力をお願い致します。

加藤・岡崎JV からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その3)
■ 請負金額: 336,960,000円 ■ 工期: 平成29年12月25日 ~ 平成31年12月27日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■ 工事概要: 橋脚工 N=3基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡
高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡
ペDESTリアンデッキ(北東街区通路)を築造します
4月は、高欄工・橋梁付属物工(地覆工)・鋼橋上部工(吊足場解体)・橋脚工(根巻コンクリート)を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(株)小原建設からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その4)
■ 請負金額: 282,960,000円 ■ 工期: 平成30年12月26日 ~ 平成31年12月27日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)
■ 工事概要: エレベーター1基、エスカレーター2基、電気整備工事1式、機械設備工事1式、階段工1式
ペDESTリアンデッキのEV・ESC・照明施設を築造します。
4月は準備工を行います。
工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

名鉄EIエンジニア(株)からのお知らせ ■ 工事名: 交通信号機等移設工事
[工事完了]
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

小原建設(株)からのお知らせ ■ 工事名: 市道上明大寺3号線ほか1路線道路改良工事
[工事完了]
工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。
皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。
工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

スターツCAM(株)からのお知らせ ■ 工事名: 東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業
■ 工期: 平成30年4月10日 ~ 平成31年7月31日
■ 作業時間: 原則8時 ~ 18時まで(作業状況により時間を延長をすることがあります。)
■ 工事概要: ホテル棟 S造9階建て、北店舗棟 S造3階建て、南店舗棟 S造3階建て、駐車場棟 S造5層6段
本工事は東岡崎駅前にホテル、商業施設を建設する工事を行っています。4月より外部足場解体、
外構工事開始を予定しています。
工事中は皆様にご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成31年4月号 5/5

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成31年4月)

岡崎市からのお知らせ

■橋の名称と通りの愛称が決定しました！

(仮称)乙川人道橋の名称が「桜城橋(サクラノシロバシ)」に、
籠田公園から(仮称)乙川人道橋までの愛称が「天下の道(テンカノミチ)」に決定しました。「橋の名称」4,004件、「通りの愛称」3,834件の応募の中から投票候補を各5点に絞り行われた投票は、各7,500票あまりのご投票を頂きました。たくさんのご投票ありがとうございました。

さて、乙川周辺では桜城橋の選定理由ともなった、桜が見頃を迎えています。桜城橋は来年度完成に向けて工事中ですが、お花見の際には桜城橋と桜、岡崎城が一望できるような映えるスポットを先取りして探してみたいはいかがでしょうか。

今月の関連行事

- ・桜まつり3月27日～4月12日
桜の開花状況により、期間を変更する場合があります
- ・家康行列4月7日
- ・五万石藤まつり4月20日～5月6日

連絡先

■岡崎市担当：

- ・乙川リバーフロント推進課 技術係
【人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝、籠田公園、仮設道路】
山本、宮地、山崎 TEL:0564-23-6982
- ・水道工事課
北部方面係 前森 TEL:0564-23-6482【配水管布設替、人道橋】
南部方面係 永井、柴田 TEL:0564-23-6367【配水管布設替】
- ・拠点整備課
技術係 野村、井上、大高 TEL:0564-23-6607
【ベデストリアンデッキ、交通信号機、道路改良、駅前広場】
総務企画係 富田、後藤 TEL:0564-23-6452【北東街区有効活用事業】
- ・下水施設課 【下水道管渠】
管渠対策係 古川、籠田 TEL:0564-23-6730
管理係 永田、早川 TEL:0564-23-6297
- ・道路維持課
南東部係 新川 TEL:0564-23-6233【プロムナード】
- ・道路建設課
工事係 大澤、和出 TEL:0564-23-6743【プロムナード】
橋りょう保全係 浅井 TEL:0564-23-6230【吹矢橋】
- ・建築課 計画係【籠田公園】
大橋 TEL:0564-23-6321

■愛知県担当：

- ・西三河建設事務所道路整備課 【橋梁補修工事(明代橋)】
石川 TEL:0564-27-2756
- ・西三河建設事務所河川港湾整備課 【階段・坂路工事】
太田、中田 TEL:0564-27-2752

■施工者：

【人道橋】

- | | | | |
|--------|-----------|----|------------------|
| ・上部工事 | 小原・朝日JV | 安藤 | TEL:0564-51-2623 |
| ・配水管添架 | フジ興業(株) | 西田 | TEL:0564-25-0417 |
| ・木装化工事 | 小原木材(株) | 大山 | TEL:0564-51-4556 |
| ・照明工事 | 第一電力建設(株) | 木村 | TEL:0564-21-3078 |

【乙川河川緑地】

- | | | | | |
|------|---------|----|------------------|--------|
| ・その1 | (株)加藤組 | 西尾 | TEL:0564-45-2013 | 【工事完了】 |
| ・その2 | 成瀬建設(株) | 深田 | TEL:0564-46-2050 | 【工事完了】 |

【籠田公園】

- | | | | |
|----------------|---------|----|------------------|
| ・整備工事 | 朝日・松尾JV | 小出 | TEL:0564-51-3657 |
| ・トイレ・ステージ等新築工事 | 杉林建設(株) | 宮城 | TEL:0564-22-5215 |

【乙川プロムナード整備工事】


- | | | | | |
|--------|-----------|----|------------------|--------|
| ・左岸 | 松尾建設(株) | 宇野 | TEL:0564-21-0305 | 【工事完了】 |
| ・右岸 | 浅井土木建設(株) | 浅井 | TEL:0564-51-0308 | 【工事完了】 |
| ・右岸その2 | (株)山口土木 | 島崎 | TEL:0564-65-6570 | 【工事完了】 |

【吹矢橋】

- | | | |
|----------|----|------------------|
| ・朝日工業(株) | 牧野 | TEL:0564-51-3655 |
|----------|----|------------------|

【橋梁補修工事(明代橋)】

- | | | |
|----------|----|------------------|
| ・小原建設(株) | 神原 | TEL:0564-51-2623 |
|----------|----|------------------|

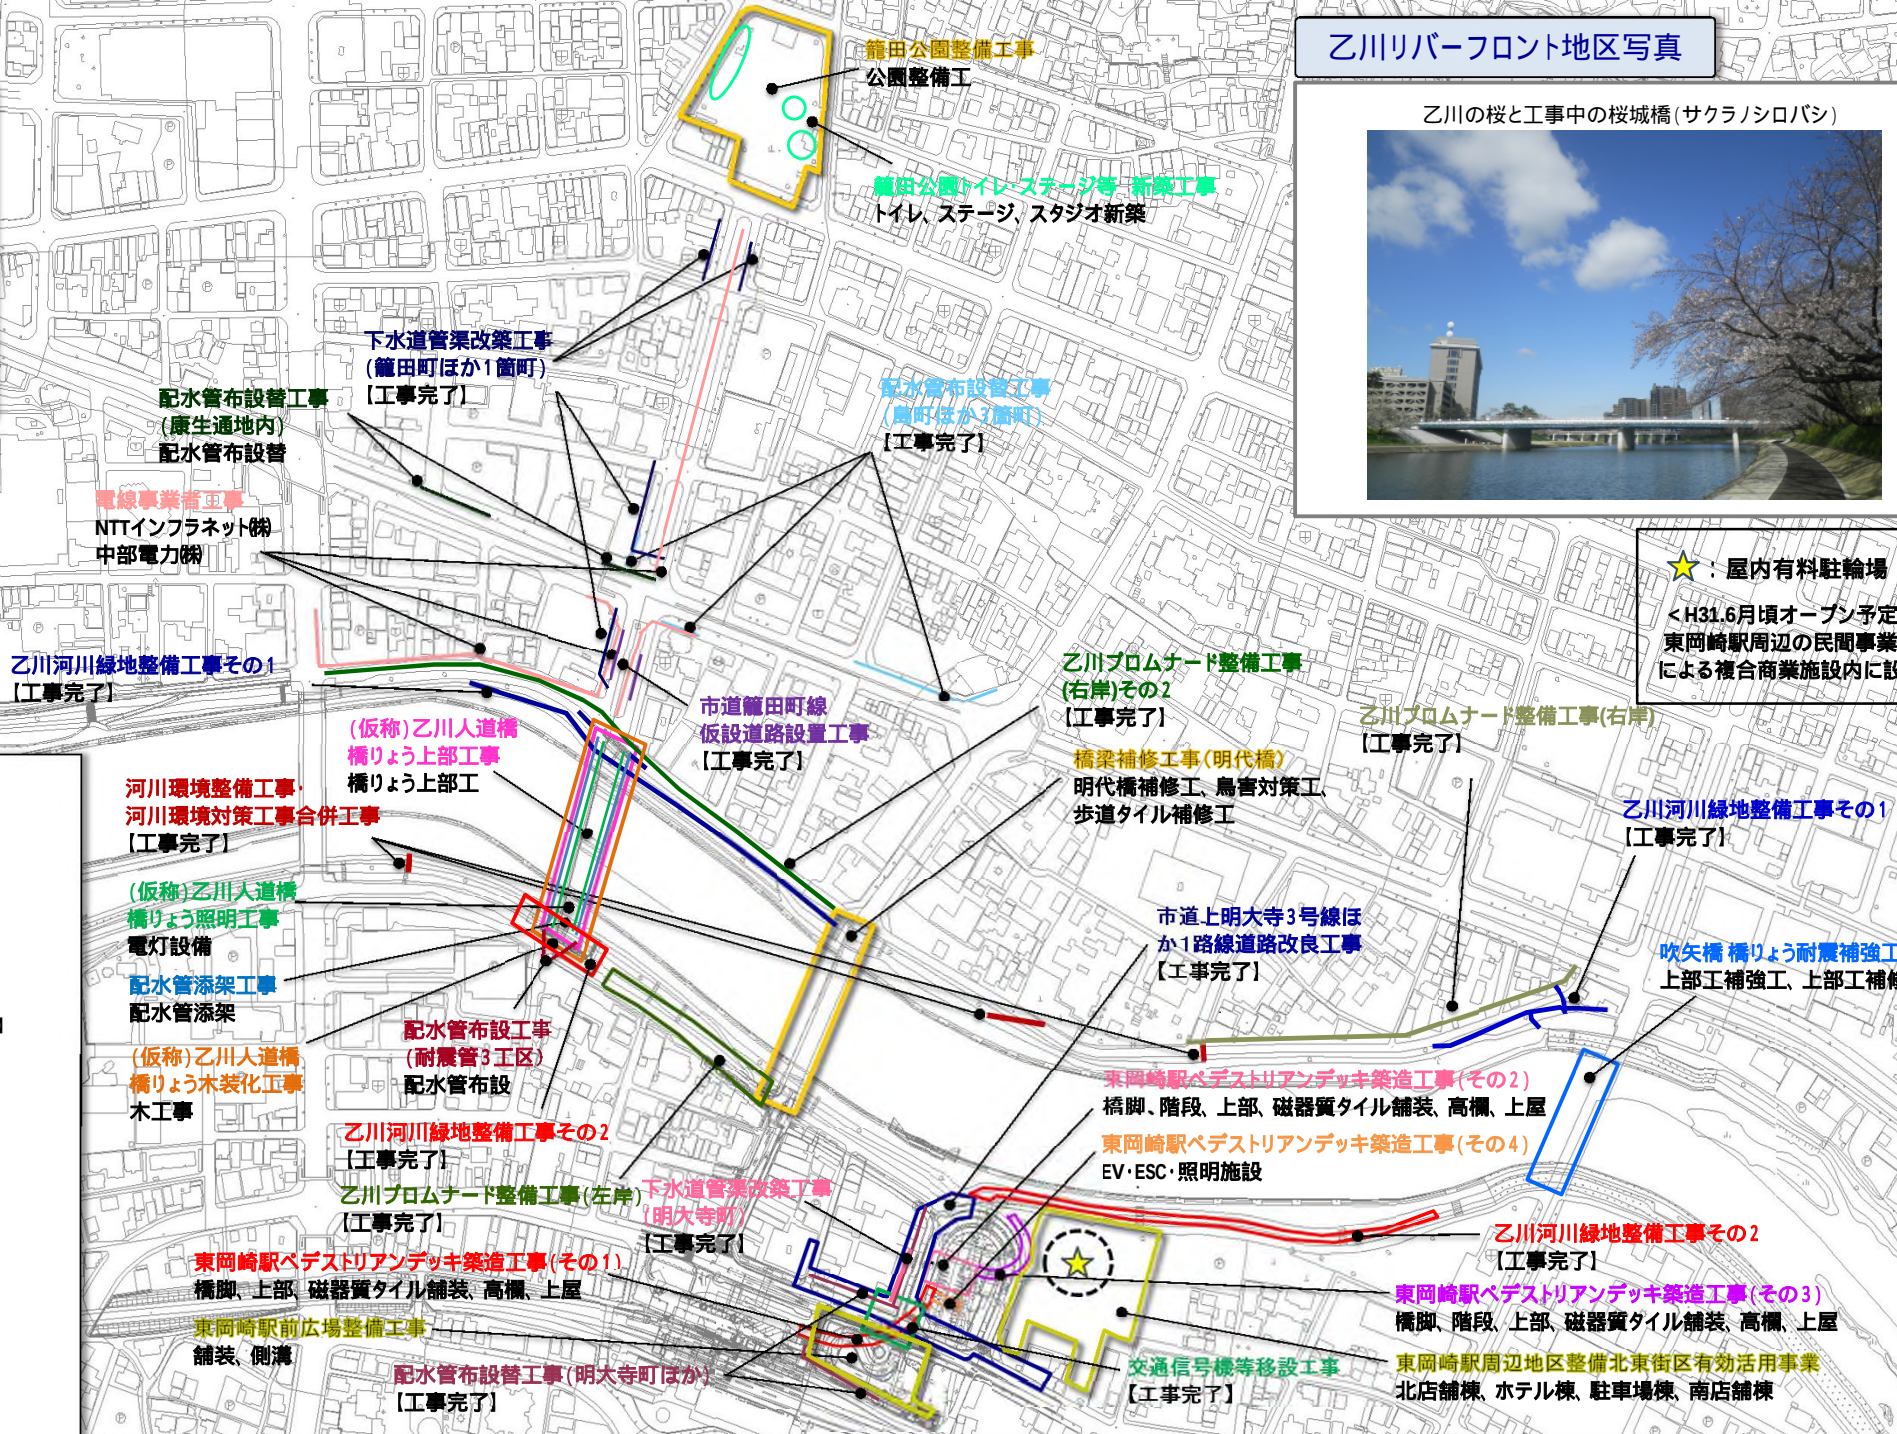

乙川リバーフロント地区写真

乙川の桜と工事中の桜城橋(サクラノシロバシ)



★：屋内有料駐車場

<H31.6月頃オープン予定>
東岡崎駅周辺の民間事業者
による複合商業施設内に設置

- 【河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事】
- | | | | |
|----------|----|------------------|--------|
| ・成瀬建設(株) | 福尾 | TEL:0564-46-2050 | 【工事完了】 |
|----------|----|------------------|--------|

【ベデストリアンデッキ】

- | | | | |
|------|---------|----|------------------|
| ・その1 | 朝日・大伸JV | 鈴木 | TEL:0564-51-3655 |
| ・その2 | 小原・松尾JV | 磯谷 | TEL:0564-51-2623 |
| ・その3 | 加藤・岡崎JV | 青井 | TEL:0564-45-2013 |
| ・その4 | 小原建設(株) | 柴田 | TEL:0564-51-2622 |

【駅前広場】

- | | | |
|----------|----|------------------|
| ・朝日工業(株) | 宮本 | TEL:0564-51-3655 |
|----------|----|------------------|

【道路改良工事】

- | | | | | |
|---------------|---------|----|------------------|--------|
| ・市道上明大寺3号線ほか1 | 小原建設(株) | 田邊 | TEL:0564-51-2623 | 【工事完了】 |
|---------------|---------|----|------------------|--------|

【交通信号機等移設工事】

- | | | | |
|---------------|----|------------------|--------|
| ・名鉄E1エンジニア(株) | 砂場 | TEL:0564-33-0246 | 【工事完了】 |
|---------------|----|------------------|--------|

【東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業】

- | | | |
|---------------|-------|------------------|
| ・スタートC A M(株) | 村山・金子 | TEL:0564-65-5136 |
|---------------|-------|------------------|

【仮設道路】

- | | | | |
|----------|----|------------------|--------|
| ・(株)山口土木 | 島崎 | TEL:0564-65-6570 | 【工事完了】 |
|----------|----|------------------|--------|

【配水管布設替】

- | | | | | |
|---------|-----------|----|------------------|--------|
| ・島町ほか | 石田設備(株) | 米田 | TEL:0564-24-0139 | 【工事完了】 |
| ・康生通 | (株)河合設備 | 河合 | TEL:0564-24-8533 | |
| ・明大寺町ほか | (有)今井水道設備 | 今井 | TEL:0564-21-4820 | 【工事完了】 |
| ・耐震管3工区 | セイコー建設(有) | 鈴木 | TEL:0564-25-2559 | |

【下水道管渠】

- | | | | | |
|---------|---------|----|------------------|--------|
| ・籠田町ほか1 | (株)山口土木 | 山本 | TEL:0564-65-6570 | 【工事完了】 |
| ・明大寺町 | 小原建設(株) | 田邊 | TEL:0564-51-2623 | 【工事完了】 |

【電線事業者工事(NTTインフラネット㈱) 担当 太高 TEL:052-746-6814】

- | | | |
|-----------|----|------------------|
| ・N D S(株) | 近藤 | TEL:0564-55-2020 |
|-----------|----|------------------|

【電線事業者工事(中部電力㈱) 担当 原 TEL:0564-55-5070】

- | | | |
|----------|----|------------------------------|
| ・㈱トーエネック | 林 | TEL:0564-23-3220 (管路工事・舗装工事) |
| ・ | 田中 | TEL:0564-51-0800 (電柱工事) |
| ・ | 鈴木 | TEL:0564-51-0800 (電線移替え) |
