

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年5月号 1/2

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年5月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者	
		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
		曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その1	P3橋脚工 作業土工																																	乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV 4月末 工事進捗率 実績 97.5% 当初予定 96.6%
	護岸復旧工 階段護岸、護床工																																	
	構造物復旧 舗装復旧																																	
	仮設工2 P3仮締切撤去																																	
	仮設工2 仮設道路撤去																																	
	仮設工2 汚濁防止工撤去																																	
	準備工片付け																																	
河川環境整備工事 (交付金)	準備工																																愛知県・河川港湾整備課 /成瀬建設(株) 4月末 工事進捗率 実績 10 % 当初予定 10 %	
	土工																																	
	法面工																																	
	舗装工																																	
	後片付け																																	
乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事	準備工																																乙川リバーフロント推進課 /岩附造園(株) 4月末 工事進捗率 実績 2.6 % 当初予定 2.6 %	
	撤去工																																	
	雨水排水・ 電気設備工																																	
	給水設備・ 取付管工																																	
乙川河川緑地 (吹矢橋公園) トイレ新築工事	トイレユニット工事																																乙川リバーフロント推進課 /杉林建設(株) 4月末 工事進捗率 実績 7 % 当初予定 7 %	
岡崎警察署明大寺 交番曳家工事	準備工																																建築課 /小原建設(株) 4月末 工事進捗率 実績 2 % 当初予定 2 %	
	仮設工																																	
	外構工																																	
	電気設備工																																	
	給排水・ガ ス設備工																																	
	既設構造物撤去 工																																	
	曳家工事																																	
配水管布設替工事	管布設工																																水道工事課 /(株)朝倉設備 4月末 工事進捗率 実績 13.5 % 当初予定 13.5 %	
	舗装工・区画線工																																	
乙川河川緑地 坂路舗装工事	準備工																															乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株) 4月末 工事進捗率 実績 13.5 % 当初予定 13.5 %		
	舗装工																																	
	後片付け																																	

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その1
 ■請負金額:679,490,000円 ■工期:平成27年10月2日~平成29年7月31日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要:RC橋脚工 N=2基、橋台工 N=1基、法覆護岸工 一式、仮設工 一式
 ◎P2橋脚工、P3橋脚工の躯体コンクリートが完成し、仮橋の撤去も完了しました。
 5月は、シルトファン・沈砂槽、P3橋脚の残っている鋼矢板の撤去および、P3橋脚周囲の階段護岸復旧、舗装復旧や殿橋上下流仮設道路の撤去を行い、5月中旬に河川内の工事を終了します。
 工事中は近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変、ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力の程、お願いいたします。

成瀬建設株式会社からのお知らせ ■工事名:河川環境整備工事(交付金)
 ■請負金額:9,428,400円 ■工期:平成29年4月7日~平成29年8月14日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要:坂路工 N=1箇所、階段手すり設置工 N=一式
 ◎5月8日から本格的に現場作業を始めます。支障木の伐採をし、土を現場に入れ盛土作業をおこない坂路を作り上げます。それに伴い、工事車両の出入り、重機作業がある為、近隣の皆様方にご迷惑をおかけすることお詫びいたします。工事現場には危険が多いので安全には十分注意して工事を進めて参りますが皆様方におかれましてもご注意くださいようご理解ご協力お願い申し上げます。


岩附造園(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事
 ■請負金額:96,876,000円 ■工期:平成29年3月6日~平成29年9月29日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要:公園舗装工A=661m²、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式
 ◎5月8日より保安設備を設置し、本格的に工事に着手します。公園外周はバリケードで囲い立入禁止として撤去等の作業を行います。
 工事車両の出入りが多くなり皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地(吹矢橋公園)トイレ新築工事
 ■請負金額:17,388,000円 ■工期:平成29年3月6日~平成29年9月29日
 ■作業時間:原則8時~17時まで
 ■工事概要:公園トイレ新築工 一式
 ◎この工事は、吹矢橋公園へトイレ新築を行います。トイレユニットの工場製作を進めます。
 工事中は皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事
 ■請負金額:29,484,000円 ■工期:平成29年3月27日~平成29年12月15日
 ■作業時間:原則8時~17時まで
 ■工事概要:交番曳家一式
 ◎この工事は名鉄東岡崎駅横の明大寺交番(RC造3階)を70m程東へ移動させる工事をを行います。
 5月より仮囲い設置工事、フェンス等の外構撤去工事を進めていき、下旬より建物周りの掘削を行っていきます。
 工事中は皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

(株)朝倉設備からのお知らせ ■工事名:配水管布設替工事
 ■請負金額:6,426,000円 ■工期:平成28年10月7日~平成29年5月31日
 ■作業時間:原則9時~17時まで
 ■工事概要:φ100水道管布設L=88.5m
 ◎この工事は配水管布設替工事をを行います。
 5月上旬から管布設工の作業開始を予定しております。
 作業中は車道幅員減少・一部通行止めの規制があります。
 工事中は皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地坂路舗装工事
 ■請負金額:610,200円 ■工期:平成29年5月11日~平成29年6月12日
 ■作業時間:原則9時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要:アスファルト舗装工A=192m²
 ◎この工事は河川環境整備工事(交付金)に合わせて坂路の舗装工を行います。
 5月18日より現場作業を始めます。工事車両の出入り、重機作業がある為、近隣の皆様方にご迷惑をおかけすることお詫びいたします。
 工事期間中ご不便をおかけいたしますがご理解ご協力お願いいたします。

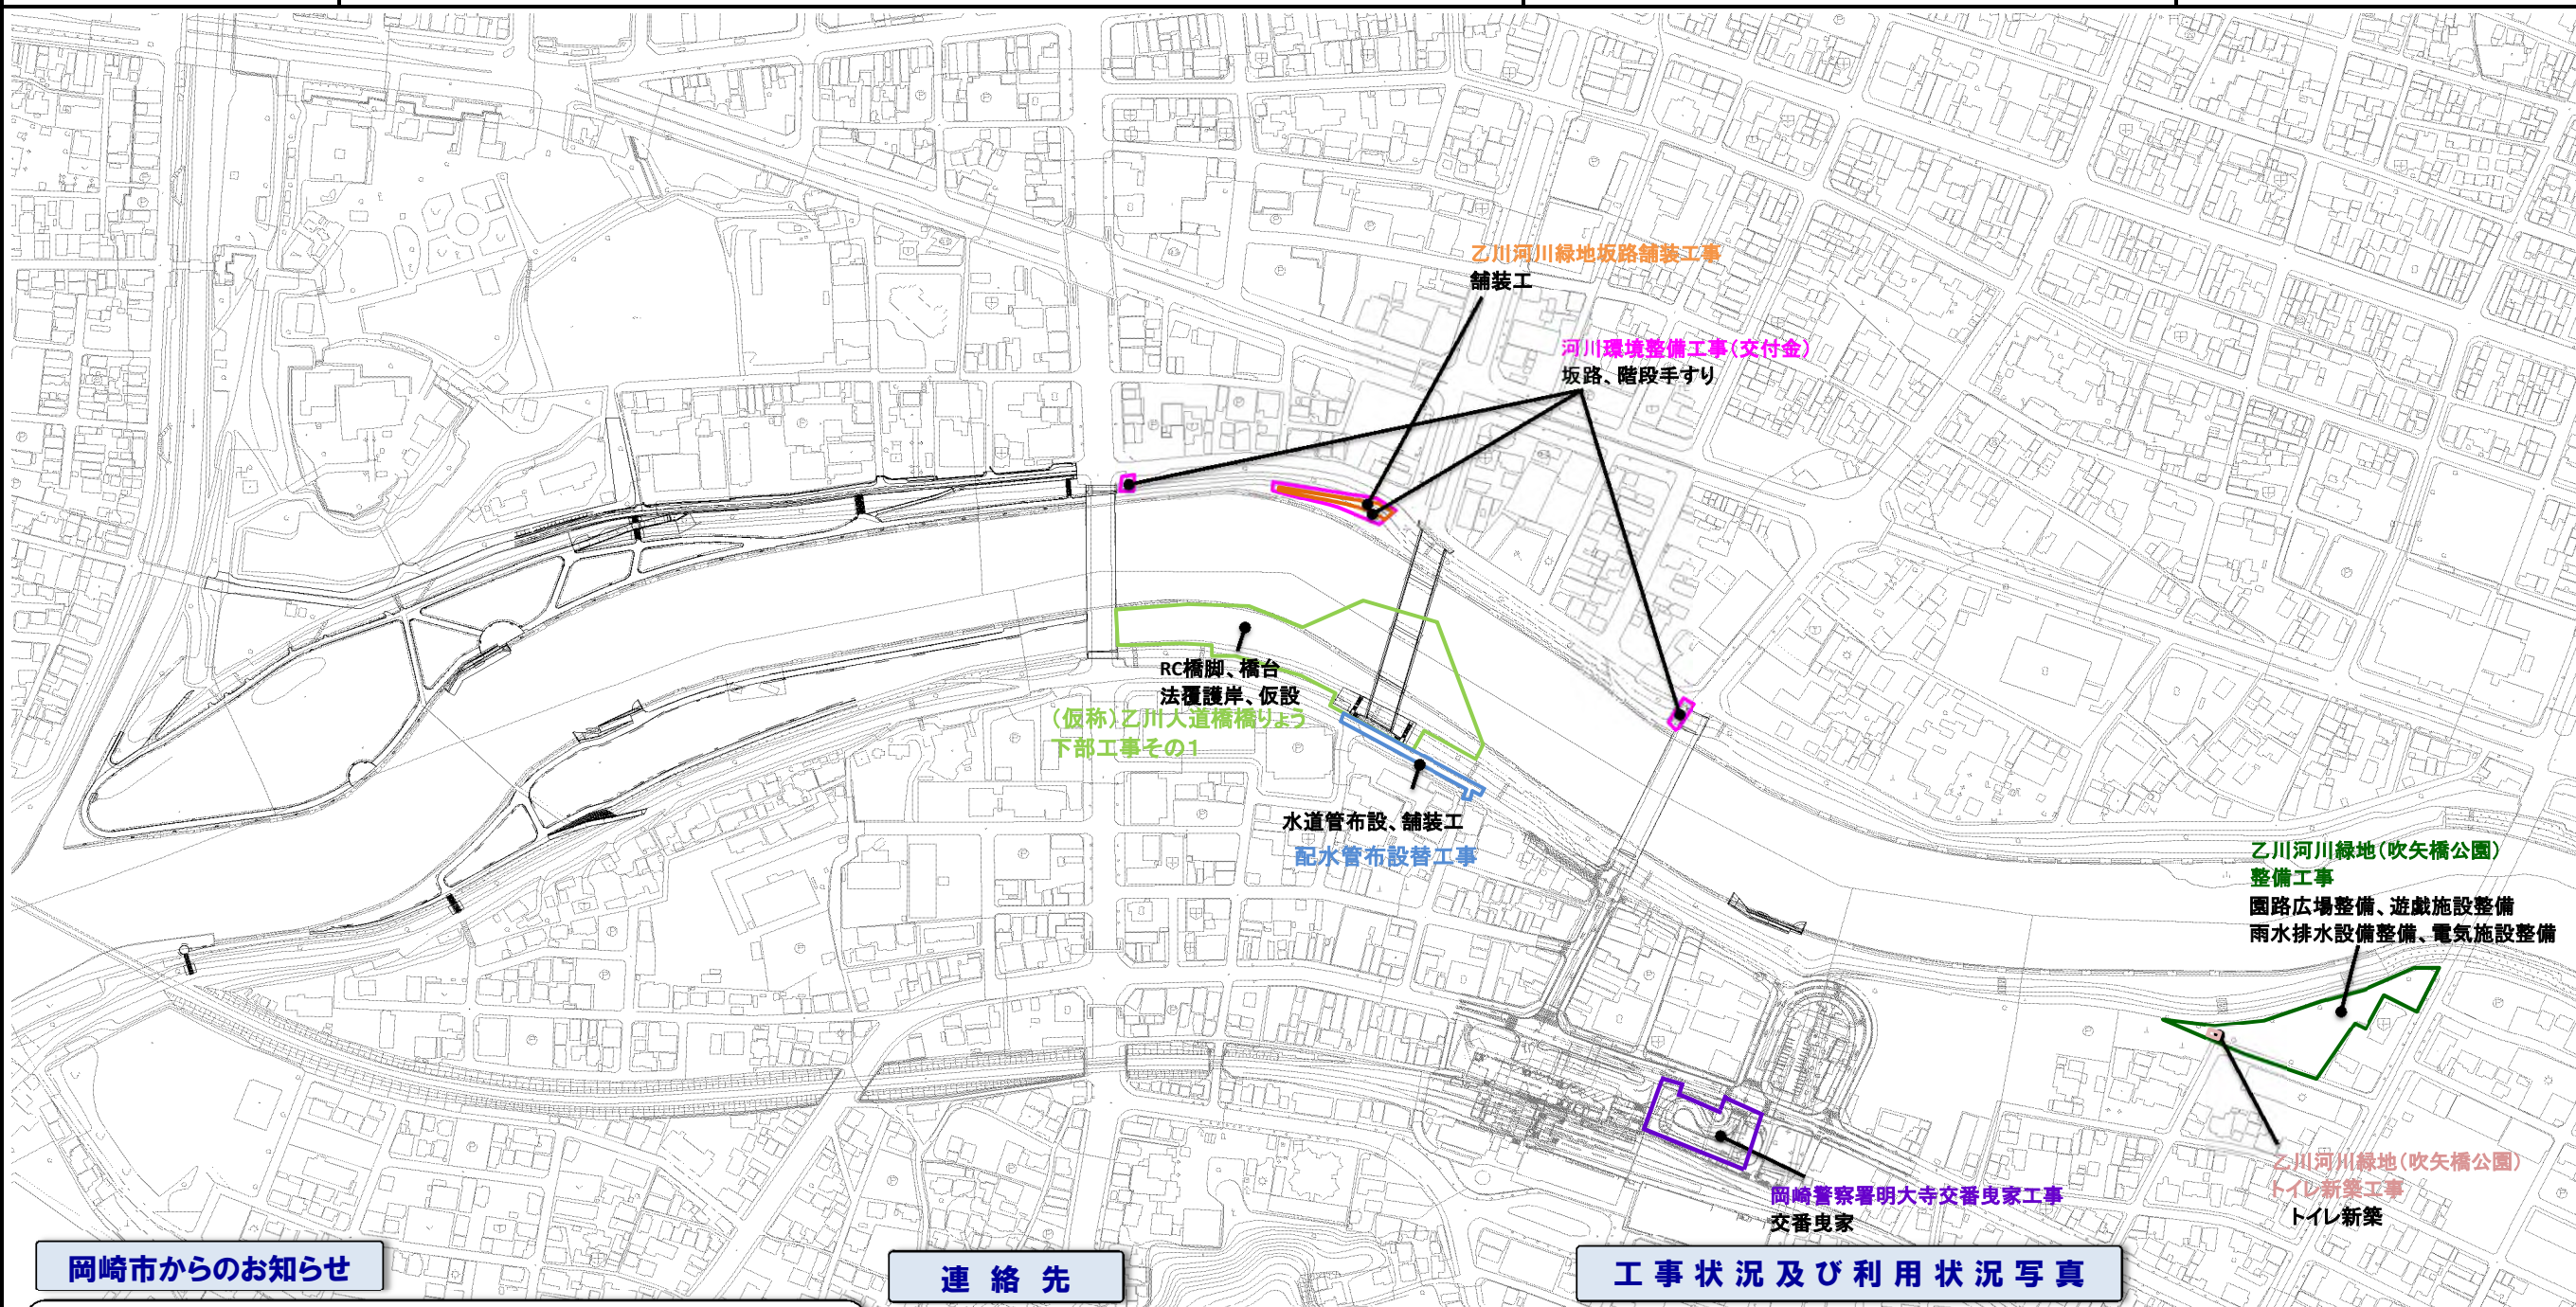

岡崎市からのお知らせ

■吹矢橋公園整備工事が本格的に始まります
 桜まつりで多くの市民や観光客の皆さままで賑わった乙川河川緑地もすっかり落ち着きを取り戻し、例年よりも遅めの桜も葉桜が目に見え鮮やかな季節となりました。河川内の工事においては出水期(梅雨や台風等による集中豪雨などが発生しやすい時期)を迎えるにあたって、5月末をもって一旦休止することになります。人道橋の工事も5月末に向けて撤収作業が進められており、11月からは対岸の下部工事に着手する予定です。
 ゴールデンウィーク明けには吹矢橋公園の利用を制限して再整備工事が始まります。ご不便をおかけしますが、新たな姿となる吹矢橋公園をご期待ください。
 5月も五万石藤まつりやこどもまつりなどまだまだイベントが盛りだくさんです。暖かくなり、日差しが気持ち良いこの季節に、乙川河川緑地でお散歩してみたいはいかがでしょうか。(紫外線対策は万全に！)

今月の関連行事

- ・五万石藤まつり 4月20日～5月5日
- ・第44回岡崎こどもまつり 5月4日
- ・チャンバラ合戦 5月28日

連絡先

- 岡崎市担当:**
- ・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、吹矢橋公園】
中田、山本、山崎、大野 TEL: 0564-23-6982
 - ・建築課 計画係【交番】
中村、鈴木 TEL: 0564-23-6465
 - ・水道工事課 計画係【水道】
高橋 TEL: 0564-23-6342
- 愛知県担当:**
- ・西三河建設事務所河川港湾整備課【乙川河川緑地】
太田、富田 TEL: 0564-27-2752
- 施工者:**
- 【(仮称)乙川人道橋】
・朝日・小原JV 牧野 TEL: 0564-64-7023 (現場事務所)
 - 【吹矢橋公園】
・岩附造園(株) 三浦 TEL: 0564-31-0171
・杉林建設(株) 辻 TEL: 0564-22-5215
 - 【乙川河川緑地】
・成瀬建設(株) 深田 TEL: 0564-46-2050
 - 【交番】
・小原建設(株) 岡田 TEL: 0564-51-2623
 - 【水道】
・(株)朝倉設備 朝倉 TEL: 0564-51-4891

工事状況及び利用状況写真

