

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年6月)

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年6月号 1/2

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者								
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30							
(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事 その1	片付け																																						乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV 5月末 工事進捗率 実績 98.9% 当初予定 99.2%	
	手すり設置工																																							愛知県・河川港湾整備課 /成瀬建設株 5月末 工事進捗率 実績 48.5 % 当初予定 48.5 %
	転落防止柵設置工																																							
	後片付け																																							
河川環境整備工事 (交付金)	雨水排水設備工																																						乙川リバーフロント推進課 /岩附造園(株) 5月末 工事進捗率 実績 12.5 % 当初予定 13.5 %	
	電気設備工																																							
	遊戯施設整備工																																							
	サービス施設整備工																																							
	建築施設組立設置工																																							
乙川河川緑地 (吹矢橋公園) トイレ新築工事	トイレユニット工事																																					乙川リバーフロント推進課 /杉林建設(株) 5月末 工事進捗率 実績 10 % 当初予定 10 %		
	トイレユニット工場製作																																							
岡崎警察署明大寺交番曳家工事	曳家工事(移設元)																																					建築課 /小原建設(株) 5月末 工事進捗率 実績 12.4 % 当初予定 12.4 %		
	曳家工事(移設先)																																							
配水管布設替工事																																						水道工事課 / (株)朝倉設備 【工事完了】 ◎工事期間中は通行規制等で皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。ご理解ご協力ありがとうございました。		
乙川河川緑地 坂路舗装工事																																						乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株) 【工事完了】 ◎この工事は河川環境整備工事(交付金)に合わせて坂路の舗装工事を行い先月完了しました。関係者一同、心より感謝するとともに、工事中皆様方にご迷惑をおかけしたとお詫びいたします。新しい坂路ができあがり河川緑地へのアクセスルートが増え、より便利になったとおもいますので是非、ご来園いただき、変わりゆく乙川の景色を見てお楽しみください。		

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その1
 ■請負金額: 679,490,000円 ■工期: 平成27年10月2日～平成29年7月31日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要: RC橋脚工 N=2基、橋台工 N=1基、法覆護岸工 一式、仮設工 一式
 ◎P2橋脚工、P3橋脚工、護岸復旧工、仮設工撤去工等の河川内工事が終了しました。
 河川敷の工事に利用した裸地部分に種子を散布したので、芽吹きまでの養生期間中はロープ柵で立入を制限させていただきます。6月中旬までに保安設備等の片付けを行い、現場作業を終了します。
 工事中は近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変、ご不便やご迷惑をおかけします。何卒、本工事にご理解とご協力の程、お願いいたします。

成瀬建設株式会社からのお知らせ ■工事名: 河川環境整備工事(交付金)
 ■請負金額: 9,428,400円 ■工期: 平成29年4月7日～平成29年8月14日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要: 坂路工 N=1箇所、階段手すり設置工 N=一式
 ◎6月は、階段に手すり転落防止柵を設置します。工事中、近隣の皆様方にご迷惑をおかけすることお詫びいたします。工事現場には危険が多いので安全には十分注意して工事を進めて参りますが皆様方におかれましてはご注意くださいますようお願い申し上げます

岩附造園(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事
 ■請負金額: 96,876,000円 ■工期: 平成29年3月6日～平成29年9月29日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要: 公園舗装工A=661m²、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式
 ◎撤去作業も一部を残しほぼ完了しました。今月は雨水排水設備を中心に電気・遊具等の基礎設置を行います。
 工事車両及び資材搬入、残土搬出と車両の出入りが多くなり皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地(吹矢橋公園)トイレ新築工事
 ■請負金額: 17,388,000円 ■工期: 平成29年3月6日～平成29年9月29日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで
 ■工事概要: 公園トイレ新築工 一式
 ◎この工事は、吹矢橋公園へトイレ新築を行います。トイレユニットの工場製作を進めます。
 工事中は皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。


小原建設(株)からのお知らせ ■工事名: 岡崎警察署明大寺交番曳家工事
 ■請負金額: 29,484,000円 ■工期: 平成29年3月27日～平成29年12月15日
 ■作業時間: 原則8時～17時まで
 ■工事概要: 交番曳家一式
 ◎交番の移設元の外構構造物撤去工事が終わりました。
 6月は交番の移設先・移設元にて掘削工事を開始致します。
 工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

(株)朝倉設備からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事
 【工事完了】
 ◎工事期間中は通行規制等で皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。ご理解ご協力ありがとうございました。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地坂路舗装工事
 【工事完了】
 ◎この工事は河川環境整備工事(交付金)に合わせて坂路の舗装工事を行い先月完了しました。関係者一同、心より感謝するとともに、工事中皆様方にご迷惑をおかけしたとお詫びいたします。新しい坂路ができあがり河川緑地へのアクセスルートが増え、より便利になったとおもいますので是非、ご来園いただき、変わりゆく乙川の景色を見てお楽しみください。

工事完了

工事完了

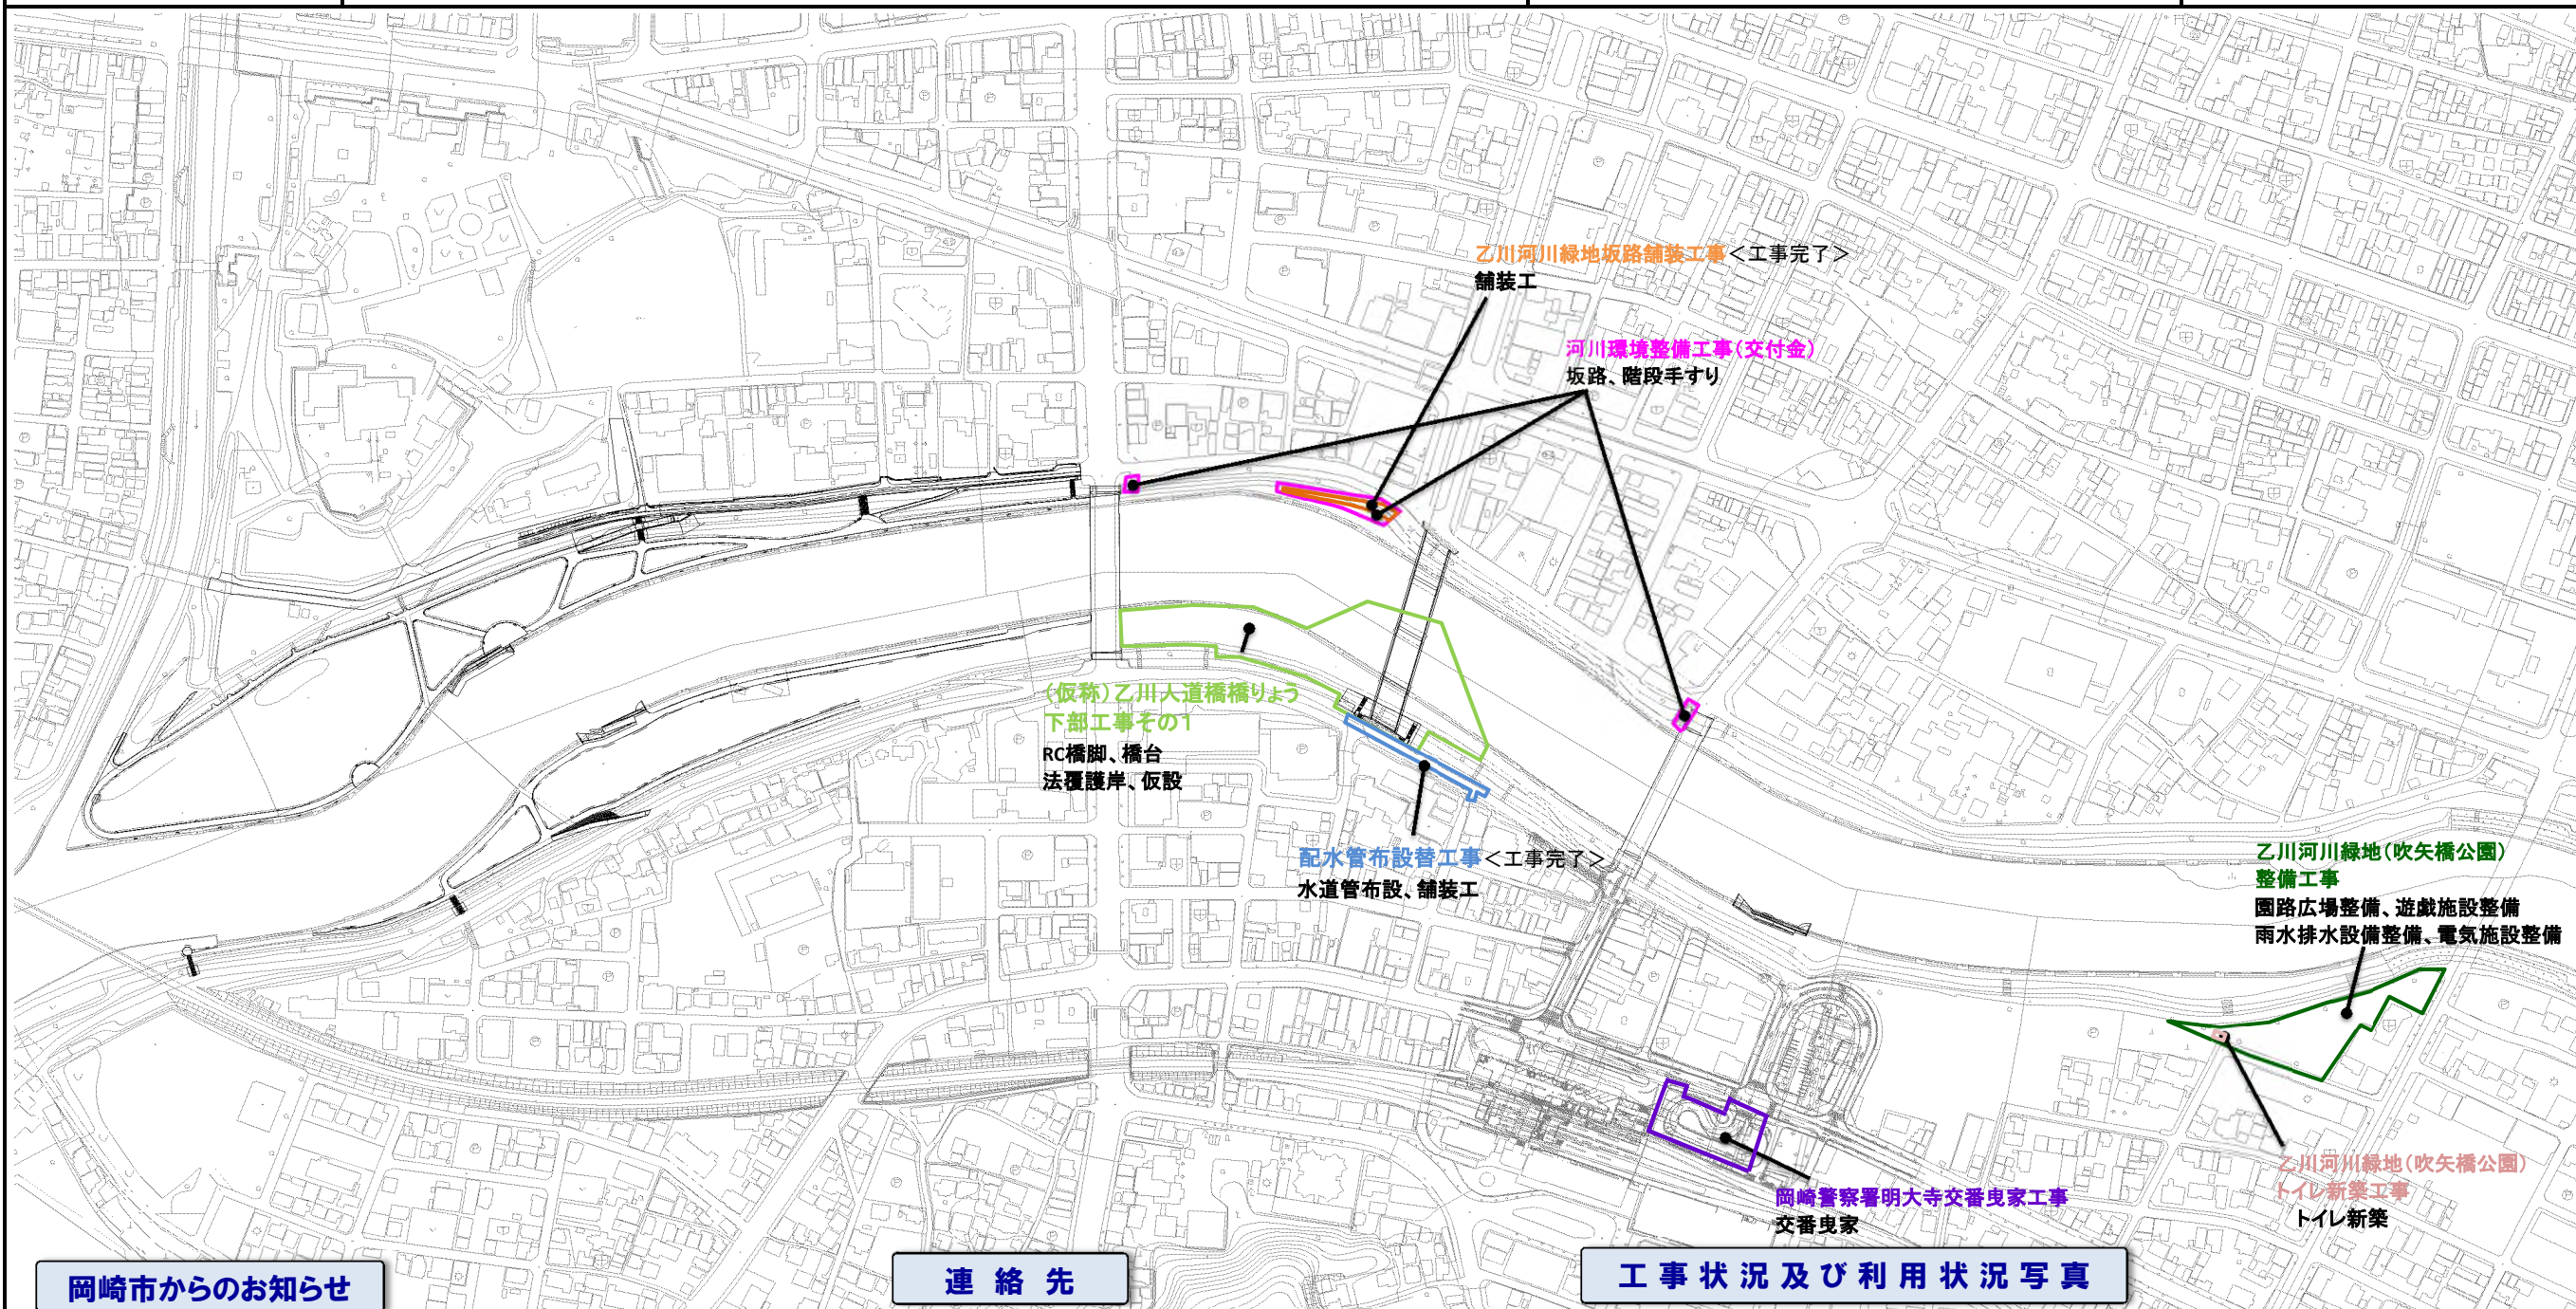

岡崎市からのお知らせ

■河川内の工事は一休み

出水期(梅雨や台風等による集中豪雨などが発生しやすい時期)を迎え、河川内の工事もひと段落。利用規制が解除された乙川河川緑地からは、(仮称)乙川人道橋の橋脚を間近でご覧いただくことができるようになりました。

また、5月より本格的に工事が始まった吹矢橋公園では、遊具や樹木が撤去され、元の姿が思い出せないほど様変わりした景色をご覧いただくことができます。

季節の変わり目ゆえ、気まぐれな気候がまだまだ続きますが、皆様におかれましても体調管理には十分お気をつけてお過ごしください。



今月の関連行事

特にありません

連絡先

- 岡崎市担当:
 - 乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、吹矢橋公園】 中田、山本、山崎、大野 TEL: 0564-23-6982
 - 建築課 計画係【交番】 中村、鈴木 TEL: 0564-23-6465
 - 水道工事課 計画係【水道】 高橋 TEL: 0564-23-6342<工事完了>
- 愛知県担当:
 - 西三河建設事務所河川港湾整備課 【乙川河川緑地】 太田、富田 TEL: 0564-27-2752
- 施工者:
 - 【(仮称)乙川人道橋】
 - 朝日・小原JV 牧野 TEL: 0564-64-7023 (現場事務所)
 - 【吹矢橋公園】
 - 岩附造園(株) 三浦 TEL: 0564-31-0171
 - 杉林建設(株) 辻 TEL: 0564-22-5215
 - 【乙川河川緑地】
 - 成瀬建設(株) 深田 TEL: 0564-46-2050
 - 【交番】
 - 小原建設(株) 岡田 TEL: 0564-51-2623
 - 【水道】
 - (株)朝倉設備 朝倉 TEL: 0564-51-4891<工事完了>

工事状況及び利用状況写真

(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事



乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事

