

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年7月号 1/2

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年7月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者			
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		
(仮称)乙川人道橋 橋りょう下部工事 その1																																			乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV 6月末 工事進捗率 実績 99.6% 予定 99.6%	
	河川環境整備工事 (交付金)	工事完了																															愛知県・河川港湾整備課 /成瀬建設(株)			
	乙川河川緑地(吹矢 橋公園)整備工事	雨水排水設備工																																		乙川リバーフロント推進課 /岩附造園(株) 6月末 工事進捗率 実績 19.3 % 予定 20.0 %
		電気設備工																																		
遊戯施設整備工																																				
サービス施設整備工																																				
建築施設組立設置工																																				
乙川河川緑地 (吹矢橋公園) トイレ新築工事	仮設工																																	乙川リバーフロント推進課 /杉林建設(株) 6月末 工事進捗率 実績 13 % 予定 13 %		
	仮設工事																																			
	基礎工事																																			
岡崎警察署明大寺 交番曳家工事	トイレユニット工事																																	建築課 /小原建設(株) 6月末 工事進捗率 実績 28.9 % 予定 28.9 %		
	曳家工事(移設元)																																			
東岡崎駅 ペDESTリアンデッキ 築造工事(その1)	掘削及び地盤改良 研り、ジャッキ設置																																	拠点整備課 /朝日・大伸JV 6月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %		
	ジャッキアップ																																			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その1
 ■請負金額:679,490,000円 ■工期:平成27年10月2日~平成29年7月31日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります)
 ■工事概要:RC橋脚工 N=2基、橋台工 N=1基、法覆護岸工 一式、仮設工 一式
 ◎6月中には後片付けも終了し、7月の工期内に完了検査を受けて工事完成になります。
 本工事の橋脚・橋台の外観は、一般的なコンクリートの無機質な外観ではなく、石積み模様の暖かみを感じられる外観になっています。河川緑地を散策された機会には、触れて感じて下さい。新しい乙川の風景の始まりです。新橋が架かり、市街地が結ばれてにぎわいのある街を想像してみてください。工事中は近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変、ご不便やご迷惑をお掛けしました。工事関係者一同、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。


成瀬建設株式会社からのお知らせ ■工事名:河川環境整備工事(交付金)
 ■請負金額:11,396,160円 ■工期:平成29年4月7日~平成29年8月14日(平成29年6月20日工事完了)
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります)
 ■工事概要:坂路工 N=1箇所、階段手すり設置工 N=一式
 ◎皆様方からお力添えいただきまして無事竣工することができました。工事関係者一同、心より感謝します。ありがとうございました。

岩附造園(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事
 ■請負金額:96,876,000円 ■工期:平成29年3月6日~平成29年9月29日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります)
 ■工事概要:公園舗装工A=661m²、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式
 ◎今月は雨水排水設備・電気設備・遊戯施設・サービス施設・建築施設等多岐にわたる種類の工事を行います。前月同様工事車両及び資材搬入、残土搬出と車両の出入りが多くなり皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地(吹矢橋公園)トイレ新築工事
 ■請負金額:17,388,000円 ■工期:平成29年3月6日~平成29年9月29日
 ■作業時間:原則8時~17時まで
 ■工事概要:公園トイレ新築工 一式
 ◎ユニットトイレを据付けける為の基礎工事に着手します。ユニットトイレは、7月中旬に完成予定です。工事中は皆様にご迷惑・ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

小原建設(株)からのお知らせ ■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事
 ■請負金額:29,484,000円 ■工期:平成29年3月27日~平成29年12月15日
 ■作業時間:原則8時~17時まで
 ■工事概要:交番曳家一式
 ◎移設先の基礎工事が終わり、移設元にて掘削及び基礎下の地盤改良の研りに着手しています。7月は引き続き掘削及び研りを行い、下旬よりジャッキアップの工程に進んでいきます。工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様には大変ご不便やご迷惑をお掛けしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

朝日・大伸JVからのお知らせ ■工事名:東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)
 ■請負金額:565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日~平成31年3月1日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
 ■工事概要:橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455m²、高欄工 L=183m、上屋工 A=292m²
 ◎東岡崎駅東改札口に繋がるペDESTリアンデッキ(自由通路)を築造します。工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

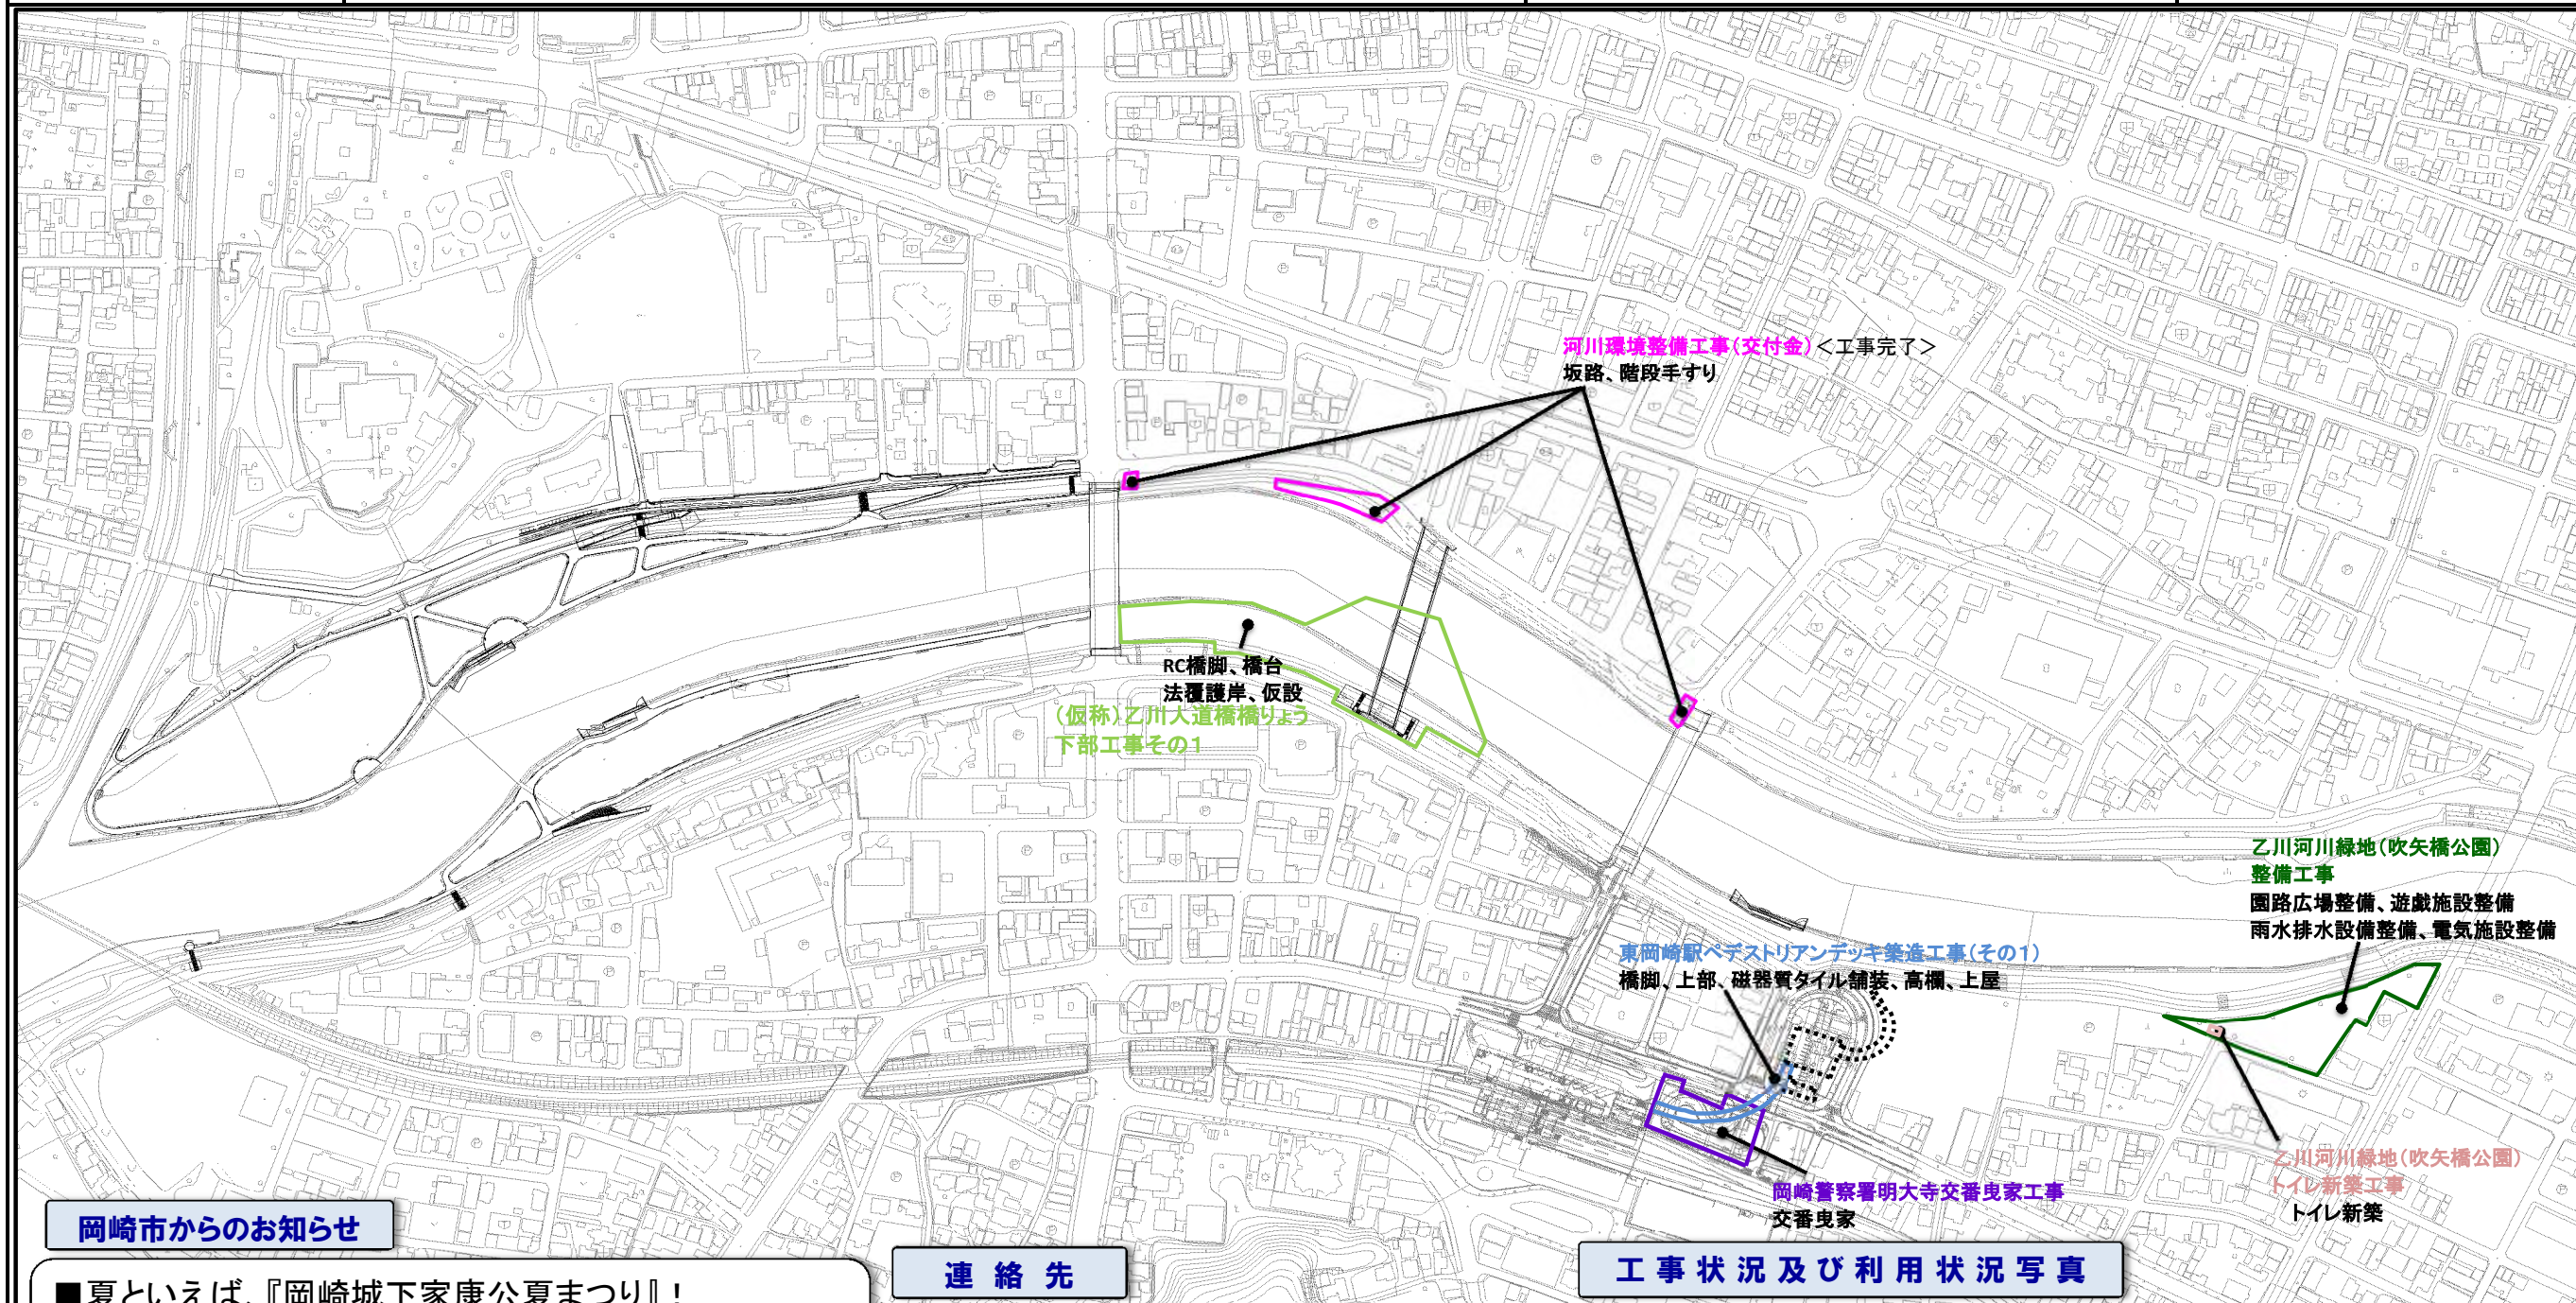

岡崎市からのお知らせ

■夏といえば、『岡崎城下家康公夏まつり』！
 夏が近づき、蒸し暑い日が多くなってまいりました。皆さま体調はいかがでしょう
 か？
 吹矢橋公園整備工事では、樹木や施設の撤去がほぼ終わり、現在は排水設備や
 電線管など、埋設物を施工しております。まだまだ完成した姿は想像できませんが、
 どんな公園になるのか、今から完成が待ち遠しく思います。
 さて、夏といえば、岡崎の一大イベントである『岡崎城下家康公夏まつり』が7月30
 日(日)より今年も開催されます！花火大会は8月5日(土)に開催予定となっており、
 乙川河川緑地右岸では栈敷の建設が始まりました。また、乙川河川緑地左岸では、
 仕掛け花火の準備に7月中旬より取りかかっています。
 一大イベントの準備で大忙しの乙川河川緑地は、来園者の皆さまの安全確保のため、
 立入禁止措置が取られている区間も多くあります。しばらくの間ご不便をおかけ
 しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

今月の関連行事

岡崎城下家康公夏まつり 7月30日、8月2日～6日
 おとがワ！ンダーランド 7月22日～

連絡先

- 岡崎市担当：
 ・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、吹矢橋公園】
 中田、山本、山崎、大野 TEL：0564-23-6982
 ・建築課 計画係【交番】
 中村、鈴木 TEL：0564-23-6465
 ・拠点整備課 技術係【ペDESTリアンデッキ】
 吉居、井上 TEL：0564-23-6607
- 愛知県担当：
 ・西三河建設事務所河川港湾整備課 【乙川河川緑地】
 太田、富田 TEL：0564-27-2752<工事完了>
- 施工者：
 【(仮称)乙川人道橋】
 ・朝日・小原JV 牧野 TEL：0564-64-7023 (現場事務所)
 【吹矢橋公園】
 ・岩附造園(株) 三浦 TEL：0564-31-0171
 ・杉林建設(株) 辻 TEL：0564-22-5215
 【乙川河川緑地】
 ・成瀬建設(株) 深田 TEL：0564-46-2050<工事完了>
 【交番】
 ・小原建設(株) 岡田 TEL：0564-51-2623
 【ペDESTリアンデッキ】
 ・朝日・大伸JV 鈴木 TEL：0564-51-3655

工事状況及び利用状況写真

