

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月前の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年10月号 1/4

乙川リバーフロント関連工事工程表（平成29年10月）

Construction schedule grid with columns for dates (1-31) and rows for various project tasks such as '雨水排水設備工', '園路広場整備工', '植栽工', etc., categorized by project name like '乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事'.

工事担当部署/施工者

乙川リバーフロント推進課 / 岩附造園(株)

乙川リバーフロント推進課 / 杉林建設(株)

建築課 / 小原建設(株)

拠点整備課 / 朝日・大伸JV

拠点整備課 / 朝日工業(株)

拠点整備課 / 西日本電信電話(株) 中部電力(株)

乙川リバーフロント推進課 / 東邦ガス(株) 岡崎導管課

水道工事課 / 王神工事

9月末工事進捗率 実績 76.1% 予定 83.7%

9月末工事進捗率 実績 91.8% 予定 91.8%

9月末工事進捗率 実績 62.2% 予定 64.2%

9月末工事進捗率 実績 9.6% 予定 9.6%

9月末工事進捗率 実績 3.2% 予定 3.2%

9月末工事進捗率 実績 95.0% 予定 81.0%

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

岩附造園(株)からののお知らせ ■工事名:乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事 ■請負金額:96,876,000円 ■工期:平成29年3月6日~平成29年12月26日

杉林建設(株)からののお知らせ ■工事名:乙川河川緑地(吹矢橋公園)トイレ新築工事 ■請負金額:18,986,400円 ■工期:平成29年3月6日~平成29年10月31日

小原建設(株)からののお知らせ ■工事名:岡崎警察署明大寺交番曳家工事 ■請負金額:29,688,120円 ■工期:平成29年3月27日~平成29年12月15日

朝日・大伸JVからののお知らせ ■工事名:東岡崎駅ベデスリアンデッキ築造工事(その1) ■請負金額:565,920,000円 ■工期:平成29年6月27日~平成31年3月1日

朝日工業(株)からののお知らせ ■工事名:仮設駐輪場整備工事 ■請負金額:19,872,000円 ■工期:平成29年9月8日~平成30年3月30日

道路占用事業者による工事について ■工事概要:道路占用物の設置、撤去など ◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事をを行います。

道路占用事業者による工事について ■工事概要:道路占用物の設置、撤去など ◎電線共同溝整備事業に伴い、道路占用物工事をを行います。

王神工事からののお知らせ ■工事名:配水管撤去工事 ■請負金額:1,252,800円 ■工期:平成29年7月11日~平成29年11月10日

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年10月号 2/4

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年10月)

工事名	工事種類	日																															工事担当部署/施工者			
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		
配水管布設替工事 (康生通南地内)	仮設給水管工	仮設給水管工																																	水道工事課 /尾崎工業(株) 9月末 工事進捗率 実績 3.0% 予定 5.0%	
	配水管布設工																																			
	撤去工																																			
	仮設撤去工																																			
配水管布設替工事 (明大寺本町ほか1箇町)	準備工																																			水道工事課 /スズキ水道(株) 9月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%
	配水管撤去工																																			
配水管布設替工事 (明大寺町地内)	準備工																																			水道工事課 /(有)今井水道設備 9月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%
	配水管布設工																																			
配水管布設替工事 (耐震管2工区)	試掘工																																			水道工事課 /石田設備(株) 9月末 工事進捗率 実績 0.5% 予定 0.5%
	配水管布設工(北側)																																			
	配水管布設工(南側)																																			
河川環境整備工事 (交付金)・河川環境 対策工事合併工事	準備工																																			愛知県西三河建設事務所 河川港湾整備課 /(株)山口土木 9月末 工事進捗率 実績 0.0% 予定 0.0%
	準備工																																			
吹矢橋 橋りょう 耐震補強工事	準備工																																			道路建設課 /朝日工業(株) 9月末 工事進捗率 実績 1.0% 予定 1.0%
	準備工																																			
(仮称)乙川人道橋 橋りょう下部工事 その2	準備工																																			乙川リバーフロント推進課/ 朝日・小原JV 9月末 工事進捗率 実績 0.0% 予定 0.0%
	準備工 車線規制																																			
	準備工 除草伐採																																			
市道殿橋明代橋線ほ か1路線電線共同溝 整備工事	準備工																																			乙川リバーフロント推進課/ (株)加藤組 9月末 工事進捗率 実績 0.0% 予定 0.0%
	準備工																																			
乙川河川緑地整備 工事その1	準備工																																			乙川リバーフロント推進課/ 松尾建設(株) 9月末 工事進捗率 実績 0.0% 予定 0.0%
	準備工																																			
乙川プロムナード整備 工事(左岸)その1	準備工																																			道路建設課/ 大金建設(株) 9月末 工事進捗率 実績 4.0% 予定 4.0%
	準備工																																			

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

尾崎工業(株)からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事
 ■請負金額: 25,056,000円 ■工期: 平成29年6月16日~平成29年11月30日
 ■作業時間: 原則9時~17時まで
 ■工事概要: 配水管布設 L=254m
 ◎配水管の布設を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

スズキ水道(株)からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事
 ■請負金額: 3,510,000円 ■工期: 平成29年9月15日~平成30年2月28日
 ■作業時間: 原則9時~17時まで
 ■工事概要: 配水管布設 L=48m
 ◎配水管の布設を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事
 ■請負金額: 4,536,000円 ■工期: 平成29年9月15日~平成30年1月31日
 ■作業時間: 原則9時~17時まで
 ■工事概要: 配水管布設 L=111m
 ◎配水管の布設を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名: 配水管布設替工事(耐震管2工区)
 ■請負金額: 96,357,600円 ■工期: 平成29年7月21日~平成30年2月28日
 ■作業時間: 原則9時~17時まで
 ■工事概要: 配水管(耐震管)布設 L=599m
 ◎配水管(耐震管)の布設を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名: 河川環境整備工事(交付金)・河川環境対策工事合併工事
 ■請負金額: 30,121,200円 ■工期: 平成29年9月26日~平成30年3月16日
 ■作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をする場合があります。)
 ■工事概要: 坂路工1ヶ所、階段工1ヶ所
 ◎10月は準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名: 吹矢橋橋りょう耐震補強工事
 ■請負金額: 111,240,000円 ■工期: 平成29年9月15日~平成30年3月26日
 ■作業時間: 原則8時~17時まで
 ■工事概要: 下部工補強工1式、仮設工1式、上部工補強工1式、構造物補修工1式
 ◎10月は準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名: (仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その2
 ■請負金額: 343,440,000円 ■工期: 平成29年10月3日~平成30年7月31日
 ■作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 ■工事概要: RC橋脚工1基、橋台工1基、法覆護岸工1式、仮設工1式
 ◎10月は準備工に着手します。10月20日から乙川右岸市道の車線規制(終日)を行い工事ヤードの仮囲いや遊歩道の締切を設置したのち、除草、既存樹木の伐採作業を行います。
 工事中は、近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用の皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけしますが、何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名: 市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事
 ■請負金額: 98,539,200円 ■工期: 平成29年10月19日~平成30年3月23日
 ■作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 ■工事概要: 管路工 L=448m、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工 1式
 ◎10月は準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

松尾建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川河川緑地整備工事その1
 ■請負金額: 55,404,000円 ■工期: 平成29年10月20日~平成30年3月23日
 ■作業時間: 原則8時~17時まで(作業状況により時間延長をする場合があります。)
 ■工事概要: アスファルト舗装工700㎡、照明設備工N=187基、坂路工1箇所、階段工1箇所
 ◎10月は準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(左岸)その1
 ■請負金額: 27,885,600円 ■工期: 平成29年9月20日~平成30年3月5日
 ■作業時間: 原則8時~17時まで
 ■工事概要: 舗装工 A=214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 1式
 ◎10月は準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年10月号 3/4


乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年10月)

工事名	工事種類	10月							11月							工事担当部署/施工者															
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土																
乙川プロムナード整備工事(右岸)その1	準備工																													道路維持課 /(株)ハラダ建工 9月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %	
下水道管渠改築工事 (唐沢町ほか1箇町地内)	準備工																													下水施設課 /浦上建設(株) 9月末 工事進捗率 実績 0.0 % 予定 0.0 %	

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名: 乙川プロムナード整備工事(右岸)その1
 ■請負金額: 17,874,000円 ■工期: 平成29年10月20日～平成30年3月16日
 ■作業時間: 原則9時～17時まで
 ■工事概要: 側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2
 ◎10月は準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名: 下水道管渠改築工事
 ■請負金額: 27,108,000円 ■工期: 平成29年9月26日～平成30年2月28日
 ■作業時間: 原則9時～17時まで
 ■工事概要: 管推進工 L=22.5m
 ◎10月は準備工を行います。
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

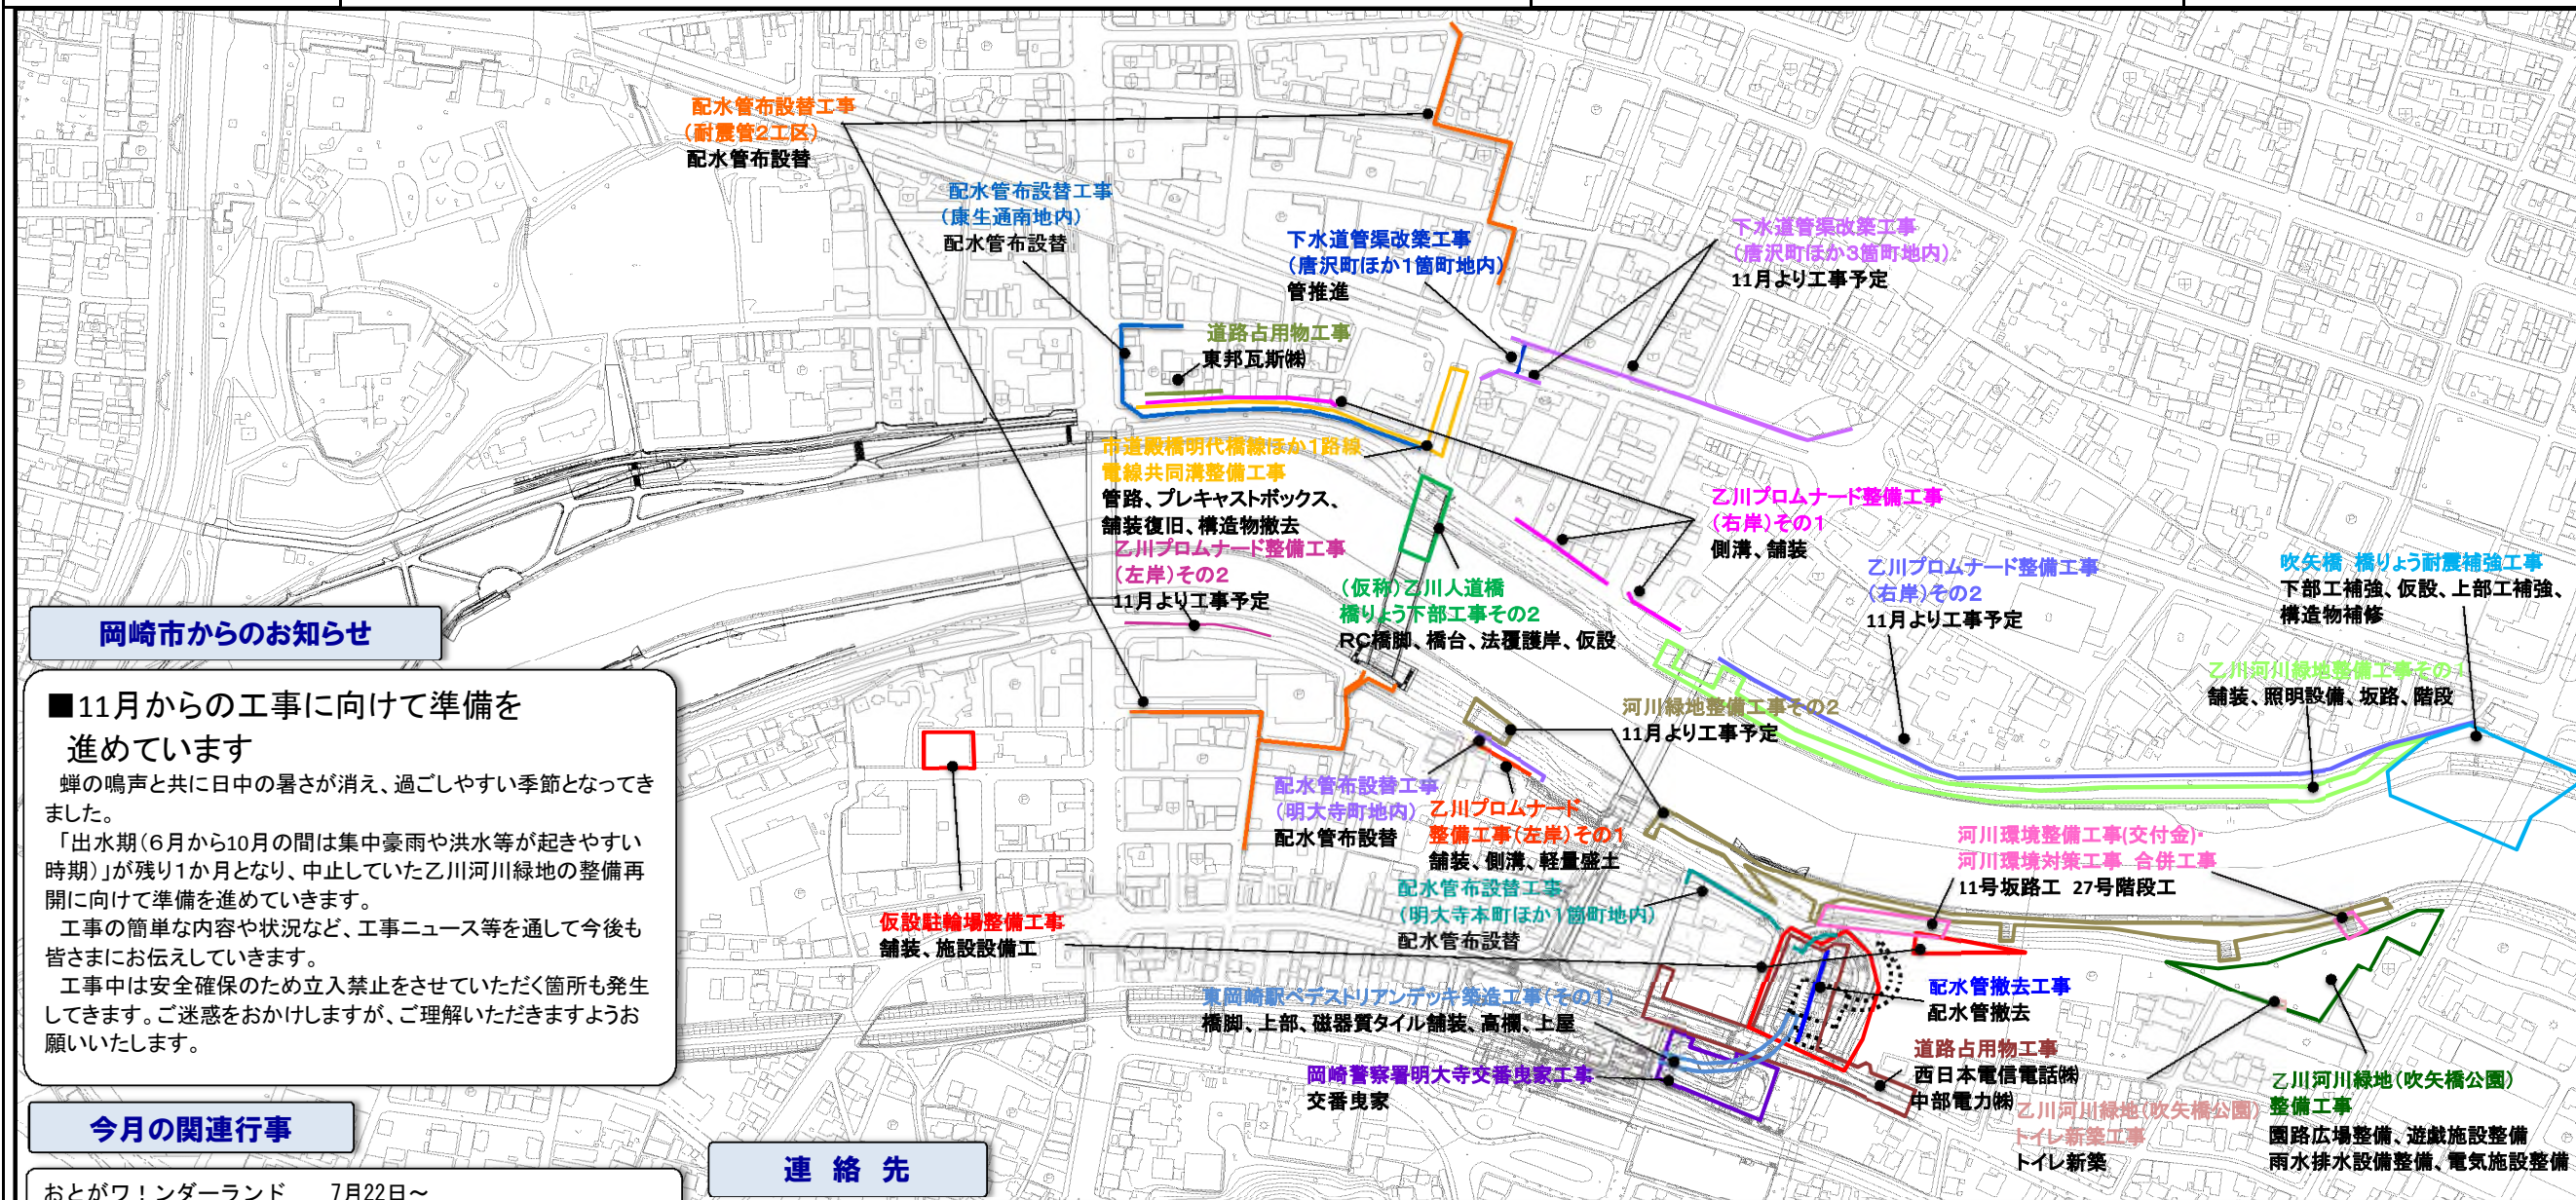

岡崎市からのお知らせ

■11月からの工事に向けて準備を進めています
 蝉の鳴声と共に日中の暑さが消え、過ごしやすい季節となりました。「出水期(6月から10月の間は集中豪雨や洪水等が起きやすい時期)」が残り1か月となり、中止していた乙川河川緑地の整備再開に向けて準備を進めていきます。工事の簡単な内容や状況など、工事ニュース等を通して今後も皆さまにお伝えしていきます。工事中は安全確保のため立入禁止をさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

今月の関連行事

おとがワ! ンダーランド 7月22日~
 第26回岡崎ストーンフェア 10月14、15日

工事状況及び利用状況写真



連絡先

- 岡崎市担当:**
- 乙川リバーフロント推進課 技術係【吹矢橋公園、人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】 中田、山本、山崎、大野 TEL:0564-23-6982
 - 水道工事課 北部方面係【配水管布設替(耐震管2工区、康生通南)】 前森 TEL:0564-23-6482
 - 水道工事課 南部方面係【配水管撤去、配水管布設替(明大寺本町ほか、明大寺町)】 永井 TEL:0564-23-6367
- 愛知県担当:**
- 西三河建設事務所河川港湾整備課【階段、坂路】 太田、富田 TEL:0564-27-2752
- 施工者:**
- | | | |
|--|---|--|
| <p>【吹矢橋公園】</p> <ul style="list-style-type: none"> 岩附造園(株) 三浦 TEL:0564-31-0171 杉林建設(株) 辻 TEL:0564-22-5215 <p>【人道橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657 <p>【乙川河川緑地】</p> <ul style="list-style-type: none"> その1 松尾建設(株) 市川 TEL:0564-21-0305 <p>【交番】</p> <ul style="list-style-type: none"> 小原建設(株) 岡田 TEL:0564-51-2623 <p>【ベデストリアンデッキ】</p> <ul style="list-style-type: none"> 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655 <p>【仮設駐輪場】</p> <ul style="list-style-type: none"> 朝日工業(株) 深谷 TEL:0564-51-3655 | <p>【プロムナード(左岸)】</p> <ul style="list-style-type: none"> その1 大金建設(株) 田中 TEL:0564-22-6855 <p>【プロムナード(右岸)】</p> <ul style="list-style-type: none"> その1 ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970 <p>【下水道管渠】</p> <ul style="list-style-type: none"> 唐沢町ほか 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460 <p>【吹矢橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> 朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657 <p>【階段、坂路】</p> <ul style="list-style-type: none"> (株)山口土木 水野 TEL:0564-65-6570 <p>【電線共同溝】</p> <ul style="list-style-type: none"> (株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013 | <p>【道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】】</p> <ul style="list-style-type: none"> 市川、浅井 TEL:0564-23-6230 <p>【道路建設課 工事係【プロムナード(左岸)】】</p> <ul style="list-style-type: none"> 大澤、宮地 TEL:0564-23-6743 <p>【道路維持課 北西部係【プロムナード(右岸)】】</p> <ul style="list-style-type: none"> 津田、平岩 TEL:0564-23-6225 |
|--|---|--|
- 【道路占用物(西日本電信電話株)担当 鬼頭 TEL:052-746-6814】**
- NDS株 鈴木 TEL:0564-55-2010(電柱・ケーブル)
 - NDS株 野村 TEL:0564-55-2020(管路)
- 【道路占用物工事(中部電力株)担当 鈴木 TEL:0564-55-5071】**
- トーエネック株 天野 TEL:0564-51-0800(建柱)
 - トーエネック株 藤下 TEL:0564-51-0800(電線)
- 【道路占用物(東邦瓦斯株)担当 井本 TEL:0564-21-0823】**
- 水金工事(株) 米持 TEL:0564-21-5103
- 【配水管布設替】**
- 耐震管2工区 石田設備(株) 米田 TEL:0564-24-0139
 - 康生通南 尾崎工業(株) 尾崎 TEL:0564-22-7411
 - 明大寺本町ほか スズキ水道(株) 鈴木 TEL:0564-48-2206
 - 明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820
- 【配水管撤去】**
- 王神工事 石川 TEL:0564-23-3210
