



# 柱町線ニュース

## 回覧

第1号 平成30年2月1日

### ■ 岡崎市からのお知らせです

現在、左下の位置図に赤色で示す箇所において、JR東海道本線と立体交差する『柱町線アンダーパス』の新設工事を行っています。

工事の状況でございますが、平成29年10月から実施してまいりました線路下の地盤改良工事は完了しました。今後、線路下のトンネルを掘り進めるための立坑を線路の東西に設置する工事を平成30年10月までの予定で行い、その後、トンネルの掘削工事を行う予定となっております。


アンダーパスが完成するまでの工事スケジュールは右下の工事スケジュール表のとおりです。工事が順調に進めば平成35年度末に開通できる見込みとなっております。

今後、工事に伴い周辺道路の交通規制を変更する必要がある場合は、改めて「柱町線ニュース」でお知らせします。

立体交差道路の工事は、長期間にわたるため地域の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、今後も引き続きご理解とご協力をお願いします。

「柱町線ニュース」は地域の皆さまへ、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。ご意見、ご感想などがございましたらご連絡下さい。皆様からの暖かい情報をお待ちしております。



### ■ 位置図

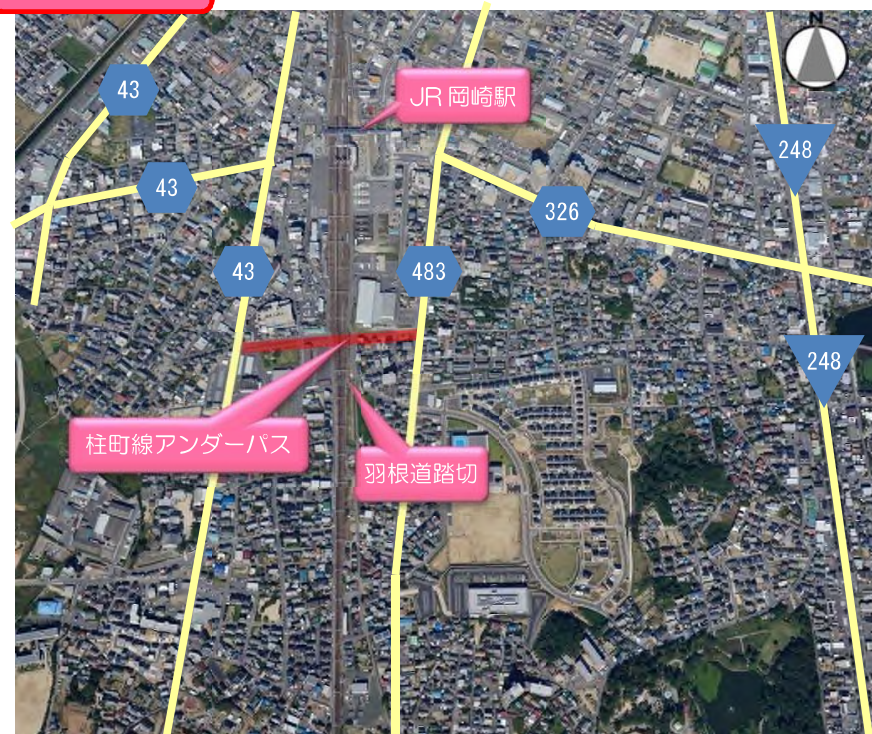

### ■ 現況写真



### ■ 完成イメージパース（平成30年1月時点）

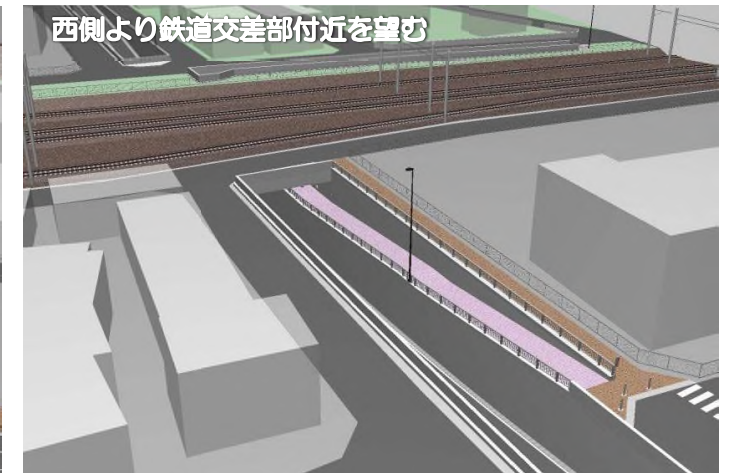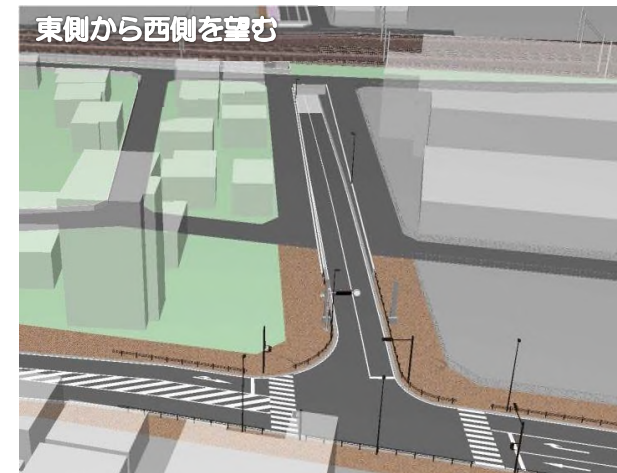

### ■ 現在の工事状況写真



### ■ 工事スケジュール

|     |                  | 年 度 |    |    |    |    |    |    |        |
|-----|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|
|     |                  | 29  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36     |
| 線路下 | 道路工事             | ■   | ■  | ■  | ■  |    |    |    | 供用開始予定 |
|     | 線路より東側           |     |    |    |    |    |    |    |        |
|     | 歩道工事             |     |    |    |    | ■  | ■  |    |        |
|     | 道路工事             |     |    |    |    | ■  | ■  | ■  |        |
|     | 交差点改良<br>(岡崎幸田線) |     |    |    |    |    |    | ■  |        |
|     | 線路より西側           |     |    |    |    |    |    | ■  |        |
|     | 道路工事             |     |    |    |    | ■  | ■  | ■  |        |
|     | 交差点改良<br>(岡崎碧南線) |     |    |    |    |    |    | ■  |        |

### ■ 連絡先

事業主体：岡崎市都市整備部市街地整備課技術係 Tel.0564-23-6286 担当 藤井、船山  
 工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事事務所  
 施工業者：名工建設株式会社 柱町Bv作業所 Tel.0564-73-1075 担当 柘植、上原
