



柱町線ニュース

回覧

第5号 平成30年12月1日

■ 岡崎市からのお知らせです

最初のエLEMENTが貫通しました！

9/21の夜からスタートしました線路下のトンネル工事について、これからのトンネル工事の基準となる「基準ELEMENT」が10/17に貫通しました。現在は、この「基準ELEMENT」に沿って順番にトンネル工を進めています。

施工に際して、夜間工事ということもあり、騒音・振動には十分注意してまいります。沿道の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。さて、今回の「柱町線ニュース」は、トンネル工事状況、進捗状況の説明です。

■ 現在の工事状況写真

※鏡切り:立坑の側面に開口部を設けるための切断作業




全景（平成30年10月撮影）



鏡切り（線路西側立坑）



トンネル掘削時の状況

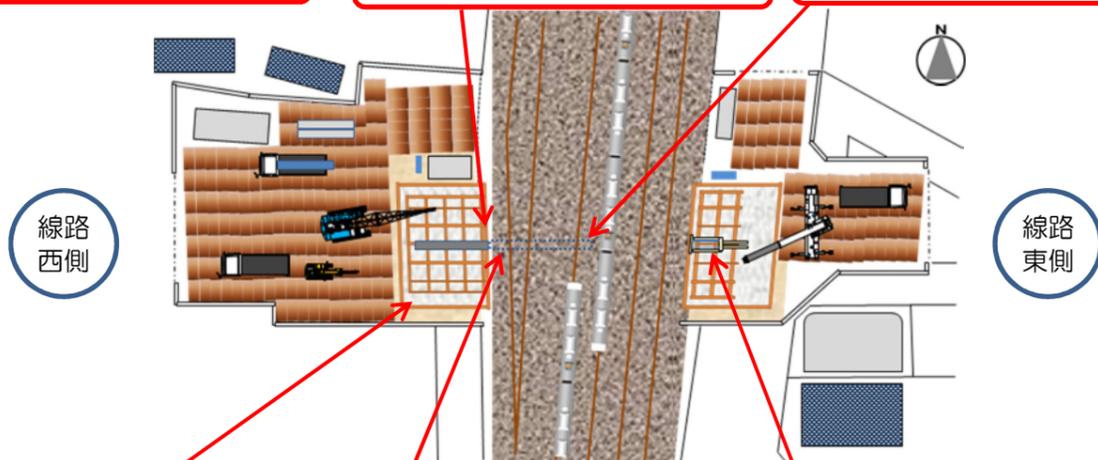

昇降架台（線路西側立坑）



ズリ出し（ELEMENT内部）




けん引状況（線路東側立坑）

※ズリ:トンネル工事で掘り出される岩石、土砂

■ 工事の進捗

工事の進捗状況は、10/17に基準ELEMENTが貫通し、一般部ELEMENTを下図の位置付近まで掘り進めています。

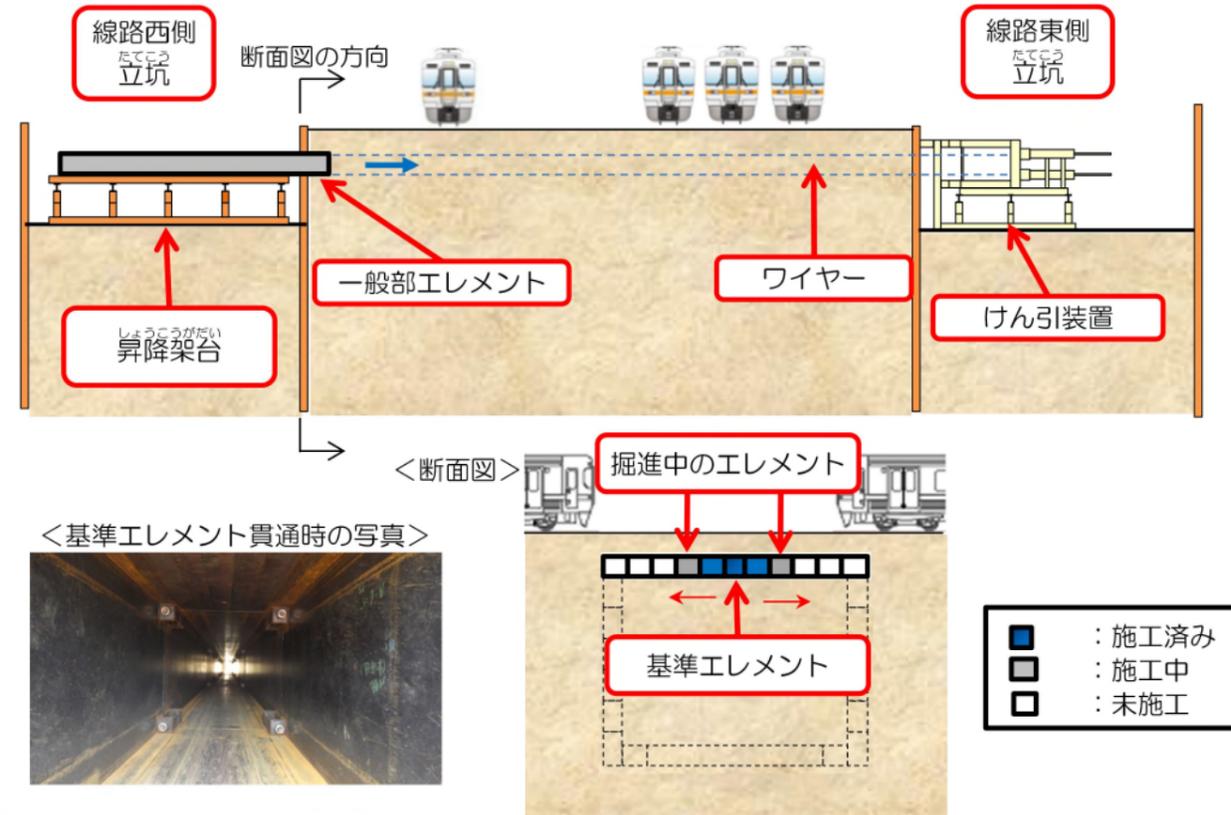

■ 今後の予定

【工事】

トンネルの夜間工事は、来年4月（予定）まで行います。
年末年始は、平成30年12月28日から平成31年1月6日（予定）まで休工します。

【柱町線ニュース】

次号では立坑の掘削工事（二次）の説明を予定しています。

■ 連絡先

事業主体：岡崎市都市整備部市街地整備課技術係 Tel.0564-23-6286 担当 都筑、船山
工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事部
施工業者：名工建設株式会社 柱町Bv作業所 Tel.0564-73-1075 担当 柘植、上原

「柱町線ニュース」は地域の皆さまへ、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。ご意見、ご感想などがございましたらご連絡下さい。皆様からの温かい情報をお待ちしております。
