



■ 岡崎市からのお知らせです

5月から行ってきました立坑掘削工事（二次）は、8月末までを予定しています。引続きダンプトラックの運行には、細心の注意を払って安全運転に努めてまいります。また、9月からは、トンネルの昼間工事、11月に線路上での夜間工事を予定しています。沿道の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。

今回の「柱町線ニュース」の内容は、トンネル工事（その3）（側壁エレメント工事）と線路上での夜間工事の説明です。

■ 現在の工事状況写真

写真1 立坑掘削状況

写真2 土砂運搬状況

写真3 立坑掘削状況

写真4 立坑掘削状況

写真5 立坑掘削状況

写真6 立坑掘削状況


写真7 グラウンドアンカー工事状況

線路 西側

線路 東側

■ 側壁エレメント工事

側壁エレメントとは、「トンネルの側面部分」となるエレメントのことをいいます。工事手順は、上床版エレメントと同様ですが、今度は上から下に向かってエレメントをつなぎ合せていきます。

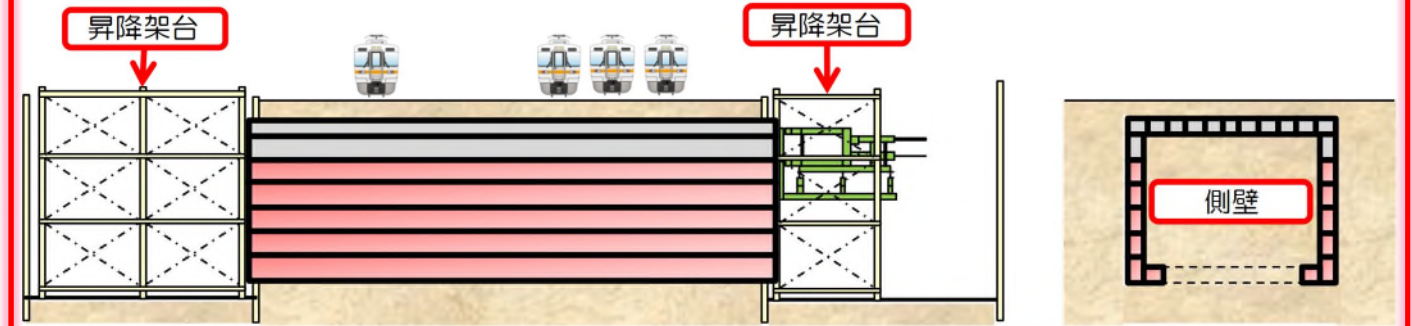

■ 線路上での夜間工事

上床版エレメント工事が、今年3月に終了したため、線路を防護していた設備の撤去と線路の調整を行います。設備の撤去と線路の調整工事は、列車の運行が終了した夜間に行います。この工事は、大きなクレーン等の重機は使用しませんが、発電機やボルトの取り外し、線路を調整する機械（タイタンパー）の音などが発生します。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。



■ 今後の予定

【工事】

令和元年11月に線路上での夜間工事を予定しています。（日程が決まり次第お知らせします。）
夏季休暇期間：令和元年8月9日～8月18日まで休工します。

【柱町線ニュース】

次号ではトンネル工事の進捗、工事状況の説明を予定しています。

■ 連絡先

事業主体：岡崎市都市整備部市街地整備課技術係 Tel.0564-23-6286 担当 都筑、大竹
工事受託：東海旅客鉄道株式会社 建設工事事務所
施工業者：名工建設株式会社 柱町Bv作業所 Tel.0564-73-1075 担当 柘植、上原

「柱町線ニュース」は地域の皆さまへ、柱町線の道路工事に関する状況やスケジュールなどの情報を、定期的にお知らせするとともに、地域の皆様と情報交換する場所として活用したいと考えております。ご意見、ご感想などがございましたらご連絡下さい。皆様からの温かい情報をお待ちしております。
