

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年4月号 1/3

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年4月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者					
		日	月	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30		
(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その1	P3橋脚工 作業土工																																				乙川リバーフロント推進課 /朝日・小原JV 3月末 工事進捗率 実績 92% 当初予定 91%
	P2橋脚工 作業土工																																				
	仮設工2 P3仮締切撤去																																				
	仮設工2 P2仮締切撤去																																				
	仮設工2 仮棧橋撤去																																				
	護岸復旧工 階段護岸、護床工																																				
乙川河川緑地整備工事その1																																				乙川リバーフロント推進課 /(株)加藤組	
乙川河川緑地整備工事その2																																				乙川リバーフロント推進課 /成瀬建設(株)	
乙川河川緑地整備工事その3																																				乙川リバーフロント推進課 /大伸建設(株)	
乙川河川緑地整備工事その4																																				乙川リバーフロント推進課 /(株)岡崎工業	
河川環境整備工事(交付金)	準備工																																			愛知県・河川港湾整備課 /成瀬建設(株)	
岡崎城跡菅生川端石垣発掘調査業務																																					社会教育課 /(株)アーキジオ中日本支店
平岩城跡発掘調査業務																																					社会教育課 /(株)二友組

工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

朝日・小原JVからのお知らせ ■工事名:(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事その1
 ■請負金額:679,490,000円 ■工期:平成27年10月2日~平成29年7月31日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要:RC橋脚工 N=2基、橋台工 N=1基、法覆護岸工 一式、仮設工 一式
 ◎P2橋脚工、P3橋脚工の躯体コンクリートが完成しました。3月中旬から埋戻し作業を行い、順次山留工の撤去を行っています。
 4月は、P3橋脚周囲の階段護岸復旧、護床ブロック設置、P2橋脚仮締切鋼矢板・仮棧橋の撤去を行います。2日、9日は日曜日ですが、軽微な作業(著しい騒音 又は振動を発生させない作業)を予定しています。工事中は近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用の皆様には大変、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、何卒、本工事にご理解とご協力の程、お願いいたします。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地整備工事その1
【工事完了】
 ◎工事中は交通規制等によりご迷惑をお掛けしましたが、事故等なく無事に工事を完了する事ができました。乙川河川緑地はさらに水はけがよくなり、勾配が緩く明るい階段やスロープが増えたことでより河川敷へアクセスしやすくなりました。藤棚も歩きやすく憩える場所として整備されましたので、ぜひ訪れてみてください。ご理解ご協力ありがとうございました。

成瀬建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地整備工事その2
【工事完了】
 ◎皆様方のご理解とご協力を賜り、竣工することができました。関係者一同、心より感謝申し上げますとともに、工事中ご不便をお掛けしたことをお詫びいたします。広場整備が済み乙川河川緑地は居心地の良い素敵な場所になりました。新たにベンチもできましたので、是非ご来園しお楽しみください。


大伸建設(株)からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地整備工事その3
【工事完了】
 ◎本工事でも無事終わることができました。ひとえに皆様のご理解とご協力のおかげだと思ひ、お礼申し上げます。昨年の右岸側整備に引き続き、左岸側にも園路や照明設備が設置され、乙川の魅力がさらに増しております。冬も過ぎ日々の陽気も暖かくなり始め、外に出かけるのも楽しい時期になりました。新しく様変わりした乙川河川緑地を、桜とともに散策等をして楽しんでいただけたらと思います。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名:乙川河川緑地整備工事その4
【工事完了】
 ◎去年から行ってきました緑地整備工事ですが、事故等もなく工期内に無事完了することが出来ました。完成された風景を右岸及び左岸堤防より眺めると、以前よりも素晴らしい風景になったのではないかと思います。工事期間中は近隣の皆様や利用者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。さらに美しくなった乙川をお楽しみください。

成瀬建設株式会社からのお知らせ ■工事名:河川環境整備工事(交付金)
 ■請負金額:9,428,400円 ■工期:平成29年4月7日~平成29年8月14日
 ■作業時間:原則8時~17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)
 ■工事概要:坂路工 N=1箇所、階段手すり設置工 N=一式
 ◎新しい坂路を作る工事を担当します。4月はその準備を行い、5月から着手する予定です。工事期間中、近隣の皆様方へご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。

(株)アーキジオ中日本支店からのお知らせ ■業務名:岡崎城跡菅生川端石垣発掘調査業務
調査完了

(株)二友組からのお知らせ ■業務名:平岩城跡発掘調査業務
【工事完了】
 ◎発掘調査が完了しました。施工期間中ご迷惑をおかけしましたが、ご理解とご協力をいただきありがとうございました。

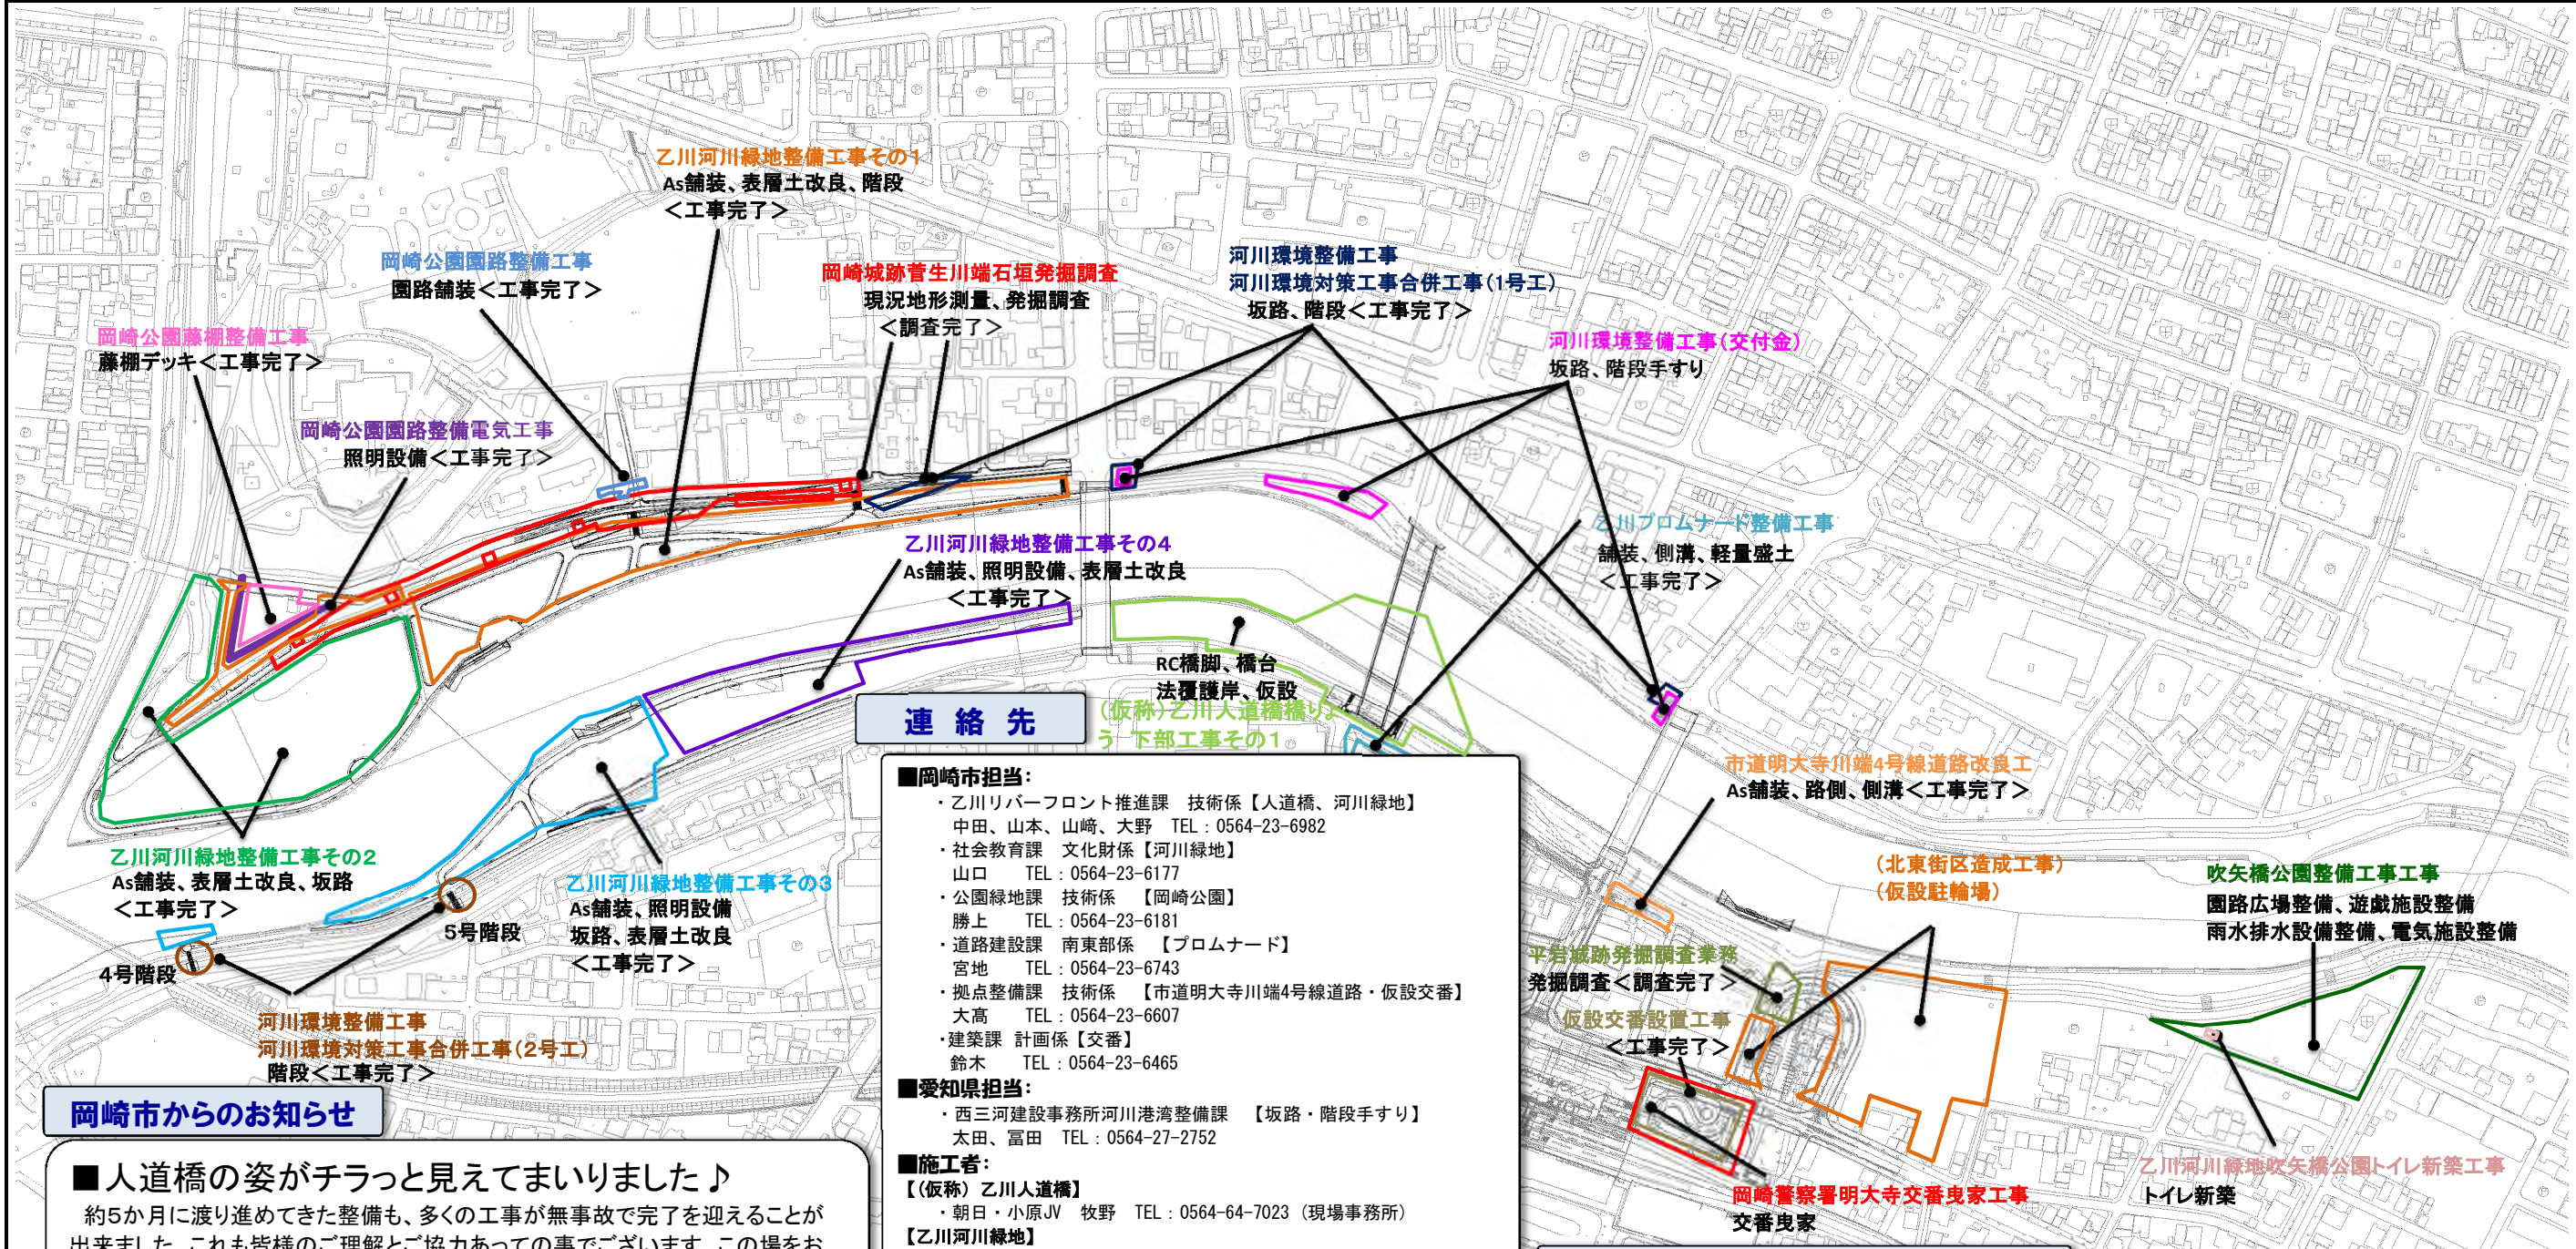

連絡先

- 岡崎市担当:
 - 乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、河川緑地】 中田、山本、山崎、大野 TEL: 0564-23-6982
 - 社会教育課 文化財係【河川緑地】 山口 TEL: 0564-23-6177
 - 公園緑地課 技術係【岡崎公園】 勝上 TEL: 0564-23-6181
 - 道路建設課 南東部係【プロムナード】 宮地 TEL: 0564-23-6743
 - 拠点整備課 技術係【市道明大寺川端4号線道路・仮設交番】 大高 TEL: 0564-23-6607
 - 建築課 計画係【交番】 鈴木 TEL: 0564-23-6465
- 愛知県担当:
 - 西三河建設事務所河川港湾整備課【坂路・階段手すり】 太田、富田 TEL: 0564-27-2752
- 施工者:
 - 【(仮称)乙川人道橋】
 - 朝日・小原JV 牧野 TEL: 0564-64-7023 (現場事務所)
 - 【乙川河川緑地】
 - (株)加藤組 西尾 TEL: 0564-45-2013<工事完了>
 - 大伸建設(株) 太田 TEL: 0564-54-7777<工事完了>
 - (株)岡崎工業 堀 TEL: 0564-48-2814<工事完了>
 - 岩附造園(株) 三浦 TEL: 0564-31-0171
 - 杉林建設(株) 辻 TEL: 0564-22-5215
 - 成瀬建設(株) 深田 TEL: 0564-46-2050<準備中>
 - 【発掘調査】
 - (株)アーキジオ中日本支店 小島 TEL: 052-799-8751<調査完了>
 - 【岡崎公園】
 - (株)岩津電気商会 鈴木 TEL: 0564-23-8151<工事完了>
 - (株)庭善造園 青山 TEL: 0564-51-0129<工事完了>
 - (株)緑風造園 堤 TEL: 0564-21-9278<工事完了>
 - 【プロムナード】
 - 浦上建設(株) 小林 TEL: 0564-51-1460<工事完了>
 - 【市道明大寺川端4号線道路】
 - 浅井土木建設(株) 浅井 TEL: 0564-51-0308<工事完了>
 - 【階段・坂路】
 - (株)加藤組 小杉 TEL: 0564-45-2013 <工事完了>
 - 浅井土木建設(株) 馬込 TEL: 0564-51-0308<工事完了>
 - 【仮設交番】
 - サンモク工業(株) 太田 TEL: 0564-21-0038<工事完了>
 - 【交番】
 - 小原建設(株) 岡田 TEL: 0564-51-2623

岡崎市からのお知らせ

■人道橋の姿がチラッと見えてまいりました♪
 約5か月に渡り進めてきた整備も、多くの工事が無事故で完了を迎えることが出来ました。これも皆様のご理解とご協力あっての事でございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。
 今回工事で一番の注目ポイントは、何と言っても(仮称)乙川人道橋の橋脚部分が見せたことでしょうか。ゆるやかに流れる乙川に整備された2本の橋脚はキレイな石積み模様が施されており、昨年度完成した橋台とを結んでみますと、皆様に歩いていただける道筋がなんとなく想像できるのではないのでしょうか。
 さて、今年度の予定ですが、人道橋は現在整備している橋りょうの河川内工事が5月末までに完了、11月からは対岸の橋台・橋脚整備へと舞台を移します。他にも河川緑地や堤防道路、吹矢橋公園の整備など、昨年度同様に多くの整備を予定しています。また、東岡崎駅前にある北東街区も事業予定者が決定し、駅前も含めて乙川の雰囲気はさらに変化を見せていくこととなります。今後も乙川リバーフロント地区整備事業にご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
 今月は岡崎公園の桜や藤も見ごろを迎えます。変わりゆく乙川で『新しい春』を感じてみてはいかがでしょうか。

今月の関連行事

- ・桜まつり 4月1日～15日
※桜の開花状況により、期間を変更する場合があります。
- ・家康行列 4月9日
- ・五万石藤まつり 4月20日～5月5日

工事状況及び利用状況写真



(仮称)乙川人道橋橋りょう下部工事

左岸 整備状況
