

工事ニュース

乙川リバーフロント地区整備事業

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年9月号 1/3

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年9月)

工事名	工事種類	日	日																														工事担当部署/施工者
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事	遊戯施設整備工					2連プランコ据付																											
	電気設備工																																
	園路広場整備工																																
	植栽工																																
	給水設備工																																
	サービス施設整備工																																
	管理施設整備工																																
	汚水排水設備工																																
乙川河川緑地(吹矢橋公園)トイレ新築工事	準備工																																
	基礎工事																																
岡崎警察署明大寺交番曳家工事	曳家工事																																
東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)	準備工																																
仮設駐輪場整備工事	準備工																																
	配線工																																
道路占用事業者による工事	ミクスネットワーク(株)																																
	東邦瓦斯(株)																																
配水管布設替工事(耐震管2工区)	準備工																																
	配水管布設工																																
配水管撤去工事	配水管撤去工																																

**工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。**

**岩附造園(株)からのお知らせ** ■工事名: 乙川河川緑地(吹矢橋公園)整備工事  
 ■請負金額: 96,876,000円 ■工期: 平成29年3月6日～平成29年12月26日  
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります)  
 ■工事概要: 公園舗装工A=661m<sup>2</sup>、園路排水工L=478m、遊戯施設整備工一式、植栽工一式  
 ◎今月は舗装に向けて各種構造物の設置並びに舗装路盤を行います。関連(トイレ)工事の変更に伴い、工期を延長しております。  
 早期供用開始をお待ちの皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一で進めておりますので何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

**杉林建設(株)からのお知らせ** ■工事名: 乙川河川緑地(吹矢橋公園)トイレ新築工事  
 ■請負金額: 18,986,400円 ■工期: 平成29年3月6日～平成29年10月31日  
 ■作業時間: 原則8時～17時まで  
 ■工事概要: 公園トイレ新築工一式  
 ◎ユニットトイレを設置するための基礎工事を行います。  
 道路付近での作業となりますので、細心の注意を払って工事を進めます。  
 皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

**小原建設(株)からのお知らせ** ■工事名: 岡崎警察署明大寺交番曳家工事  
 ■請負金額: 29,688,120円 ■工期: 平成29年3月27日～平成29年12月15日  
 ■作業時間: 原則8時～17時まで  
 ■工事概要: 交番曳家一式  
 ◎8月より交番の移動にとりかかっています。今月は交番を回転移動させ、下降・定着に取り掛かります。  
 工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様にご迷惑をおかけしますが、本工事にご理解とご協力をお願いいたします。

**朝日・大伸JVからのお知らせ** ■工事名: 東岡崎駅ペDESTリアンデッキ築造工事(その1)  
 ■請負金額: 565,920,000円 ■工期: 平成29年6月27日～平成31年3月1日  
 ■作業時間: 原則8時～17時まで(作業状況により19時まで時間延長をすることがあります。)  
 ■工事概要: 橋脚工 N=3基、上部工一式、磁器質タイル舗装 A=455m<sup>2</sup>、高欄工 L=183m、上屋工 A=292m<sup>2</sup>  
 ◎東岡崎駅東改札口に繋がるペDESTリアンデッキ(自由通路)を築造します。  
 9月は引き続き準備工(現地調査・現場事務所設置・起工測量・北側施工ヤード砕石敷)を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**朝日工業(株)からのお知らせ** ■工事名: 仮設駐輪場整備工事  
 ■請負金額: 19,872,000円 ■工期: 平成29年9月8日～平成30年3月30日  
 ■作業時間: 原則9時～17時まで  
 ■工事概要: 舗装工 A=487m<sup>2</sup> 施設設備工1式  
 ◎東岡崎駅周辺整備事業に伴い、仮設駐輪場整備を行います。  
 9月は準備工、引込線移設工を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**道路占用事業者による工事について**  
 ■工事概要: 道路占用物の設置、撤去など  
 ◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。  
 詳細な交通規制等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**石田設備からのお知らせ** ■工事名: 配水管布設替工事(耐震管2工区)  
 ■請負金額: 96,357,600円 ■工期: 平成29年7月21日～平成30年2月28日  
 ■作業時間: 原則9時～17時まで  
 ■工事概要: 配水管(耐震管)布設 L=599m  
 ◎配水管(耐震管)の布設を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

**王神工事からのお知らせ** ■工事名: 配水管撤去工事  
 ■請負金額: 1,252,800円 ■工期: 平成29年7月11日～平成29年11月10日  
 ■作業時間: 原則9時～17時まで  
 ■工事概要: 配水管撤去 L=68m  
 ◎配水管の撤去を行います。  
 工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

8月末 工事進捗率  
 実績 56.4 %  
 予定 74.8 %

8月末 工事進捗率  
 実績 86.3 %  
 予定 96.7 %

8月末 工事進捗率  
 実績 49.1 %  
 予定 49.1 %

8月末 工事進捗率  
 実績 4.8 %  
 予定 4.8 %

8月末 工事進捗率  
 実績 0.0 %  
 予定 0.0 %

8月末 工事進捗率  
 実績 0.3 %  
 予定 0.3 %

8月末 工事進捗率  
 実績 40.0 %  
 予定 40.0 %

**工事ニュース**

**乙川リバーフロント地区整備事業**

この工事ニュースは、1か月先の工事予定を記載しておりますので、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

平成29年9月号 2/3

乙川リバーフロント関連工事工程表 (平成29年9月)

工事名	工事種類	日																														工事担当部署/施工者						
		曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30					
配水管布設替工事	準備工																																水道工事課 /尾崎工業(株)  8月末 工事進捗率 実績 2.0 % 予定 2.0 %					
	仮設給水管工																																					

**工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。**

**尾崎工業からのお知らせ** ■工事名:配水管布設替工事

■請負金額: 25,056,000円 ■工期: 平成29年6月16日～平成29年11月30日


■作業時間: 原則9時～17時まで

■工事概要: 配水管布設 L=254m

◎配水管の布設を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



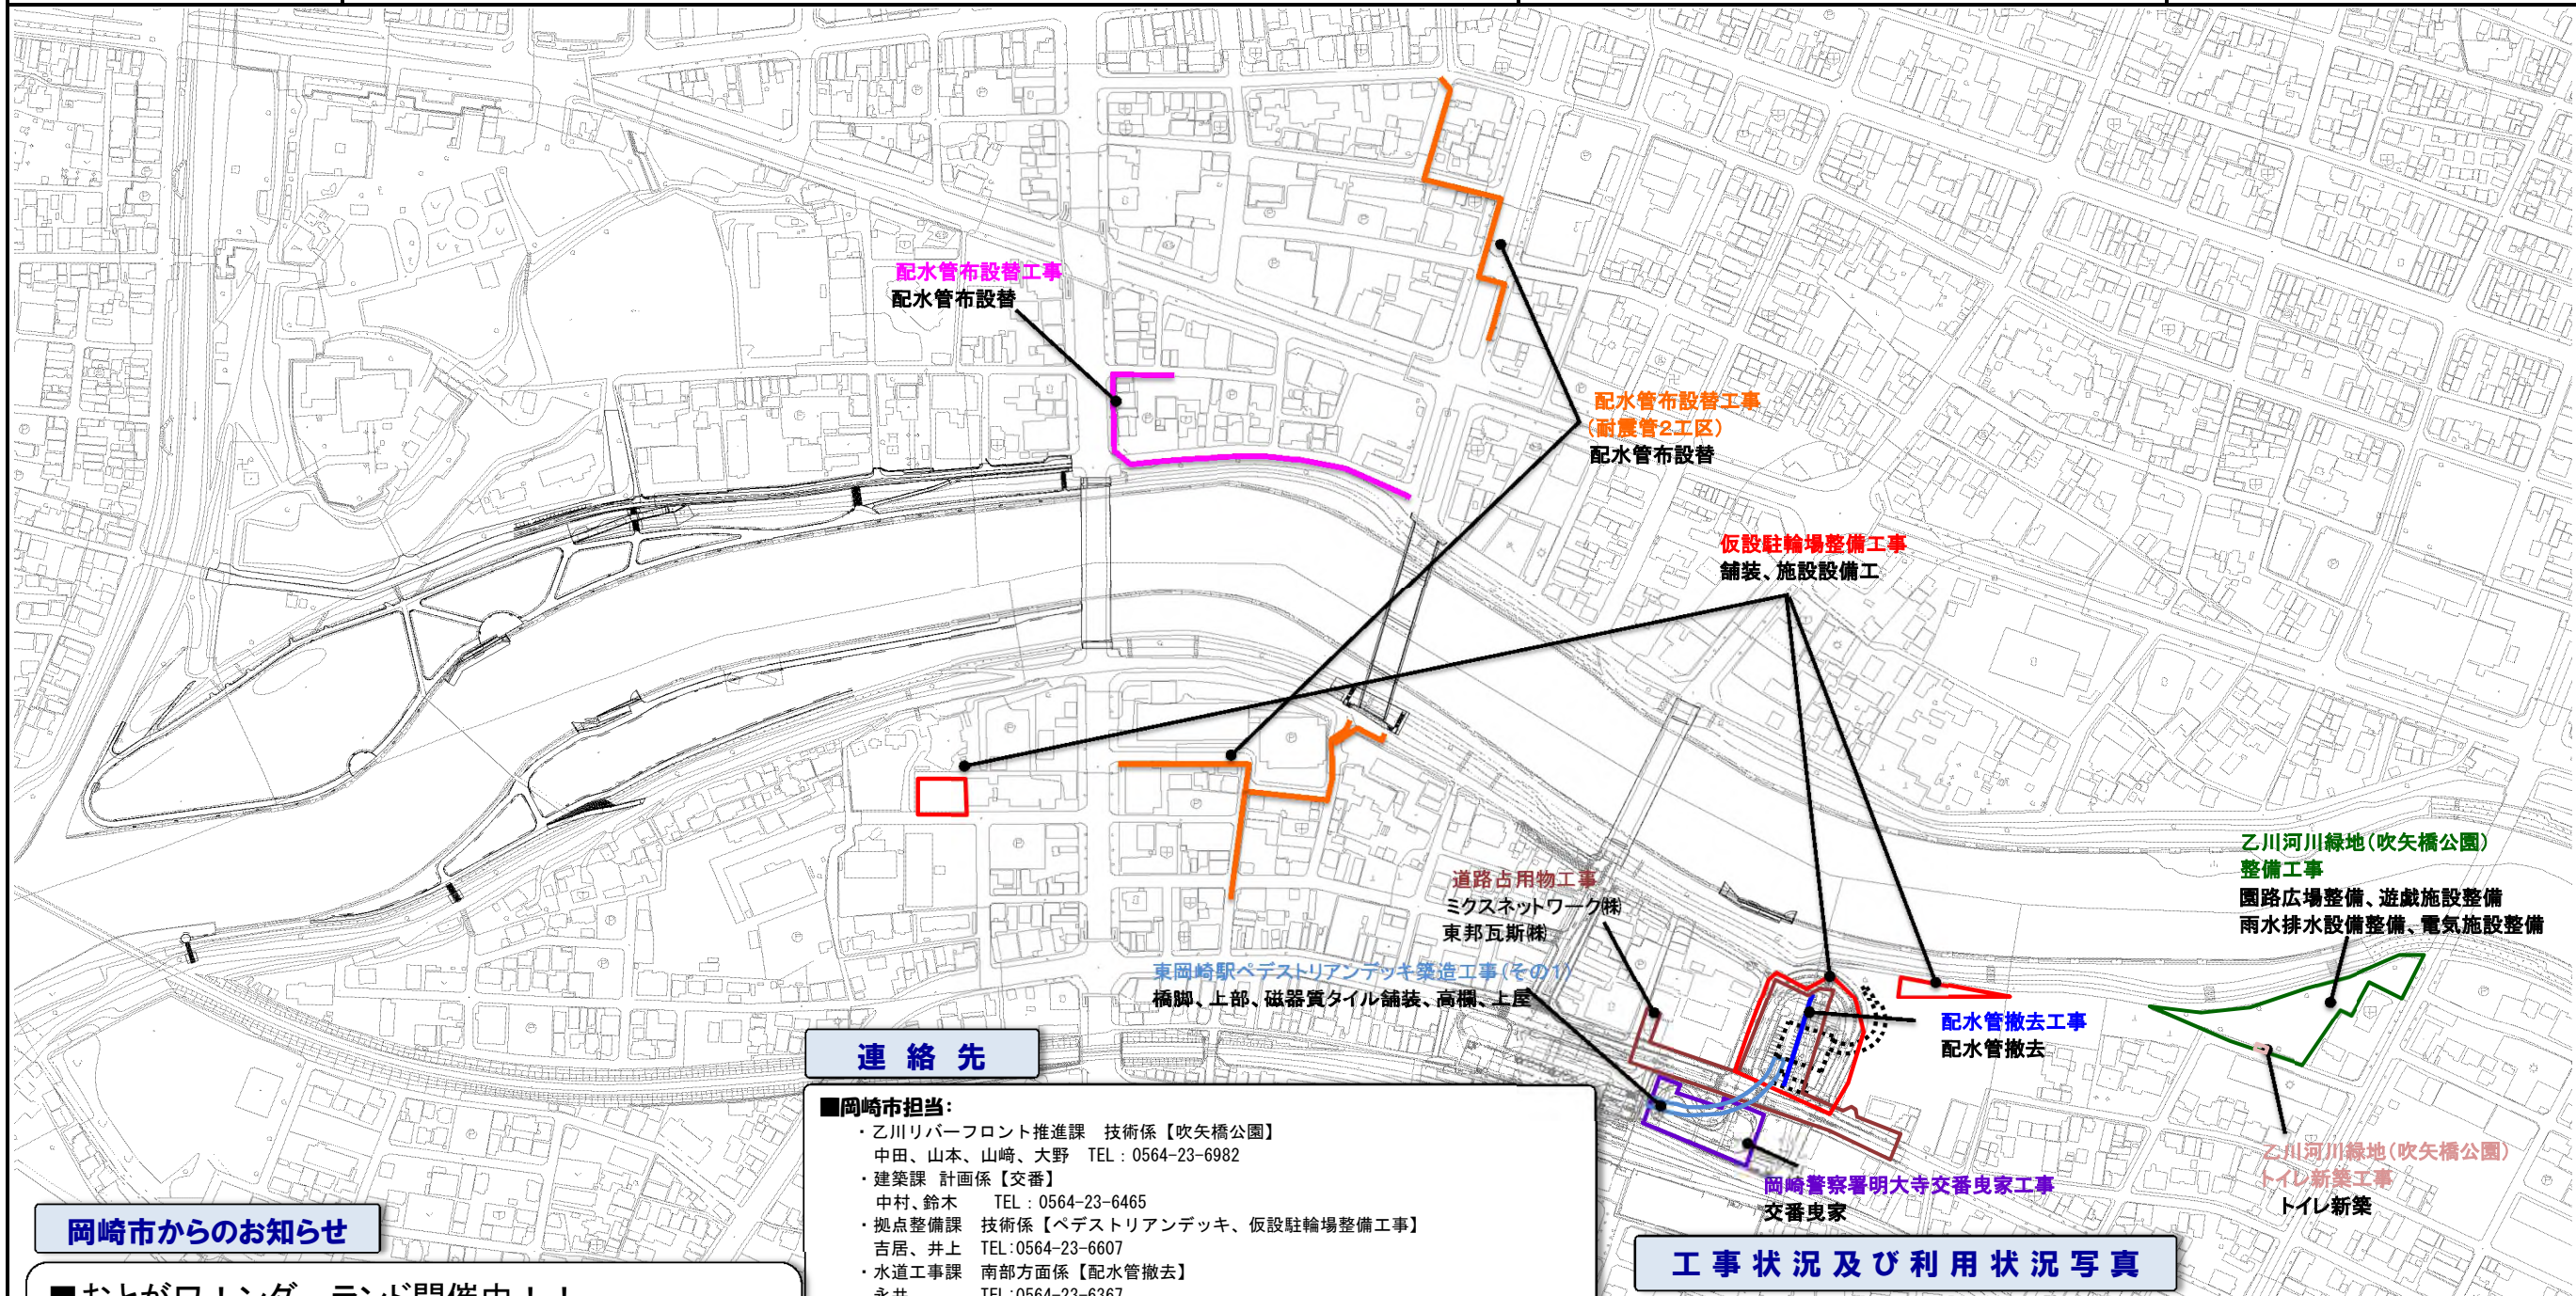

連絡先

- 岡崎市担当:
- 乙川リバーフロント推進課 技術係【吹矢橋公園】  
中田、山本、山崎、大野 TEL: 0564-23-6982
  - 建築課 計画係【交番】  
中村、鈴木 TEL: 0564-23-6465
  - 拠点整備課 技術係【ペDESTリアンデッキ、仮設駐輪場整備工事】  
吉居、井上 TEL: 0564-23-6607
  - 水道工事課 南方方面係【配水管撤去】  
永井 TEL: 0564-23-6367
  - 水道工事課 北方方面係【配水管布設替工事(耐震管2工区)、配水管布設替工事】  
前森 TEL: 0564-23-6482
- 施工者:
- 【吹矢橋公園】
- 岩附造園(株) 三浦 TEL: 0564-31-0171
  - 杉林建設(株) 辻 TEL: 0564-22-5215
- 【交番】
- 小原建設(株) 岡田 TEL: 0564-51-2623
- 【ペDESTリアンデッキ】
- 朝日・大伸JV 鈴木 TEL: 0564-51-3655
- 【仮設駐輪場整備工事】
- 朝日工業(株) 深谷 TEL: 0564-51-3655
- 【道路占用物工事(ミクスネットワーク橋) 担当 榎本 TEL: 0564-25-5077】
- NDS(株) 野村 TEL: 0564-55-2020 (管路新設)
  - 住友電工(株) 吉川 TEL: 0564-72-4031 (入線)
- 【道路占用物工事(東邦瓦斯橋) 担当 井本 TEL: 0564-21-0823】
- 水金工事(株) 大見 TEL: 0564-21-5103
- 【配水管布設替工事(耐震管2工区)】
- 石田設備(株) 米田 TEL: 0564-24-0139
- 【配水管撤去】
- 王神工事 石川 TEL: 0564-23-3210
- 【配水管布設替工事】
- 尾崎工業(株) 尾崎 TEL: 0564-22-7411

岡崎市からのお知らせ

■おとがワ！ンダーランド開催中！！

花火大会の開催で盛り上がりを見せた乙川河川緑地では、引き続き「おとがワ！ンダーランド」が開催されています。いろいろなイベントが随時開催されていますので、是非足を運んでみてください！（詳しいイベント情報・開催日等は「おとがワ！ンダーランド」公式webサイトをチェックしてください！）

工事の進む吹矢橋公園整備工事においては、トイレ工事の変更により工期を12月末まで延長いたします。公園の早期供用をお待ちの皆さまにはご迷惑をおかけしますが、12月中旬の供用開始を目指して作業を進めてまいります。毎年9月は台風が多くなる時期ではありますが、引き続き工事箇所等の安全に努めてまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

今月の関連行事

おとがワ！ンダーランド 7月22日～  
第11回消防団員消防技術発表会 9月24日（※雨天中止）

工事状況及び利用状況写真

