

※★印の様式の記入例が添付されておりますので、作成時の参考にしてください。
また、次ページの【よくある意見事例集】を合わせてご覧いただき、記入漏れ等をなく
しましょう。

●印のついている書類を揃え、申請書類（1部）が必要です。

(備考)

- (※1)は、側溝・水路に排水する場合に提出。その他、道路管理者指示がある場合に提出して下さい。
- (※2)は、交通規制時の車道等の有効幅員を記入してください。
- (※3)は、申請書鏡を2部提出して下さい。
- (※4)は、別添の「都市計画法第32条に基づく協議申請書類添付図書一覧」を参照して下さい。

■道路占用許可申請に伴う道路使用許可申請書は、市が発行する協議書と合わせて、申請者が岡崎警察署に提出して下さい。

■道路占用許可書は、申請者が協議書の回答を岡崎警察署から受理後、市へ提出されたのちに発行します。

■申請内容によっては、一覧表以外の資料を求める場合があります。

■法定外公公共物占用等許可申請は、本一覧表に準ずる。

道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書

道路管理者
岡 崎 市 長 殿

令和〇〇年〇〇月〇〇日
※提出日を記入

住 所 岡崎市十王町2丁目9番地
氏 名 十王 太郎
電話 (0564) 23 - 6000



次のとおり、道路に関する工事の設計及び実施計画を承認してください。

工 事 の 場 所	岡崎市〇〇町字□丁目△ 番地先
	市道 0000 線 (路線番号〇〇) ※わがまちガイドにて確認できます
工 事 の 種 別	舗装工事
工 事 の 概 要	別紙のとおり
工事の実施方法	別紙のとおり
工 事 の 時 期	令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで
工 事 を 必 要 と す る 理 由	自宅への車の乗り入れを円滑にできるようにするため

岡崎市指令土第 号

申請については、別紙の条件をつけて承認する。

令和 年 月 日

道路管理者
岡 崎 市 長


位置図

※ 図面の大きさは、日本工業規格A4以上としてください。


主な明示事項	留意事項
・ 申請地 ・ 方位 ・ 目標となる施設	申請する箇所を明示 学校、公園などの位置を記載



平面図

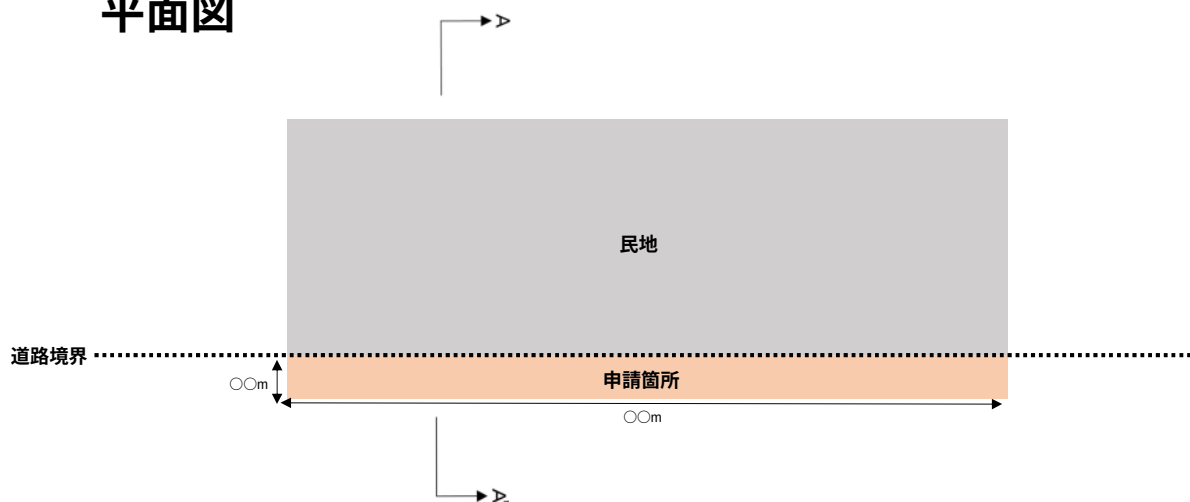

断面図 (A-A)

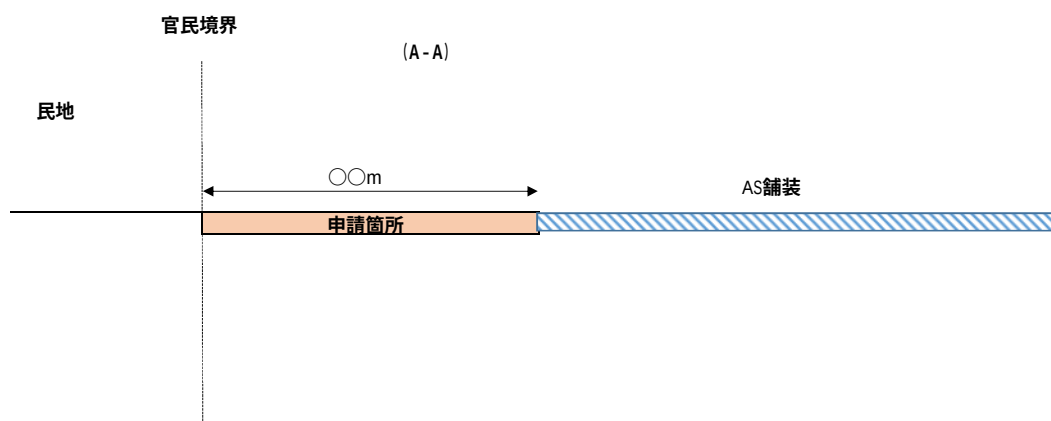

※官民境界を明示すること
施工範囲の両端の処理方法がわかる断面図を添付すること


下記の保安設備図がシートごとにあります。

シート№	保安設備図の内容	工事箇所
1	歩道部分の工事で、民地側に仮設歩道を設置する例	歩道
2	歩道に歩行者通路を確保できる片側交互通行の例	歩道+車道 (センターライン有)
3	道路上に仮設歩道を設置する片側交互通行の例	歩道+車道 (センターライン無)
4	道路内工事で片側交互通行の例	車道 (センターライン有)
5	//	車道 (センターライン無)
6	車両通行止めの例	車道
7	通行止めの例	車道
8	迂回路図の例	-
9	保安設備様式図	-

保安設備等計画図

No.1


(歩道部分の工事で、民地側に仮設歩道を設置する場合の例)

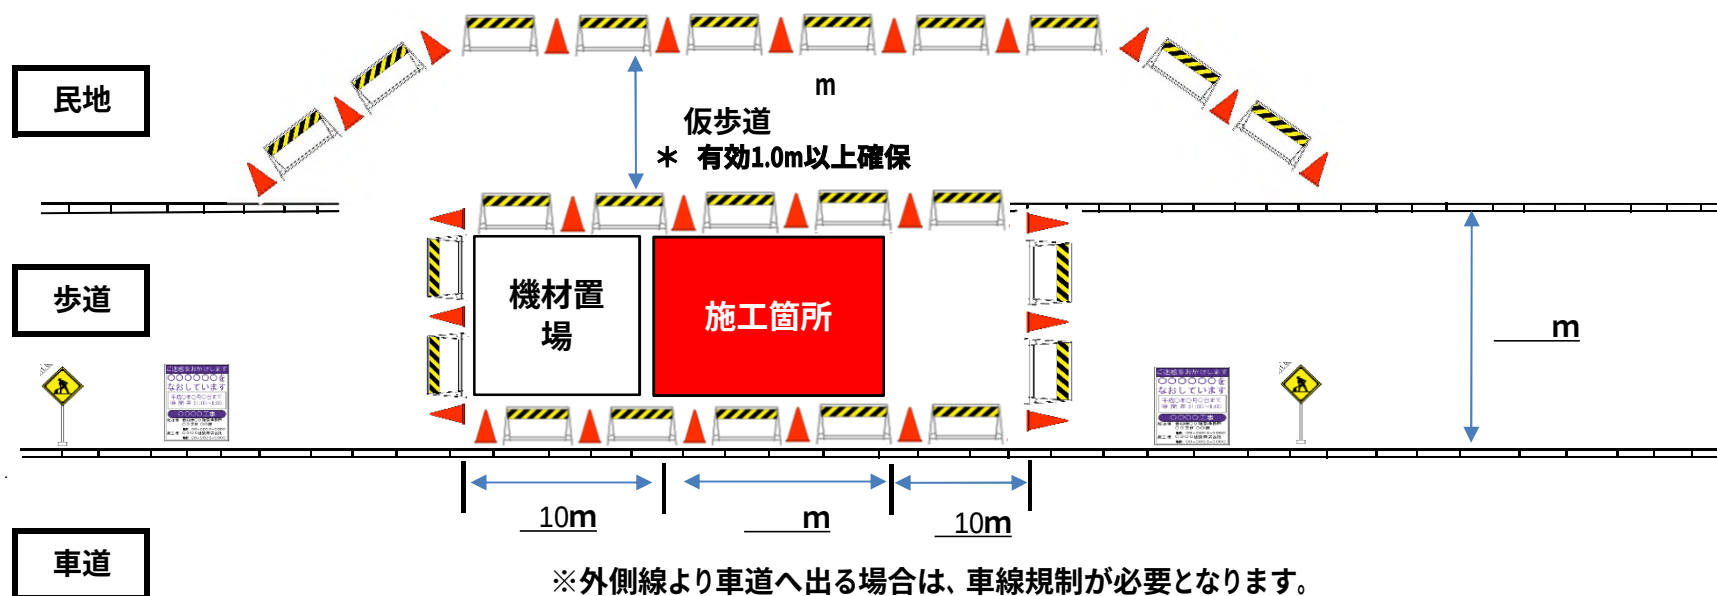

- 作業時間は、原則として9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 仮設歩道は、段差をなくし、仮設歩道内が土・砂利等の場合はゴムマットで養生します。
- 「道路工事保安設備設置基準 平成19年4月（平成30年3月改定） 愛知県建設部」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

保安設備等計画図


(歩道に歩行者用通路を確保できる片側交互通行の例)

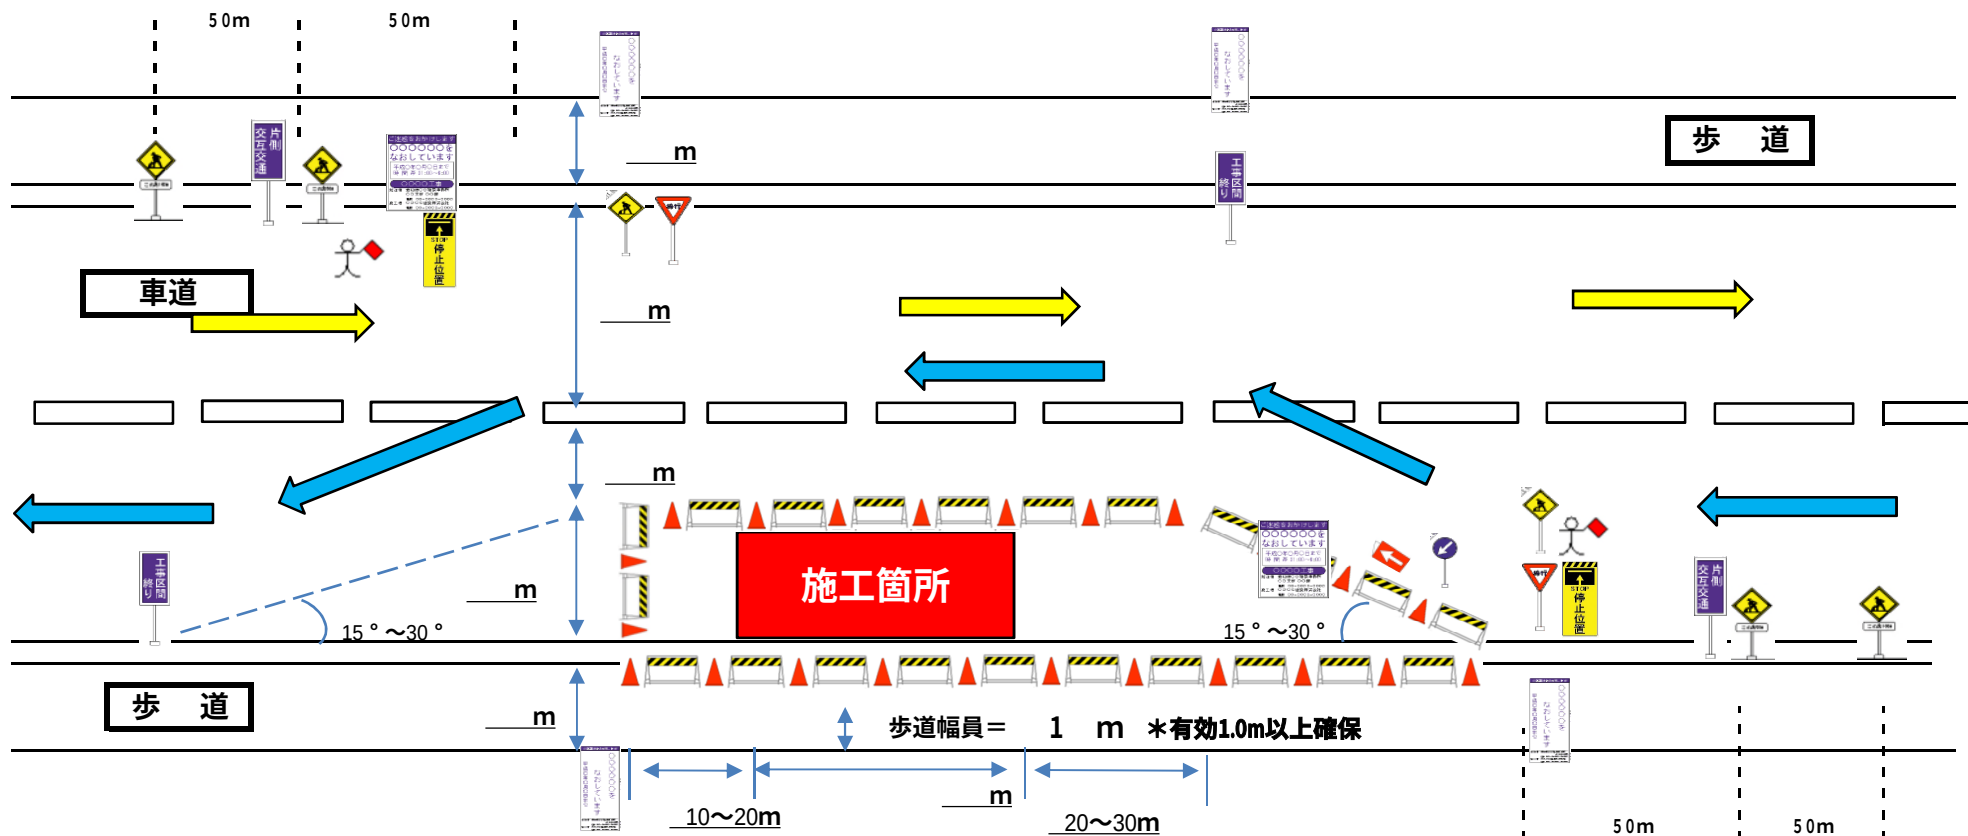

- 作業時間は、原則として9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 歩行者は作業を止めて、誘導員が安全に誘導します。
- 「道路工事保安設備設置基準 平成19年4月(平成30年3月改定) 愛知県建設部」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

保安設備等計画図

(道路上に仮設歩道を設置する片側交互通行の例)

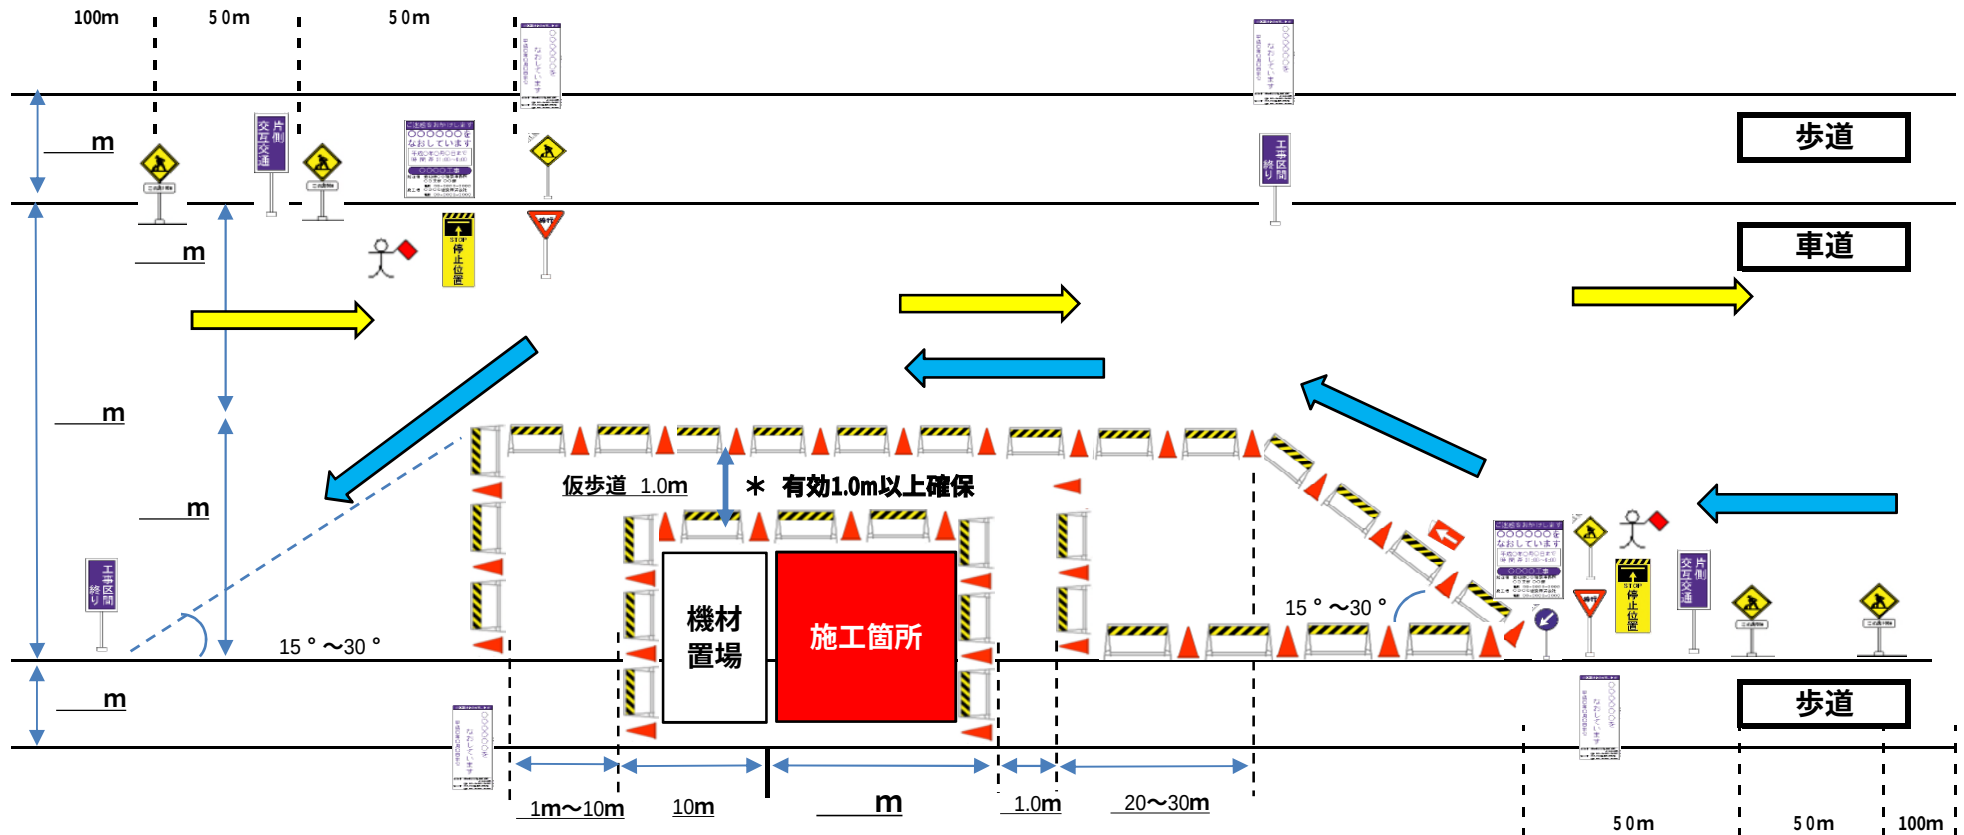


- 作業時間は、原則として9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 歩行者は作業を止めて、誘導員が安全に誘導します。
- 「道路工事保安設備設置基準 平成19年4月(平成30年3月改定) 愛知県建設部」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

保安設備等計画図

(道路内工事で片側交互通行の例)

No.4

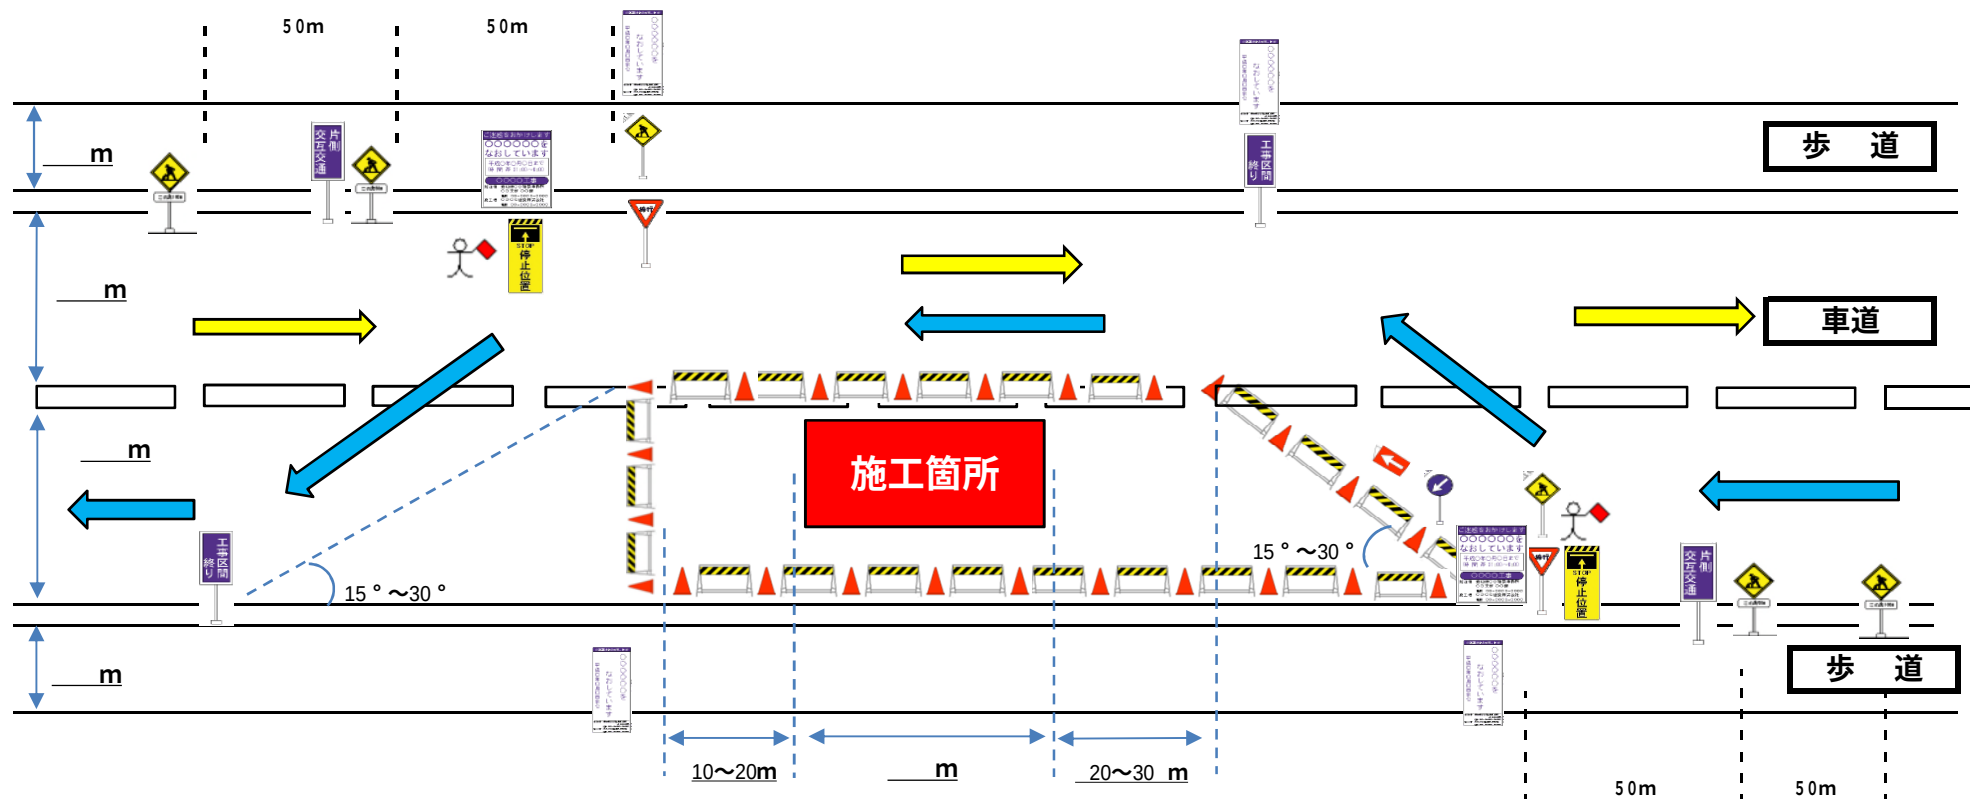


- 作業時間は、原則として9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 歩行者は作業を止めて、誘導員が安全に誘導します。
- 「道路工事保安設備設置基準 平成19年4月(平成30年3月改定) 愛知県建設部」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

保安設備等計画図

(道路内工事で片側交互通行の例) ※半断面ずつの施行の場合

No.5-1

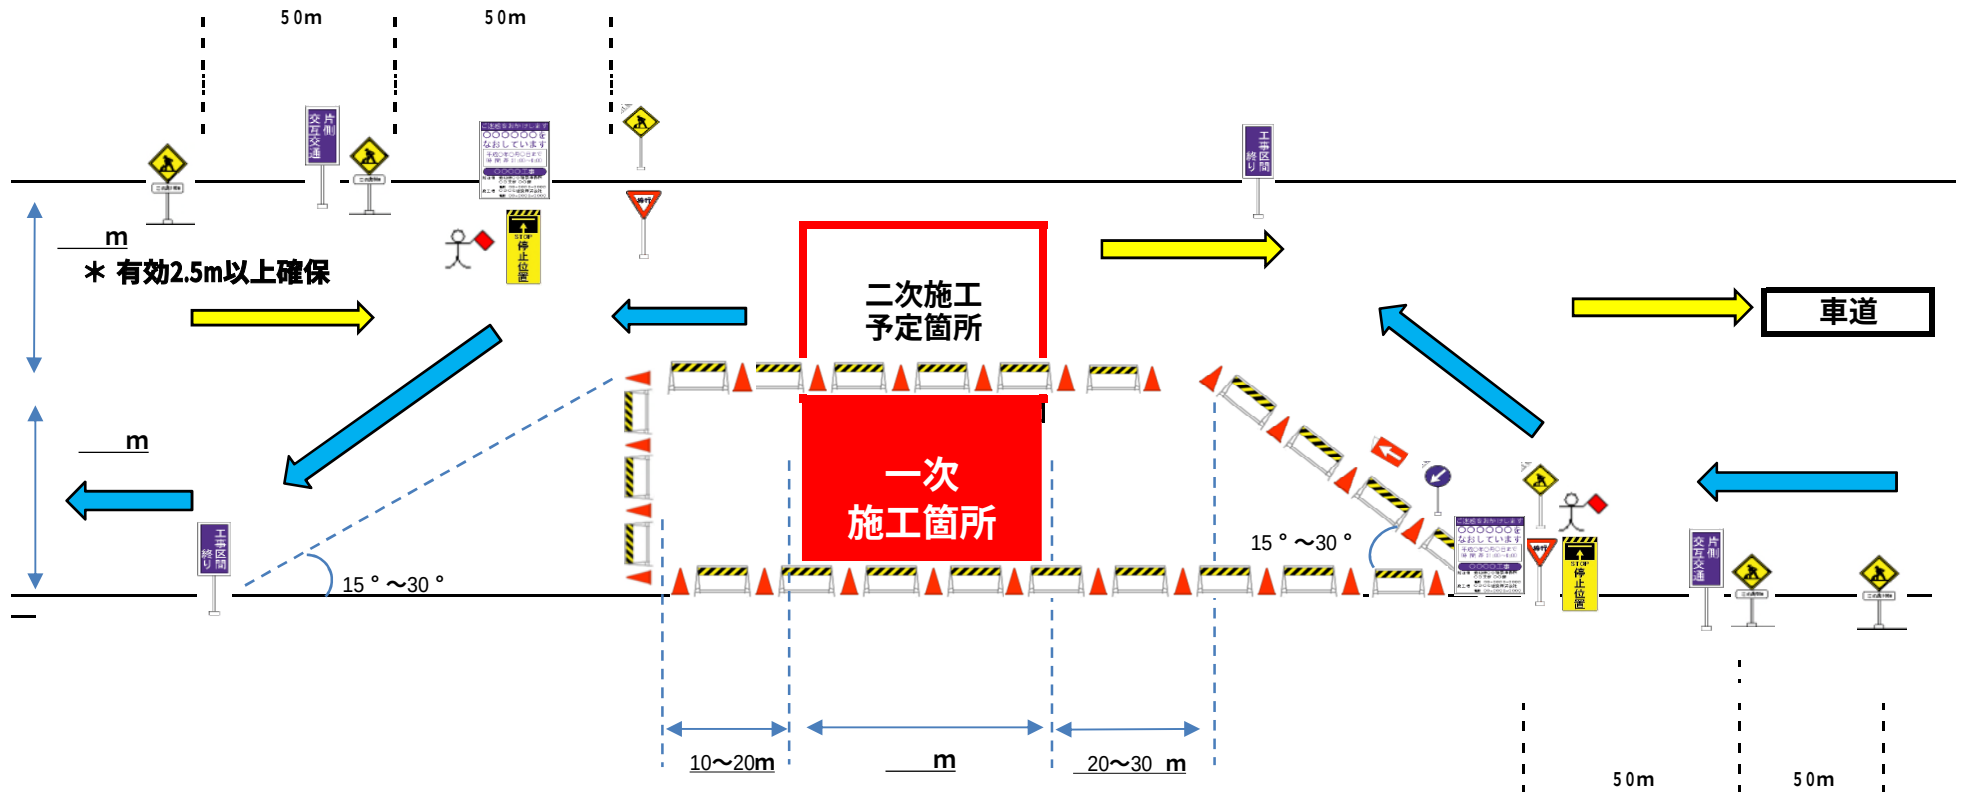


- 作業時間は、原則として9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 歩行者は作業を止めて、誘導員が安全に誘導します。
- 「道路工事保安設備設置基準 平成19年4月(平成30年3月改定) 愛知県建設部」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

保安設備等計画図

(道路内工事で片側交互通行の例) ※半断面づつの施行の場合

No.5-2

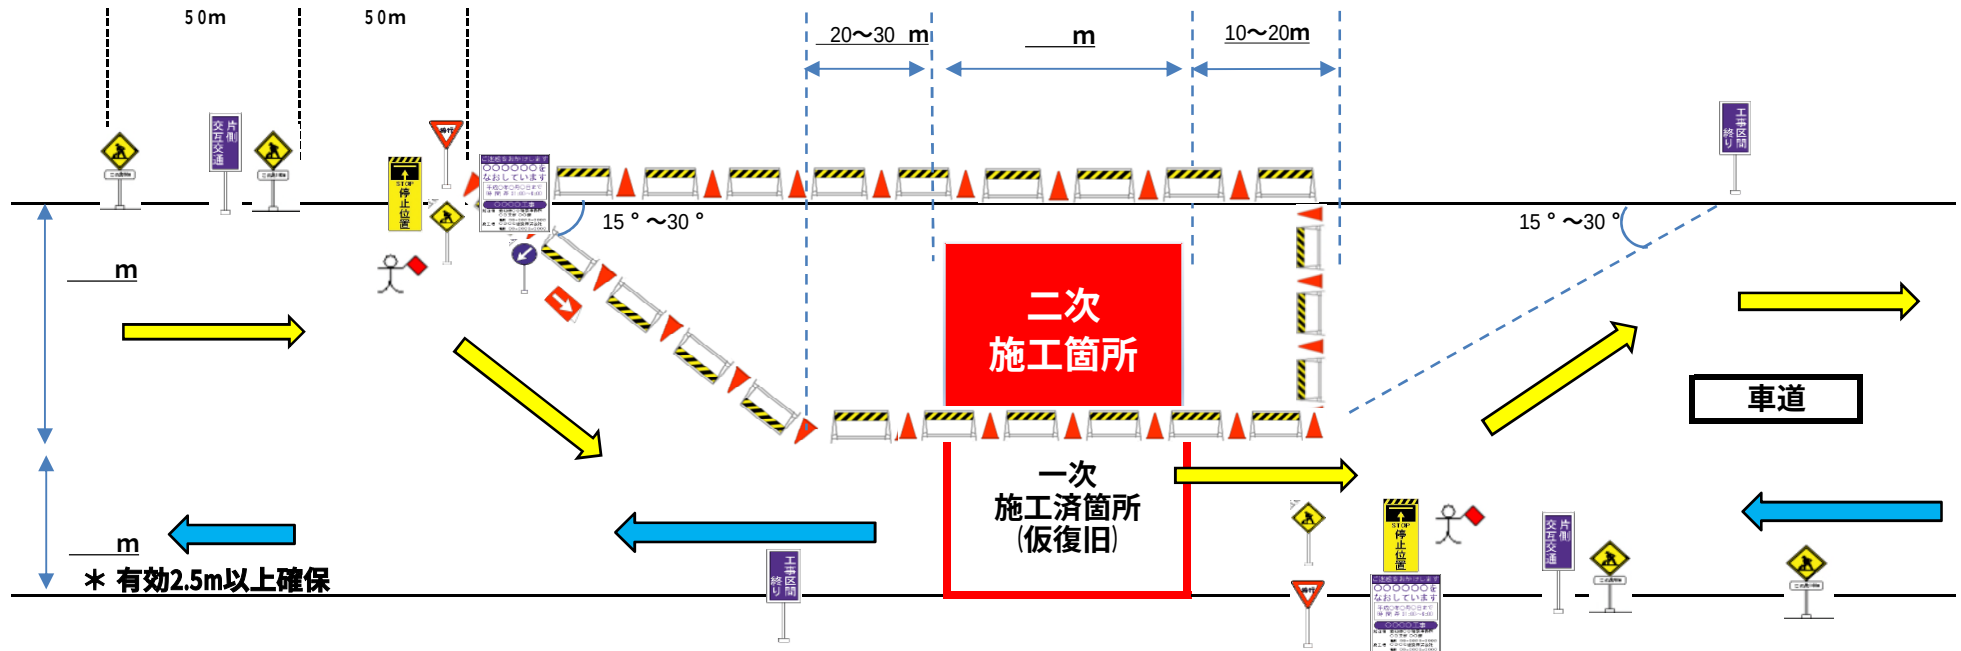

- ）作業時間は、原則として9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します
- ）歩行者は作業を止めて、誘導員が安全に誘導します
- 「道路工事保安設備設置基準 平成19年4月(平成30年3月改定) 愛知県建設部」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

(車両通行止めの例) ※二次施工図面はNo.6-2を参照

[illegible]

- 作業時間は、9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 歩行者通行の際は覆工板を敷き、保安員の誘導のもと、安全に通行させます。
- 「**道路工事保安設備設置基準 平成19年4月（平成30年3月改定） 愛知県建設部**」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

(車両通行止めの例) ※一次施工図面はNo.6-1を参照

The diagram illustrates a road construction site layout. A red rectangular area in the center is labeled "二次 施工箇所" (Secondary Construction Area). To its left is a red rectangular area labeled "一次 施工済み箇所 (仮復旧)" (Primary Construction Completed Area (Temporary Restoration)). To the left of the primary area is a black rectangular box labeled "車道" (Roadway). To the right of the secondary area is a blue double-headed arrow indicating a width of "m".

Signage and barriers are shown as follows:


- Top Left:** A white sign with black text: "ご連絡をおかけします" (We will contact you), "〇〇〇〇〇〇をなおしています" (We are repairing 〇〇〇〇〇〇), "平成〇年〇月〇日まで" (Until 〇〇/〇〇/〇〇), "時間 帯 21:00~8:00", "〇〇〇〇工事" (〇〇〇〇 Work), "発注者 愛知県〇〇建設事務所" (Client: Aichi Prefecture 〇〇 Construction Office), "〇〇支所 〇〇課" (〇〇 Branch Office 〇〇 Section), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇", "施工者 〇〇〇〇建設株式会社" (Contractor: 〇〇〇〇 Construction Co., Ltd.), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇".
- Top Right:** A white sign with black text: "ご連絡をおかけします" (We will contact you), "〇〇〇〇〇〇をなおしています" (We are repairing 〇〇〇〇〇〇), "平成〇年〇月〇日まで" (Until 〇〇/〇〇/〇〇), "時間 帯 21:00~8:00", "〇〇〇〇工事" (〇〇〇〇 Work), "発注者 愛知県〇〇建設事務所" (Client: Aichi Prefecture 〇〇 Construction Office), "〇〇支所 〇〇課" (〇〇 Branch Office 〇〇 Section), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇", "施工者 〇〇〇〇建設株式会社" (Contractor: 〇〇〇〇 Construction Co., Ltd.), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇".
- Left Side:** A white sign with black text: "まわり道450M" (Detour 450M), "150m先国道工事につき" (Due to national road work 150m ahead), "まわり道を御下さい" (Please take the detour), "発注者 愛知県〇〇建設事務所" (Client: Aichi Prefecture 〇〇 Construction Office), "〇〇支所 〇〇課" (〇〇 Branch Office 〇〇 Section), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇", "施工者 〇〇〇〇建設株式会社" (Contractor: 〇〇〇〇 Construction Co., Ltd.), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇".
- Right Side:** A white sign with black text: "まわり道" (Detour), "150m先国道工事につき" (Due to national road work 150m ahead), "まわり道を御下さい" (Please take the detour), "発注者 愛知県〇〇建設事務所" (Client: Aichi Prefecture 〇〇 Construction Office), "〇〇支所 〇〇課" (〇〇 Branch Office 〇〇 Section), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇", "施工者 〇〇〇〇建設株式会社" (Contractor: 〇〇〇〇 Construction Co., Ltd.), "電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇".

Other elements include a pedestrian symbol with a red diamond, a yellow diamond sign with a black silhouette of a person walking, and a red triangle sign with a black silhouette of a person walking. Blue arrows indicate the direction of traffic flow.

- 作業時間は、9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 「**道路工事保安設備設置基準 平成19年4月（平成30年3月改定） 愛知県建設部**」に基づき保安設備を設置します。
- **夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。**
- 歩行者は作業を止めて、誘導員が安全に誘導します。

保安設備等計画図

(通行止めの例)

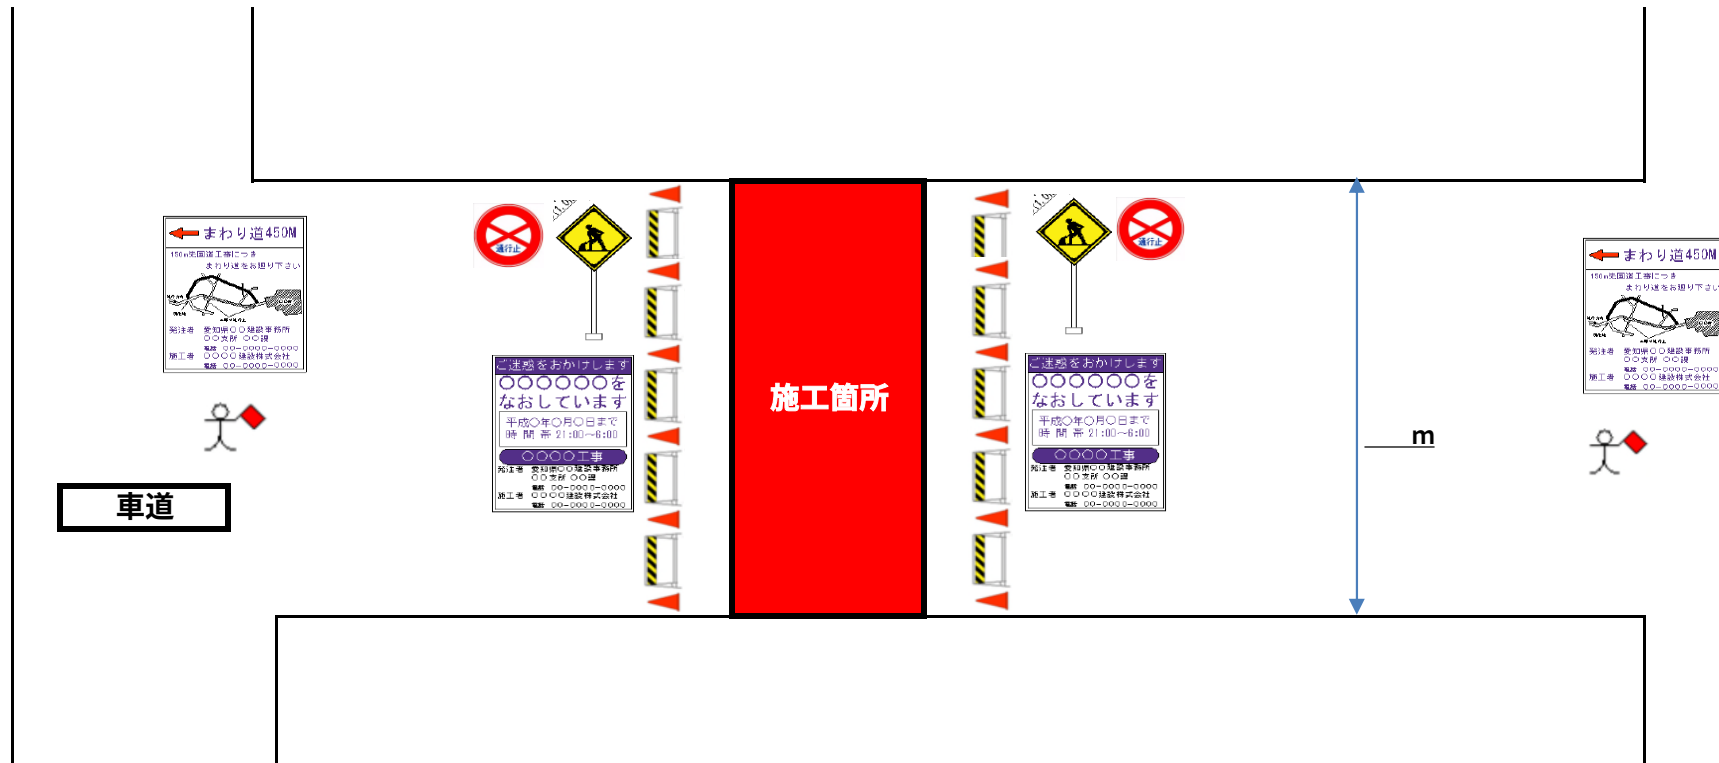

- 作業時間は、9時～17時とし、工事完了後は速やかに復旧し、交通解放します。
- 「道路工事保安設備設置基準 平成19年4月(平成30年3月改定) 愛知県建設部」に基づき保安設備を設置します。
- 夜間工事をする場合は、カラーコーンを照明灯と赤色灯に代えて高輝度反射式看板および、工事用照明等により夜間の視認性を確保します。

迂回路図 例

No.9



保安設備様式図

NO.8

番号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
区分	標示板	標示板	標示板	標示板	標示板	標示板	標示板	標示板	標示板	標示板	
名称	工事中看板	工事予告看板	工事説明看板	工事情報看板	まわり道案内板	まわり道予告板	片側交互通行	工事区間終り	電光表示板	工事内容	
記号	(6)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(15)	(14)	(11)	(21)	
様式及び形状寸法 (単位mm)											
	番号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	区分	標示板	道路標識	道路標識	道路標識	道路標識	道路標識	道路標識	道路標識	道路標識	移動柵
	名称	矢印板	まわり道	道路工事中	工事予告①	工事予告②	車線数減少	二方向交通	徐行	指定方向外進行禁止	バリケード
	記号	⇒	(22)	(1)	(23)	(24)	(2)	(3)	(5)	(4)	→←
様式及び形状寸法 (単位mm)											
	番号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	参⑨	参⑩	(28)
	区分	固定柵	カラーコーン	歩道柵	保安灯	保安灯	保安灯	休止中ステッカー	参考	参考	設置者ステッカー
	名称	パネルフェンス	カラーコーン	歩道柵	保安灯	保安灯	保安灯	休止中ステッカー	標示板 (徐行)	標示板 (迂回路)	設置者ステッカー
	記号	●●	○	○●	●	25	10	26	36	37	27
様式及び形状寸法 (単位mm)											
	番号	参①	参②	参③	参④	参⑤	参⑥	参⑦	参⑧		
	区分	参考	参考	参考	参考	参考	参考	参考	参考		
	名称	標示板 (片側交互通行)	標示板 (工事区間終り)	標示板 (段差注意)	標示板 (段差予告)	標示板 (停止位置)		標示板 (工事予告)	標示板 (車線数減少)		
	記号	(29)	(32)	(30)	(31)	(32)		(34)	(35)		
様式及び形状寸法 (単位mm)											
